



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

# Projektnyheter Östra sjukhuset

2026 juni-augusti

**För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset. I projektnyhetererna samlar vi information om projekten samt ger dig som arbetar på området en idé om vad som är på gång de kommande månaderna. Här finns en [karta över byggområden](#).**

**Här finns också information om hur byggprojekten påverkar framkomligheten på området.**

- Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)
- Information om projekten på centralkliniken (CK) skickas varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).
- Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).
- Mer information finns på [VGR fastigheter](#).

---

## Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden.

I projektnyhetsbrevet berättar vi kort om de större projekt som pågår på tomten. Alla påverkar inte omgivningen, men kan vara bra att känna till.

Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

**Tack för din förståelse!**

Robert Thorn, huvudprojektledare och Jennifer Olsson, huvudförvaltare

# Innehåll

Det pågår många projekt på Östra sjukhuset. Genom att klicka på länkarna nedan kan du lätt välja den information du behöver.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <a href="#">Allmänt läge på tomten .....</a>                     | <a href="#">1</a>  |
| <a href="#">Ny vårdbyggnad förlossning och neonatal .....</a>    | <a href="#">3</a>  |
| <a href="#">Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus .....</a>   | <a href="#">6</a>  |
| <a href="#">Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad.....</a>           | <a href="#">7</a>  |
| <a href="#">Barnkliniken, nytt ställverk .....</a>               | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Tillväxthuset, fasadbyte.....</a>                    | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Psykiatrisk klinik, akutmottagning Östra .....</a>   | <a href="#">9</a>  |
| <a href="#">Centralkliniken, nytt ställverk.....</a>             | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Centralkliniken, nytt ventilationsaggregat .....</a> | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare</a>   | <a href="#">12</a> |
| <a href="#">Infektionskliniken, nytt ställverk.....</a>          | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">Sprinklersystem, etapp 7.4 .....</a>                 | <a href="#">15</a> |
| <a href="#">Borrhållager .....</a>                               | <a href="#">16</a> |
| <a href="#">CHA (Centricity High Acuity) .....</a>               | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">Sop- och tvättsugsanläggning .....</a>               | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">Framkomlighet på Östra sjukhuset.....</a>            | <a href="#">19</a> |

---

## Ny vårdbyggnad förlossning och neonatal

### Projektnummer 11714 – Etapp 2

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028.

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

### Omgivningspåverkan


Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

### Bilder



Förbindelsegången mot CK

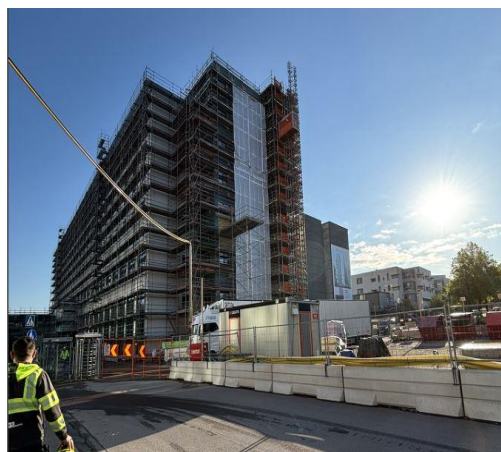

Utvändig bild på FoN

### Aktuellt kommande månader

#### Juni

Invändigt fortsätter installationsarbeten på samtliga plan. Monteringen av personhissar fortgår denna månad. Gipsning av enklade väggar fortsätter på plan 00. Fasadskivor fortsätter monteras på västra sidan om fasaden.

Demonteringen av fasadställningen runt FoN påbörjas succesivt denna månad.

I förbindelsehallen mot KK fortsätter montering av taksargar, och taktäckning påbörjas. Denna månad ska förbindelsehallen mellan KK & FoN ha tätt hus.

### **Juli**

Arbeten som kan tänkas pågå under veckorna 28-31 är installationsarbeten på samtliga våningsplan, samt monteringsarbeten med person- och IVA-hissar. Samtidigt fortsätter montering av gipsväggar på plan 00 (markplan) och plan 06.

### **Augusti**

Pågående installationsarbeten på samtliga våningsplan. Montage av gipsväggar fortsätter på plan 00 och 06 samt påbörjas på plan 01 och 07. Målningsarbeten fortsätter löpande med mest fokus på el-entraller. Både IVA- och personhissar invändigt fortsätter monteras under månaden.

Demontering av utvändigt byggnadsställning fortsätter denna månad.

Byggnation av provisoriska väggar samt rivningsarbeten i KK och arbeten inom förbindelsehallen mot KK fortsätter nu efter sommarsemestern. Utvändigt så börjas återfyllnad av marken mellan KK och nya FoN.

## **Förbindelsegång CK-FoN**

11682

K21 ska bygga en förbindelsegång mellan Centralkliniken och FoN.

### **Juni**

Denna månad påbörjas monteringen av fasadpartier på förbindelsegången. Man påbörjar även ombyggnationen av det befintliga skärmtaket på CK.

### **Juli**

Eventuellt håller bygget stängt v. 28-31 p.g.a. byggsemester. Fasadpartier fortsätter monteras.

### **Augusti**

Montage av fasadpartier fortsätter efter semestern. Arbete med taksarg och taktäckning påbörjas denna månad.



***Kontakt, projektledning VGR***

Stefan Carlsson, projektledare, [stefan.carlsson@vgregion.se](mailto:stefan.carlsson@vgregion.se)

Jenny Bratberg, projektledare, [jenny.bratberg@vgregion.se](mailto:jenny.bratberg@vgregion.se)

Jonas Riedel, byggledare, [jonas.riedel@karlanders.se](mailto:jonas.riedel@karlanders.se)

Magnus Johansson, byggledare, [magnus.johansson@karlanders.se](mailto:magnus.johansson@karlanders.se)

**Entreprenör: K21 Entreprenad**

Platschef: Fredrik Södergren

---

## **Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus**

*Projektnummer 11245 - BK*

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt hus för barn- och ungdomspsykiatri på Östra sjukhuset. Det nya huset planeras stå klart för inflyttning Q2 2028.

Det nya huset kommer placeras på samma ställe som det nuvarande BUP-huset och lokalerna kommer anpassas bättre efter verksamheternas behov och krav på säkerhet. Huset kommer anslutas i kulvert till det övriga sjukhuset.

Ätstörningscentrum, som ingår i Barn och ungdomspsykiatrin, kommer att få nya lokaler i nuvarande barnsjukhuset i direkt anslutning till det nya BUP-huset. Detaljprojektering pågår feb-okt 2026. Byggstart våren 2027.

### **Juni**

Entreprenör har etablerat sig och borring av berg samt sprängning pågår. Schaktning av mark utförs inom arbetsområdet. Ny tillfällig väg förbi arbetsområdet pågår

### **Juli**

Slutskede på sprängning och uppbyggnad av källare och platta på mark pågår. Schaktning av mark utförs inom arbetsområdet. Ny väg förbi arbetsområdet klar och används av transporter till och från tillväxten samt ambulanstransporter till barnsjukhusets isolerrum.

### **Augusti**

Start av uppbyggnad av källare och platta på mark pågår. Schaktning av mark utförs inom arbetsområdet.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Roger Harrysson, projektledare, 072-2012463, [roger.harrysson@vgregion.se](mailto:roger.harrysson@vgregion.se)

Robert Thorn, projektledare, 072-2450636, [robert.thorn@vgregion.se](mailto:robert.thorn@vgregion.se)

---

## Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad

*Projektnummer 12105 – BK*

Västra Götalandsregionen planerar ett större ombyggnadsprojekt på Barnkliniken. Ombyggnationen omfattar två våningsplan på BK-höghus.

Detta är ett delprojekt och ingår i samma genomförandebeslut som Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus.

Dessa plan behöver byggas om för att kunna flytta nuvarande mottagningsverksamhet inom mage, tarm, lever samt ögon i plan 01 samt administration i plan 00 lågdel C. Plan 00-01 i lågdel C ska därefter byggas om för att kunna inrymma framtida ätstörningscentrum, ÄTC.

Våningsplanen ska byggas om för att anpassas till:

Plan 2 – Administrationsplan

Plan 3 – Mottagningsplan

Preliminär inflyttning är februari 2027. Projektet omfattar stomren rivning och totalt utbyte av tekniska installationer för de berörda våningsplanen.

Just nu pågår rivning och uppbyggnad av väggar på båda våningsplanen. Installationer i korridorstråk har påbörjats på plan 3.

### **Juni**

Rivning och sanering fortsätter på båda planen.

Arbete med uppbyggnad väggar fortsätter på båda planen.

Installationsarbetet fortsätter på plan 3 och startar upp på plan 2.

Omkoppling av avlopp som betjänar barncancercentrums lokaler plan 4 kommer bytas etappvis under juni.

Omkoppling av avlopp i taket plan 1, detta arbetet kommer ske på flera olika ställen i plan 1 i högdelen, även i publika korridorer, även detta sker etappvis under juni och början juli.

### **Juli**

Under v.28-29 kommer det vara reducerad styrka på plats, det är framförallt elektrikern som kommer utföra kabeldragning.

Inga planerade arbeten under v.30-31

## **Augusti**

Arbeten med installationsdragning och vägguppbyggnad fortsätter.

Ytskiktsarbeten startar.



### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Lisa Jerrhagen, projektledare, 0765-31 44 38, [lisa.jerrhagen@vgregion.se](mailto:lisa.jerrhagen@vgregion.se)

Katarzyna Obuchowska, byggledare, 076-521 55  
23, [katarzyna.obuchowska@vgregion.se](mailto:katarzyna.obuchowska@vgregion.se)

### ***Kontakt entreprenör, DC Wäst***

Simon Hedling, platschef, 0730-414657, [simon.hedling@dcwast.se](mailto:simon.hedling@dcwast.se)

Jimmy Ragnarsson, arbetsledare DC Wäst, 0725-74 72 66,  
[jimmy.ragnarsson@dcwast.se](mailto:jimmy.ragnarsson@dcwast.se)

---

## Barnkliniken, nytt ställverk

*Projektnummer 11426 – BK*

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q4 2027.

Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 07 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt ingår i det gemensamma nyhetsbrevet för BK som skickas ut varannan vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

**Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

---

## Tillväxthuset, fasadbyte

*Projektnummer 11993 – TVX*

Projektet innebär ett fasadbyte på tillväxthuset. Entreprenaden pågår och beräknas vara klar i sin helhet Q2 2027.

Etapp 1 innefattar den rektangulära delen och färdigställs under Q2 2026

Etapp 2 innefattar den ovala delen och planeras att pågå under Q1-Q2 2027.

**Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Emil Gurbani, projektledare, [emil.gurbani@vgregion.se](mailto:emil.gurbani@vgregion.se)

---

## Psykiatrisk klinik, akutmottagning Östra

*Projektnummer 69192 – PK*

Entreprenad startar mitten av juni månad och beräknas vara klar under Q3 2026.

I denna entreprenad ska variabelflödesdon och spjäll som börjar nå teknisk livslängd bytas ut.

Detta gäller då främst möteslokaler och lunchrum i personalutrymmen samt allmänna utrymmen inne på avdelningar.

Arbetsområdet sträcker sig över plan 01–05.

Syfte och mål med projektet:

- säkerställa stabil och energieffektiv ventilation,
- förbättra inomhusklimatet i de mest använda utrymmena,
- minska risken för driftsstörningar kopplade till äldre don och spjäll, och skapa bättre förutsättningar för långsiktig drift och underhåll.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Fadi Elias, Extern projektledare, 0735615189, [fadi.elias@eskab.se](mailto:fadi.elias@eskab.se)

---

## **Centralkliniken, nytt ställverk**

*Projektnummer 11427 – CK*

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q2 2027. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Arbete pågår på plan 98 samt kanalisation och kabeldragning på våningsplan enligt tidplan.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

---

## **Centralkliniken, nytt ventilationsaggregat**

*Projektnummer 11398 – CK*

Projektet omfattar byte av befintligt ventilationsaggregat LA50 samt utbyggnad av befintligt fläktrum.


Projektet beräknas starta 2026 juni och pågå fram till och med 2027 september.

Nuläge: Upphandling till 2026 maj

Syfte och mål med projektet: Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd. Befintligt aggregat är från 1978 och betjänar blandade typer av lokaler i byggnad 4236 CK. Det betjänar bland annat entré, administrativa lokaler, labb och vårdlokaler. Aggregatet betjänar totalt ca 12 500 m<sup>2</sup> inklusive källarvåning (plan 98).

Projektet är också en del i den satsning Västra Götalandsregionen gör för att minska energianvändningen i egna fastigheter målsättningen är en halvering av energianvändningen till år 2030 jämfört med 1995.

### Omgivningspåverkan

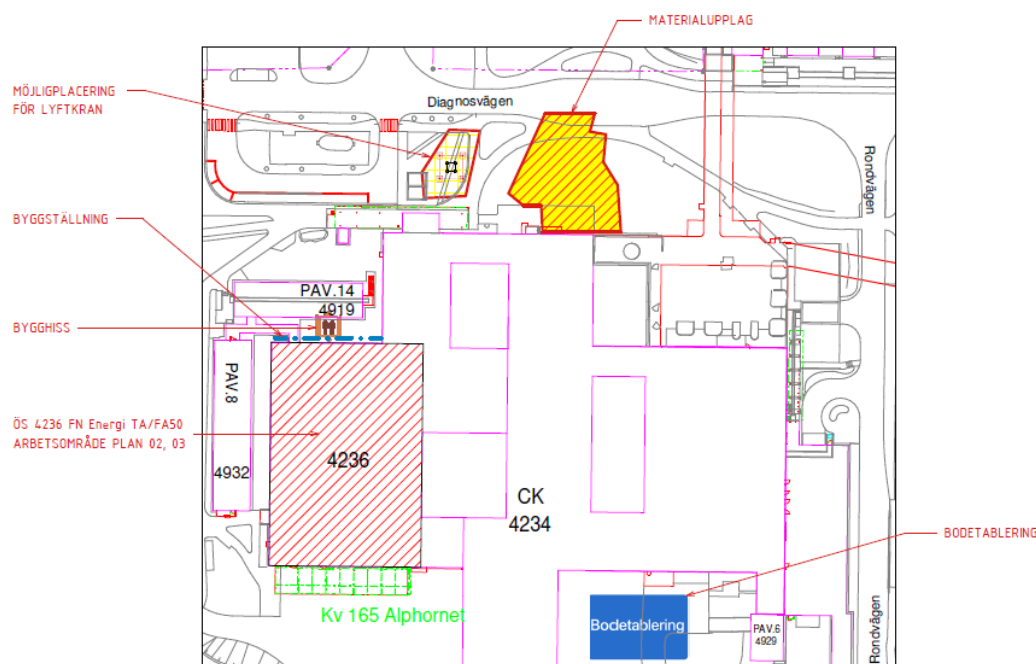

### **Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Robin Staaf, projektledare, 0734-459671, [robin.staaf@vgregion.se](mailto:robin.staaf@vgregion.se)

---

## Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare

Projektnummer 11407 – CK

### Bilder

Bilden till höger visar arbetet i norra delen av schaktgropen.



Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt ingår också i det gemensamma nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

### Omgivningspåverkan

#### **Nybyggnation**

Utvändigt pågår armering och betonggjutningar av källarväggar.

Södra infarten till P1 är avstängd för att säkerställa säker passage för gående.

#### **Ombyggnation**

Invändigt pågår arbeten med montering av installationer och utrustning på plan 00. Stomljud kan förekomma i byggnaden från borringen för installationer.

**Dockningsarbeten**

Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Gäller södra och västra delen av CK högdal samt vid södra delen av CK lågdal.

**Aktuellt kommande månader – Nybyggnation*****Juni***

Utvändigt pågår arbeten med armering och betonggjutningar samt montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag).

***Juli***

Arbete med prefabmontage.

***Augusti***

Arbete med prefabmontage.

**Aktuellt kommande månader – Ombyggnation*****Juni***

Färdigställande och avslutande arbete på plan 00 inför besiktning. Förberedelse för verksamhetens inredning så som kameror och pendlar.

Invändiga dockningsarbeten i CK högdal samt fasadarbeten för dockning vid norra delen av CK lågdal.

***Juli***

Ombyggnationen plan 00 har semesterstängt mellan v.28 och v.31. Arbete kommer ske i Schakt 24 under v. 28 och v.29.

***Augusti***

Sista kompletteringar samt besiktningar på plan 00. Slutbesiktning plan 00 bokad 260901.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnation, 072-208 85 58,  
[kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Malin Dahlstedt, projektledare ombyggnation, 0793-44 00 50,  
[malin.dahlstedt@vgregion.se](mailto:malin.dahlstedt@vgregion.se)

Jesper Hertzman, Byggledare, 070-238 58 21,  
[jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

**Entreprenör: Skanska**

Mattias Svanberg, Platschef, 010-448 37 07, [mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## **Infektionskliniken, nytt ställverk**

*Projektnummer 11425 – IK*

Arbete pågår med att montera samman det nya ställverket.

Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

---

## **Sprinklersystem, etapp 7.4**

*Projektnummer 11278*

Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025 och har slutbesiktning är planerat till februari 2027.

Samordningsmöten med planeringsledare har hållits och kommer att fortsätta hållas kontinuerligt under projektet.

Nyhetsbrev skickas ut varje vecka av projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99.

Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektets omgivningspåverkan handlar om kortare avbrott i kontorsverksamhet på plan 99 samt vissa kortare omledningar och avspärningar i korridorer och kommunikationsstråk, också på plan 99.

Projektet ska bygga ut sprinklerinfrastrukturen för att förbättra brandsäkerheten samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

Under juni - augusti pågår arbete i kulvertar, schakter och apparatrum på plan 98 samt arbeten med ny sprinklercentral i MC. Centralen blir innanför portarna direkt söder om MC lastkaj. Under juni – augusti kommer även arbeten utföras i CK plan 99. Det omfattar korridorer, omklädningsrum, förråd och gångkulvertar. Men också mer centrala delar som i och utanför reception, utanför butik och bibliotek.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Kristoffer Sideby, projektledare, 076-764 13 16, [kristoffer.sideby@ramboll.se](mailto:kristoffer.sideby@ramboll.se)

**Benjamin Khatibi**, byggledare, 072-161 06 22

[benjamin.khatibi@ramboll.se](mailto:benjamin.khatibi@ramboll.se)

## Borrhåslager

Projektnummer 11645

### Bilder



Entreprenaden påbörjades i juli 2025 med utvändiga arbeten med borrhning i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. Bodetablering i norra delen av parken är nu flyttad, endast 2 st rullvagnar står på tomten. Borrhning i norra delen av parken är klart och det är nu det sista arbetena med markslangar och återfyllning som sker. Finplanering ska vara klar inför planerad slutbesiktning den 1 juli.

Markentreprenören färdigställer nu finplanering, trädplanteringar och stensättningar i övriga delen av parken.

Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti 2025 och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till sommaren 2026. Driftsättningar och injusteringar pågår nu inne i MC. Förbesiktningar pågår och från v.24 utförs samordnad funktionsprovning och slutbesiktning är planerad till 1 juli.

Borrhåslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhåslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

### **Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service**

Mikael Johansson, 070-732 12 56, [mikael.s.johansson@vgregion.se](mailto:mikael.s.johansson@vgregion.se)

Krister Skoglund, byggledare, 0767715698

[krister.skoglund@vgregion.se](mailto:krister.skoglund@vgregion.se)

---

## **CHA (Centricity High Acuity)**

*Projektnummer 11933*

Projekt CHA ska implementeras på ett antal avdelningar på Östra Sjukhuset, där byggnad KK och avdelning NeoIVA är först ut.

Kortfattat innebär det att data- och eluttag monteras för att kunna koppla upp mot en digital journal (CHA). Främst utförs detta på operationssalar och IVA platser. Befintliga byggnader som i dagsläget är berörda är BK, CK, KK och TBS.

SU planerar att implementera systemet från våren 2027.

Status idag är att beslut har erhållits av SU och Entreprenaden har precis påbörjats. Entreprenaden pågår på avdelning 316 i KK där man samordnar PU-projektet Byte kallelse på samma avdelning.

Tider för avdelning OP2 och avd.319 är ej fastställda.

***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Mikael Johansson, 070-732 12 56, [mikael.s.johansson@vgregion.se](mailto:mikael.s.johansson@vgregion.se)

---

---

## Sop- och tvättsugsanläggning

*Projektnummer 11113*

Installation av nytt sop- och tvättsystem görs för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och intern service.

Entreprenaden är nu klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, Drottning Silvias barnsjukhus). Inkoppling av tvättsugssystemet till KK, BK och Drottning Silvias barnsjukhus är slutbesiktigat och taget i bruk av verksamheten v 13.

Dragning av sop- och tvättrör i ny kulvert för förlossning och neonatal är klart. Montering av rör i FoN husets schakter är klart. Montering av sop- och tvättnedkastluckor startar preliminärt under januari/februari 2027.

Tidpunkt för arbetet i IVA/HBO är preliminärt maj till november 2027.

Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

### ***Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service***

Anton Fredriksson, projektledare, 0762918336,  
[anton.fredriksson@vgregion.se](mailto:anton.fredriksson@vgregion.se)

---

## Framkomlighet på Östra sjukhuset

### *Bilar*

Det finns ingen genomfart på Östra sjukhuset för cykel och bil.

- **Måndag 1/6** och 2 veckor **fram till 12/6** kommer IVA/HBO projekt behöva stänga av Behandlingsvägen väster ut, då de kommer behöva lyfta in material in till en framtida innergård ,väster om södra CK.
- Rondvägen är stängd för genomfart för cykel och bil från 2023 och framåt.
- Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen
- Ambulans kör in till vuxenakuten via Remissvägen, men ut via Diagnosvägen.
- BUP-akuten nås via Smörslottsgatan 3.
- Övriga akutmottagningar (förlossning, psykiatri och infektion) nås via Vitaminvägen.
- Behandlingsvägen förbi Drottning Silvias barnsjukhus är enkelriktad och passage är enbart möjlig från väster.
- Utfart från Remissvägen, Journalvägen och Behandlingsvägen enbart via Remissvägen.
- Diagnosvägen nås enbart via norra infarten.

### *Framkomlighet gång och cykel*

På grund av arbetsområden, trånga passager samt bygg- och ambulansstrafik finns det ingen genomfart för cykel på Östra sjukhuset. sjukhusområdet. Cyklister hänvisas runt sjukhusområdet.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

### *Parkering*

Parkeringsituationen på området är mycket begränsad. Välj om möjligt alternativa färdvägar till Östra sjukhuset.

Mer information om framkomlighet finns på webbplatsen [fastighet.vgregion.se](http://fastighet.vgregion.se) eller via länken [Framkomlighet och byggområden - VGR fastigheter](#)
