



2026-08-20

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 35-36 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion ute och inne.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Höga ljudnivåer inne, lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 00 samt 01 och i norr pågår montage på plan 99.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Slutskedesarbeten med installationer och ytskikt inför slutbesiktning.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Arbetet med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder skall infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Invändigt på plan 00 har de mesta av arbetena avslutats. Arbeten i mindre omfattning kvarstår. Vid arbete på plan 01–02 i södra delarna av CK förekommer borrning och sågning vilket kan generera stomljud.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inredning av förråd startade vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, **BK**, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q2 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan


Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

- Etapp 3C -Sprinkler klart. Undertak pågår.
- Etapp 4 – Gipsning av trumma i måsgången pågår.
- Etapp 7B - Sprinklermontage klar måndag V.34.

Undertaksmontage pågår.

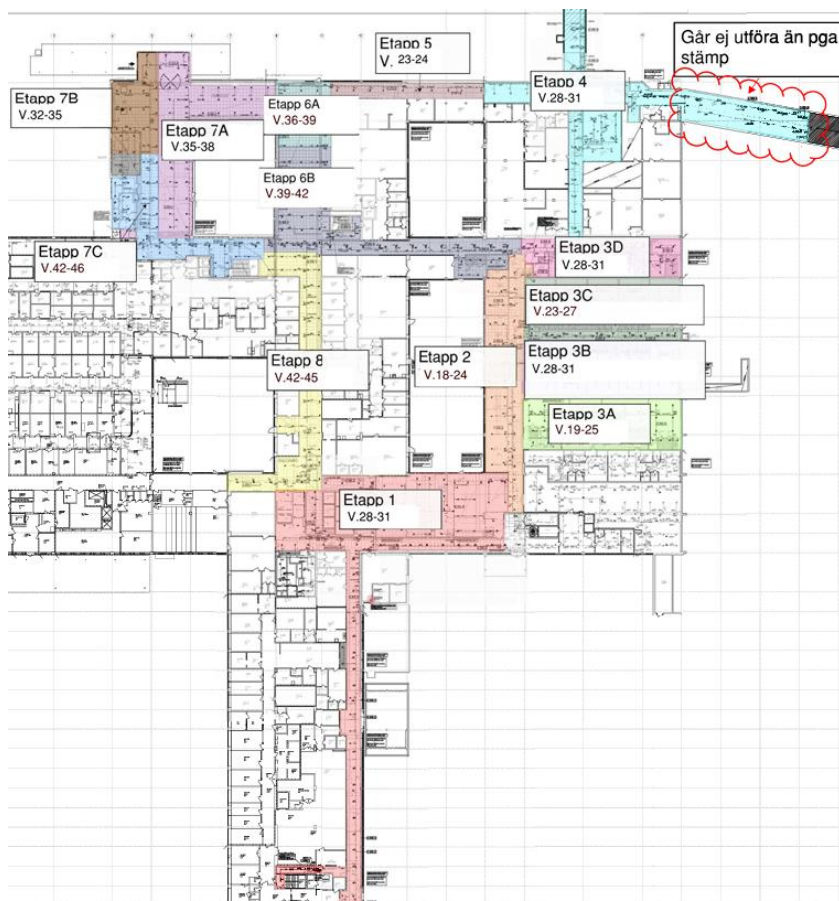

Sprinklercentralen: Installationsarbeten pågår.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Stefan Berntsson, Kontrollant sprinkler, 070-811 15 78,

stefan.berntsson@epg.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se

Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

fredrik.unosson@serncon.se
