



2026-08-28

# Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 36-37 2026

**Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.**

**För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.**

**För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).**

---

## IVA/HBO

**Nuläge:** Full produktion ute och inne.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Höga ljudnivåer inne, lägre ljudnivåer utomhus.

**Byggstart:** 2025

**Klart för inflyttning:** 2028

För aktuell karta över området, se länk

## Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 01 och i norr pågår montage på plan 99.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

## Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Slutskedesarbeten med installationer och ytskikt inför slutbesiktning.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.

## Omgivningspåverkan

- Utomhus: Arbetet med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder skall infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Invändigt på plan 00 har de mesta av arbetena avslutats. Arbeten i mindre omfattning kvarstår. Vid arbete på plan 01–02 i södra delarna av CK förekommer borrar och sågning vilket kan generera stomljud.

## Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

[rebecca.engvall@vgregion.se](mailto:rebecca.engvall@vgregion.se)

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

[jesper.hertzman@karlanders.se](mailto:jesper.hertzman@karlanders.se)

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

[kristoffer.lind@vgregion.se](mailto:kristoffer.lind@vgregion.se)

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

[malin.dahlstedt@vgregion.se](mailto:malin.dahlstedt@vgregion.se)

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

[mattias.svanberg@skanska.se](mailto:mattias.svanberg@skanska.se)

---

## MIV, verksamhetsanpassning

**Nuläge:** Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inredning av förråd startade vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

### Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

### Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

[Jesper.Hertzman@karlanders.se](mailto:Jesper.Hertzman@karlanders.se)

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

[omid.khavary@k21.se](mailto:omid.khavary@k21.se)

---

## Nytt ställverk CK

**Nuläge:** Installation av nytt ställverk

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Inget

**Projektets start:**

**Färdigställande:** Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

**Plan 98:** Nya väggar och demontering.

**Plan 99–09:** Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

### Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

### Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, [johan.ekstrand@vgregion.se](mailto:johan.ekstrand@vgregion.se)

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, [maria.nikolic@vgregion.se](mailto:maria.nikolic@vgregion.se)

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, [lars@elektro-emanuel.se](mailto:lars@elektro-emanuel.se)

---

## Sprinklersystem, etapp 7.4

**Nuläge:** Installation av sprinklersystem (flera etapper)

**Påverkan för verksamheten kommande veckor:** Ingen

**Projektets start:** Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

**Färdigställande:** Q2 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.


### Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

### Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

- Etapp 4 – Arbete med trumma i måsgången fortsätter
- Etapp 7B - Plattning av undertak pågå, montage av ventilationsdon och lampor pågå
- Etapp 7A- Rivning pågå

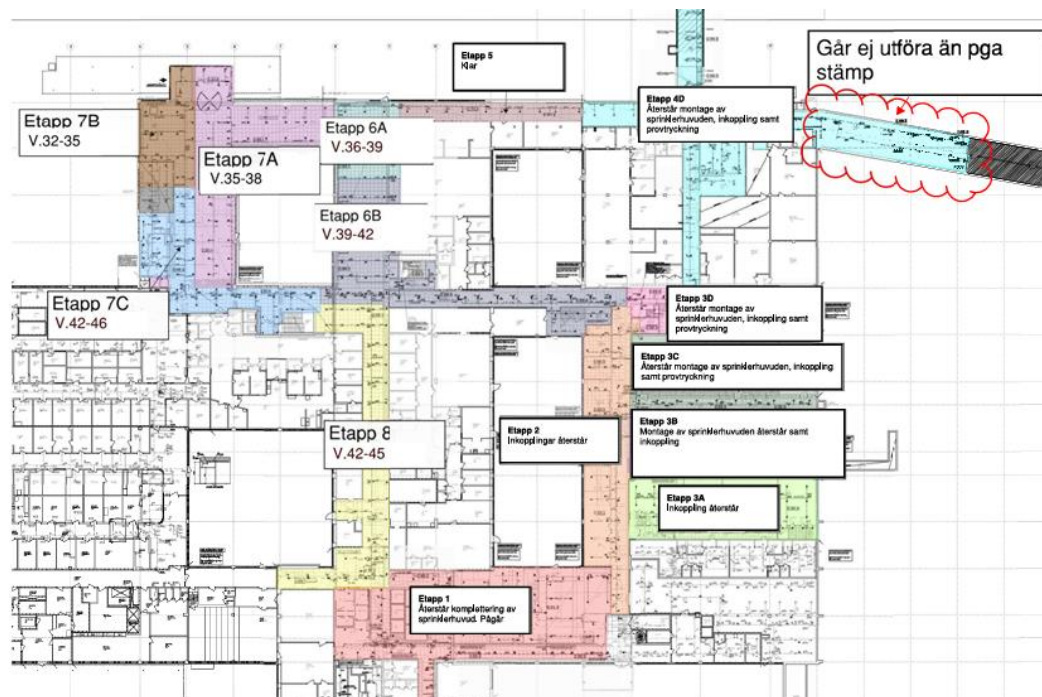

**Sprinklercentralen:** Installationsarbeten pågår.

### Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

[ebba.ericson@vgregion.se](mailto:ebba.ericson@vgregion.se)

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, [kristoffer.sideby@ramboll.se](mailto:kristoffer.sideby@ramboll.se)

Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, [benjamin.khatibi@ramboll.se](mailto:benjamin.khatibi@ramboll.se)

Stefan Berntsson, Kontrollant sprinkler, 070-811 15 78,

[stefan.berntsson@epg.se](mailto:stefan.berntsson@epg.se)

### Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, [anders.jarlgard@serncon.se](mailto:anders.jarlgard@serncon.se)

Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, [jesper.rosen@serncon.se](mailto:jesper.rosen@serncon.se)

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

[fredrik.unosson@serncon.se](mailto:fredrik.unosson@serncon.se)
