



2026-09-02

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 37-38 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion utomhus

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 01 och i norr pågår montage på plan 00.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Under v. 37 kommer SU påbörja städning av plan 00. Under v. 38 startar arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar samt assistera SU med snickeriåtgärder.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Arbete med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder skall infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Invändigt: Under arbete med besiktningsanmärkningar samt snickeriåtgärder för SU kan lägre ljudnivåer samt borring förekomma.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50

malin.dahlstedt@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inredning av förråd startade vecka 23.

Fortsatt planering sker parallellt för OP1 med kommande etapper. Arbetet kommer även samordnas med dörrbyten.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men ska inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Planerad sluttid för projektet är Q3 2026.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 0702 38 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 0763 46 14 59

omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Projektets start:

Färdigställande: Q4 2026

För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q2 2027

För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.


Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

- Etapp 4 - Arbete med trumma i måsgången fortsätter
- Etapp 7B - Montage av ventilationsdon och lampor pågår
- Etapp 7A - Rivning pågår. Sprinkler sätter stammar
- Etapp 6A - Rivning

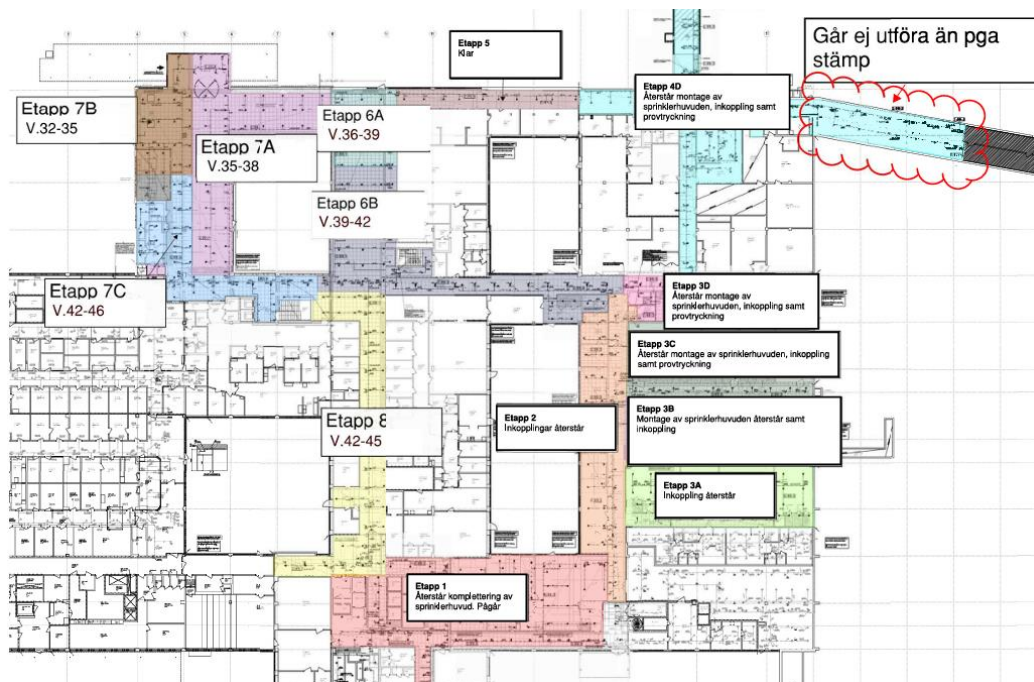

Sprinklercentralen: Installationsarbeten pågår, Vägg gipsas på containersidan.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Stefan Berntsson, Kontrollant sprinkler, 070-811 15 78,

stefan.berntsson@epg.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se

Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

fredrik.unosson@serncon.se

Diagnosvägen 11, Byte av ventilationsaggregat.


Projektet avser byte av ventilationsaggregat TAFA50 placerat i fläktrum på plan 3 ovan CK lågdel väster (mot parkeringen). Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd. Befintligt aggregat är från 1978 och betjänar blandade typer av lokaler i byggnad 4236 CK lågdel väster, bland annat entré, administrativa lokaler, labb och vårdlokaler. Aggregatet betjänar totalt ca 12 500 m² inklusive källarvåning (plan 98).

Bytet innefattar en utbyggnad av fläktrummet på plan 3 samt lokala arbeten på plan 99 till 02 med installation av brandspjäll.

Kranlyft kommer att göras framför huvudentrén enligt nedan arbetsplatsöversikt.

Materialupplag med staket runt etableras enligt arbetsplatsöversikt samt en byggställning och bygghiss sätts upp mot lågdelens norrafasad. Ett väderskydd kommer också byggas över fläktrummet.

Tidplan produktion 2026–09 till 2027–10.

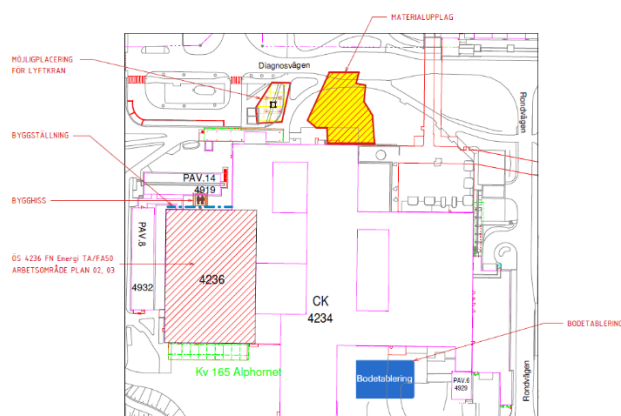

Kontakt: Robin Staaf, Projektledare, 0734-459671,

robin.staaf@vgregion.se
