



2026-09-18

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 39-40 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion utomhus

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

Utvändiga arbeten

- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 02 och i norr pågår montage på plan 01.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen. Behandlingsvägen är avstängd i västlig riktning till och med vecka 48.

Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Pågår inflytt av SU samt snickeriåtgärder och rättelse av mindre besiktningsanmärkningar.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.

Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Arbeta med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder skall infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- **Invändigt:** Under arbete med besiktningsanmärkningar samt snickeriåtgärder för SU kan lägre ljudnivåer samt borrning förekomma.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Bodil Sjans, projektledare, 070- 368 29 98

bodil.sjans@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Färdigställande: Q4 2026

Projektet avslutas i november. Just nu sker enbart mindre anpassningar i enstaka rum. Dialog sker direkt med påverkad verksamhet.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 070-238 58 21,

Jesper.Hertzman@karlanders.se

Omid Khavary, platschef, 076-346 14 59, omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Färdigställande: Q4 2026

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.

Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q2 2027

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.


Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

- Etapp 4 – Arbete med trumma i Måsgången fortsätter med byggnation av ny inbyggnadslåda.
- Etapp 7B - Montage av lampor återstår.
- Etapp 7A - Sprinkler sätter stammar. Undertak startar på tisdag.
- Etapp 6A - Rivning. Sprinkler startar med stammar.
- Etapp 6B Startar vecka 39. På grund av ändring på etapptidplan revs tak i fysioterapin före semestern och nu ska vi försöka dra in sprinkler där i nästa vecka om bemanningen tillåter detta.

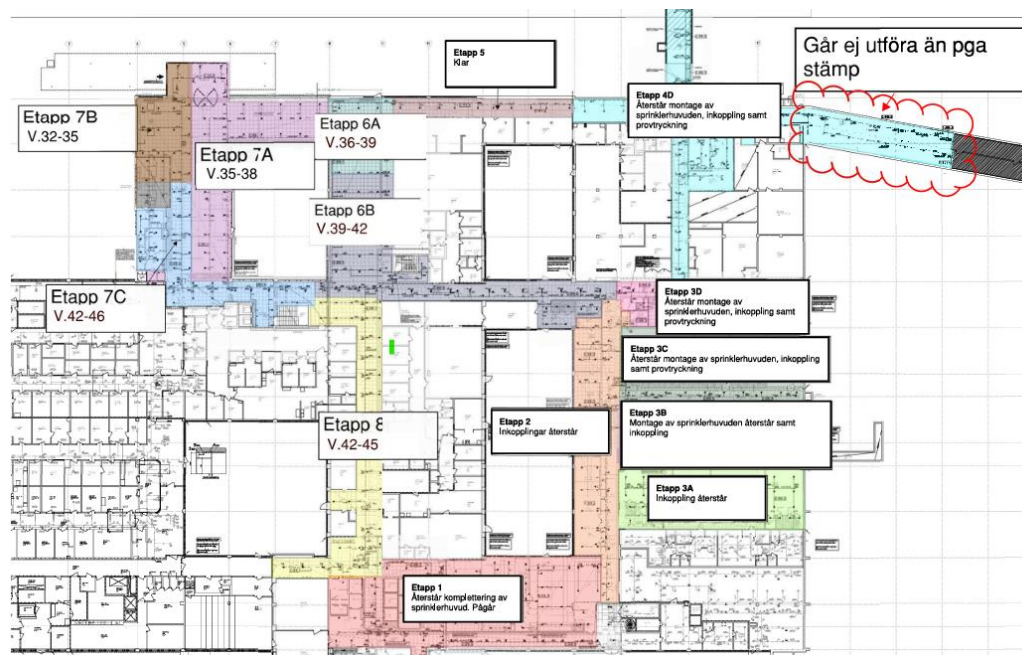

Sprinklercentralen MC: Installationsarbeten pågår.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Stefan Berntsson, Kontrollant sprinkler, 070-811 15 78,

stefan.berntsson@epg.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se

Jesper Rosén, Platschef, 0700 - 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

fredrik.unosson@serncon.se

Diagnosvägen 11, Byte av ventilationsaggregat

Nuläge: Uppstart Etablering. Arbeten på värmesystemet.

Påverkan för verksamheten kommande veckor:

2026-09-25 klockan 7 till 16 stängs värme av i 4236 (lågdelen mot parkeringen)

Etablering ställning och bygghiss enligt nedan, inhägnad materialupplag och bodetablering.


Byggstart: 2026-09

Klart: 2027-10

Projektet avser byte av ventilationsaggregat TAF50 placerat i fläktrum på plan 3 ovan CK lågdel väster (mot parkeringen). Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd.

Bytet innefattar en utbyggnad av fläktrummet på plan 3 samt lokala arbeten på plan 99 till 02 med installation av brandspjäll.

Kranlyft kommer att göras framför huvudentrén enligt nedan arbetsplatsöversikt.

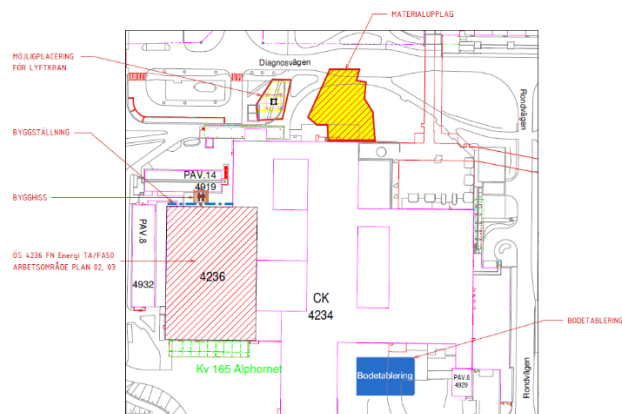

Omgivningspåverkan

25 september klockan 7 till 16 stängs värme av i 4236 (lågdelen mot parkeringen)

Materialupplag med staket runt etableras enligt arbetsplatsöversikt.

Byggställning och bygghiss sätts upp mot lågdelens norrafasad. Ett väderskydd kommer byggas över fläktrummet.

Kontakt

Robin Staaf, Projektledare, 0734-459671, robin.staaf@vgregion.se

Daniel Dimitriev, Bitr. Projektledare, 0704-203024,
daniel.dimitriev@vgregion.se

Entreprenör

Peter Schülén, entreprenadchef ISAB, 070- 8346521,
peter.schulen@isabvent.se

Ola Stridh, Arbetsledare ISAB, 0721-63 45 88, ola.stridh@isabvent.se
