



2026-09-28

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 40-41 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.

För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till [Projektnyheter Östra](#).

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion utomhus

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

Utvändiga arbeten

- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 02 och i norr pågår montage på plan 01.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen. Behandlingsvägen är avstängd i västlig riktning till och med vecka 48.

Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Pågår inflytt av SU samt snickeriåtgärder.
- **Dockningsarbeten CK flera plan:** Ytorna som ska ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99-02.

Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Arbete med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder ska infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
Tätskiktsarbeten på bottenplatta kan skapa tillfällig påverkan i form av lukt.
- **Invändigt:** Under arbete med snickeriåtgärder för SU kan lägre ljudnivåer samt borring förekomma.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,

rebecca.engvall@vgregion.se

Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se

Bodil Sjans, projektledare, 070- 368 29 98

bodil.sjans@vgregion.se

Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,

mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Färdigställande: Q4 2026

- Projektet avslutas i november. Just nu sker enbart mindre anpassningar i enstaka rum. Dialog sker direkt med påverkad verksamhet.

Kontakt

- Jesper Hertzman, projektledare, 070-238 58 21, Jesper.Hertzman@karlanders.se
- Omid Khavary, platschef, 076-346 14 59, omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget

Färdigställande: Q4 2026

- Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.
- **Plan 98:** Nya väggar och demontering.
- **Plan 99–09:** Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

- Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt

Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se

Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen

Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.

Färdigställande: Q2 2027

- Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

- Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:


- Etapp 4: Målning av trumma i korridor Måsgången.
- Etapp 6B: Sprinkler demonteras i undertak.
- Etapp 7C: Sprinklermontage.
- Sprinklerhuvud sätts i fysioterapin.
- Ihopkoppling av sprinkler i etapp 1-5.
- Provtryckning sprinkler i etapp 3-4.
- Jobb i VVS-schakt 24 (plan 98-08) enligt separat tidplan.
- Etapp 3: Start av sanering asbest i WC-grupper i omklädningsrum. Arbetsområdet kommer att vara väl inplastat och försett med undertryck så det finns ingen risk för spridning av skadliga partiklar.

Barnkliniken plan 99:

- Etapp 3-4: Sprinklerarbeten pågår.
- Klädförråd: flyttar till plan 00.

Kvinnokliniken plan 99:

- Etapp 1: Demontering av undertak i senare delen av veckan.

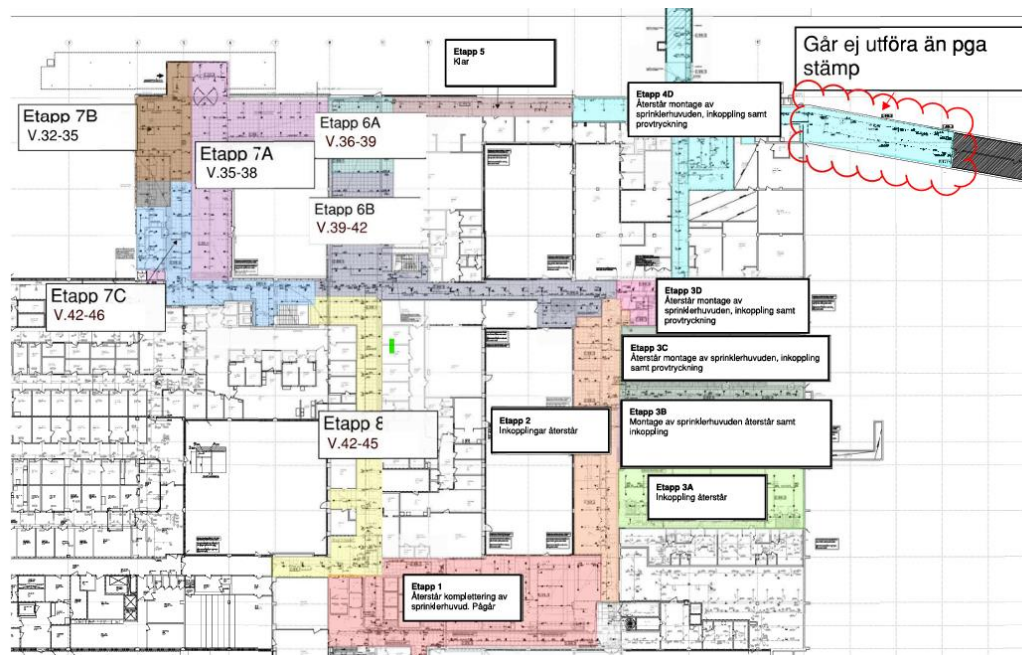

Sprinklercentralen MC: Installationsarbeten pågår.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,

ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, byggläda, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Stefan Berntsson, kontrollant sprinkler, 070-811 15 78,

stefan.berntsson@epg.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se

Jesper Rosén, platschef, 0700 - 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, tillträdande platschef, 0704-45 50 27,

fredrik.unosson@serncon.se

Diagnosvägen 11, Byte av ventilationsaggregat

Nuläge: Uppstart Etablering. Planering inför omkoppling till provisorisk ventilation


Påverkan för verksamheten kommande veckor:

Etablering ställning och bygghiss enligt nedan, inhägnad materialupplag och bodetablering.

Byggstart: 2026-09

Klart: 2027-10

- Projektet avser byte av

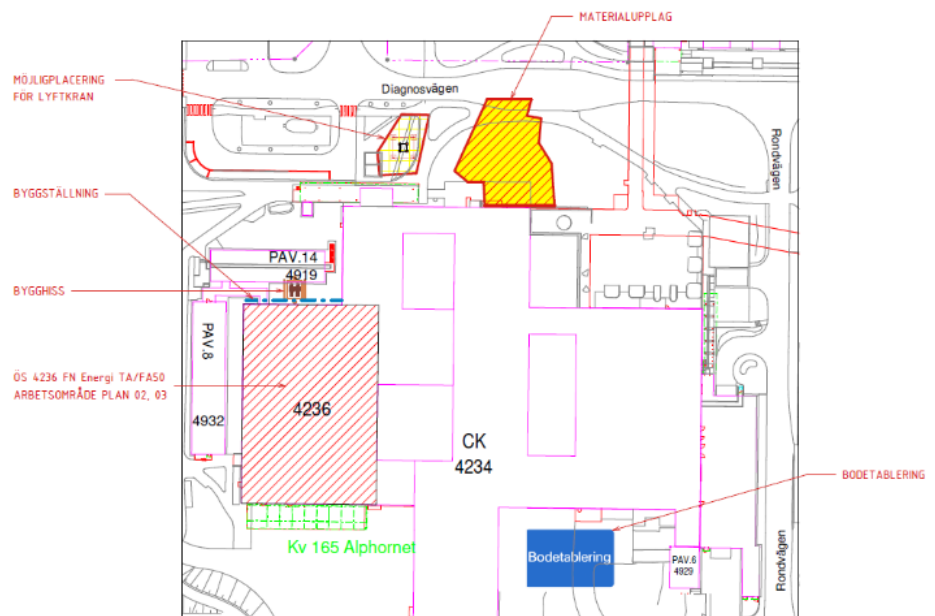

ventilationsaggregat TAFA50 placerat i fläktrum på plan 3 ovan CK lågdel väster (mot parkeringen). Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska

- livslängd.
- Bytet innefattar en utbyggnad av fläktrummet på plan 3 samt lokala arbeten på plan 99 till 02 med installation av brandspjäll.
- Kranlyft kommer att göras framför huvudentrén enligt nedan arbetsplatsöversikt.

Omgivningspåverkan

- Materialupplag med staket runt etableras enligt arbetsplatsöversikt. Byggställning och bygghiss sätts upp mot lågdelens norrafasad. Ett väderskydd kommer byggas över fläktrummet.

Kontakt

Robin Staaf, Projektledare, 0734-459671, robin.staaf@vgregion.se

Daniel Dimitriev, Bitr. Projektledare, 0704-203024,

daniel.dimitriev@vgregion.se

Entreprenör

Peter Schülén, entreprenadchef ISAB, 070- 8346521,

peter.schulen@isabvent.se

Ola Stridh, Arbetsledare ISAB, 0721-63 45 88, ola.stridh@isabvent.se
