

Projektnyheter CK

Datum



Projektnyheter Centralkliniken vecka 43-44

I detta informationsbrev samlar vi information om kommande aktiviteter i följande projekt:

- **CK Ny fasad**
- **Arbeten i korridor/kulvert plan 99**
- **Medicinnottagningar och sprututbyte plan 99 4236 lågdel väst**
- **Anpassning av besöksparkering P1**
- **MiV, Verksamhetsanpassning**

CK Ny fasad

Aktuellt vecka 43–44

Etapp 2:1

- Utvändigt arbete med sockel och förbindelsegång (bypass).

Etapp 2:2

- Fönsterbyten färdigställs, förutom avseende plan 99 där arbeten pågår löpande.
- Utvändig sanering plan 99
- Fasadarbeten
- Onsdag vecka 44 sker besiktning. Demontering av ställning påbörjas därefter.

Etapp 3:1

- Vecka 43 fönsterbyten påbörjas.
- Vecka 43 sågning för större fönster påbörjas med start på plan 7

Etapp 3:2

- Vecka 43, måndag står kran i Gropen för att lyfta in ställningsmaterial till innergården.
- Vecka 43 ställningsbyggnation påbörjas

Etapp 3:3

- Vecka 43 Ställningsbyggnation påbörjas för del som hör till innergård av etapp 3:3.

Planerat slutdatum för entreprenaden är december 2025

Omgivningspåverkan

Ljudliga arbeten sker kl. [13-16](#) enligt nedan.

Generellt:

- Innergården (berör etapp 3:1, 3:2 och del av 3:3) är avstängd t.o.m. maj 2025
- Kran i gropen måndag vecka 43 innebär ökad trafik. Välj gärna annan väg in i huset.

Etapp 1:3

- Ökad trafik på grund av ställningsrivning

Etapp 2:2

- Sanering av fasad sker löpande. Fönster ska hållas stängda.

- Vecka 44 öppnas del av fasad upp på plan 99 för påkoppling mot ny förbindelsegång.
- Den 30 oktober utförs invändig besiktning stickprovsvis. Det kan hända att vi knackar på och det är ok att inte släppa in oss.

Ettapp 3:1

- Sanering av fasad sker löpande i samband med fönsterbyten. Fönster ska hållas stängda.
- Vecka 43 torsdag-fredag sågning för större fönster plan 7 kl. 13-16
- Vecka 44 torsdag-fredag sågning för större fönster plan 6 kl. 13-16

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36,

anton.fredriksson@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, 0707 23 73 04, dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

Arbeten i korridor/kulvert plan 99

Nedan sammanfattas information från fasadprojektet, bårhusombyggnationen, samt arbetet med den nya förbindelsegången.

Aktuellt vecka 43-44


- Invändiga arbeten inom bårhuset pågår.
- Arbeten med bårhusdörrar mot korridor (inringat med blått nedan).
- Arbeten med ny förbindelsegång pågår.
- Montage av fönster och dörrar i fasad (inringat med rött). Utvändig sanering sker löpande
- Vecka 44 öppnas del av fasaden upp för påkoppling mot den ny förbindelsegången. Mer information om hur detta genomförs kommer nästa vecka.
- Dörrar i korridor för ny sluss till bårhuset har monterats. Dessa dörrar står uppställda tills vidare.

Planerat slutdatum för ombyggnation bårhus och förbindelsegången är december 2024

Omgivningspåverkan

Arbeten i korridor pågår.

- Arbetsområdet visualiseras med gul-svart tejp på golvet.
- Arbeten med dörrar till bårhuset sker inom nischerna. Området är inplastat.
- Minst 2 hantverkare är alltid på plats när arbeten pågår.
- En yrkesgrupp i taget för att inte för mycket arbeten ska pågå samtidigt.
- Fönstermontage görs från insidan. En bock (liten stege) kommer att användas vid fönstermontaget, vilken kan flyttas snabbt vid behov.
- Det är alltid minst 150 cm fri passage
- Inget material förvaras i korridoren.
- Berört arbetsområde enligt nedan.

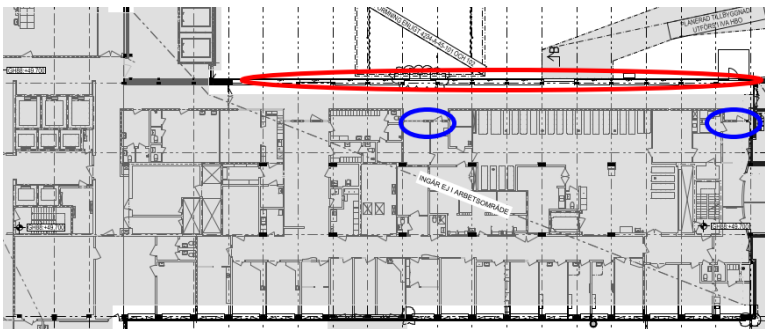

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Mariana Karlsson, byggledare, 0708-32 65 78, mariana.karlsson@sweco.se

Anton Fredriksson, Projektledare, 0762-91 83 36, anton.fredriksson@vgregion.se

Kontakt Entreprenörer

Dennis Reinhamre, RA Bygg, entreprenadingsenjör, 0707 23 73 04,

dennis.reinhamre@rabygg.com

För akuta händelser vardagar kl.07-16: **0704-147027**

Medicinmottagningar och sprututbyte plan 99 4236 lågdel väst

Aktuellt vecka 43-44

Arbete pågår i hisschakt på plan 1, montering av inspektionslucka samt målning kvarstår, arbetet vid hissen på plan 1 beräknas att färdigställas under vecka 43.

Arbetet med rivningen av skärmtaket på utsidan vid etableringsområdet beräknas även det vara klart under vecka 43.

Under vecka 44 fortlöper arbetet inom arbetsområdet, inga större omgivningspåverkade arbeten är planerade att genomföras utöver det fortsatta arbetet i korridoren.

Entreprenaden beräknas pågå fram till december 2024.

Omgivningspåverkan

- Transportbilar passerar tills vidare grindarna in till etableringsområdet för leveranser.
- Då arbete genomförs i korridoren vid den västra entrén till Centralkliniken, uppskattas det att de som har möjlighet att i stället nyttja huvudentrén gör detta.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 070- 238 58 21,

jesper.hertzman@karlanders.se

Jenny Bjärnesjö, byggleddare/kontrollant, 070-975 33 55,

jenny.bjarnesjo@caconsult.se

Kontakt Entreprenörer

PEAB Byggservice AB

Arbetschef: Stefan Ekstorm

Platschef: Michael Odhe

Anpassning av besöksparkering P1

Hösten 2024 – våren 2025

Besöksparkeringen P1 är i behov av en upprustning. Ombyggnationen kommer resultera i en parkeringsyta med mer inslag av träd och planering samt en mer omfattande belysningsanläggning än tidigare.

En del av parkeringsytan kommer även iordningställas med ett flertal cykelställ med tak.

Från måndagen den 30 september kommer besöksparkering P1 vara helt avstängd.


Arbetena planeras vara klara till juni 2025.

Under denna tid kommer besöksparkeringen att flyttas till parkering P3 vid Pressbyrån.

För att kompensera för de personalplatser som tas i anspråk kommer det att finnas ett begränsat antal parkeringsplatser vid den gamla helikopterplattan, samt att övre plan i besöksgaraget öppnas för personalparkering. Personal hänvisas i övrigt till övriga parkeringsytor på området. Bl a öppnas tillfällig personalparkering upp vid gamla helikopterytan samtidigt som P1:an stängs. Det kan vara fördelaktigt att överväga kollektivtrafik under denna period.

Mer information om vart personal och besökare hänvisas finns att läsa här:

[Östra sjukhuset: Ombyggnation av parkering P1 - VGR fastigheter \(vgregion.se\)](https://vgregion.se/ostra-sjukhuset-ombyggnation-av-parkering-p1-vgr-fastigheter)

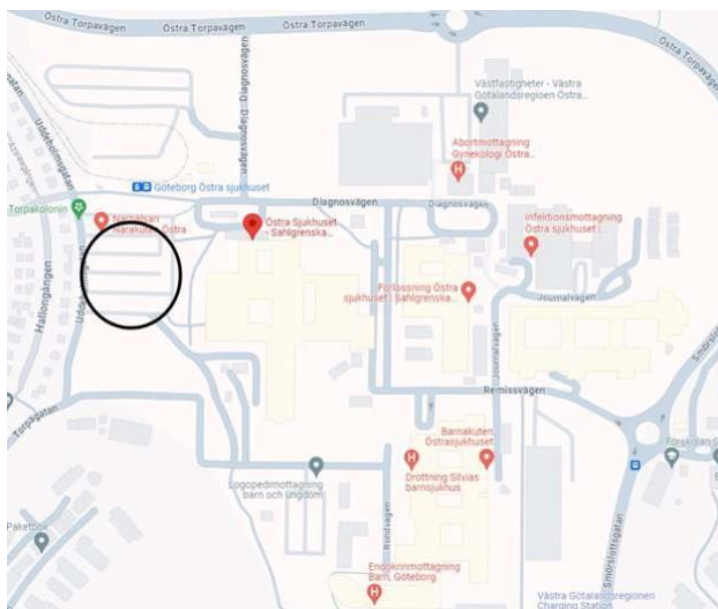

Kontakt

Peter Hansson, Projektledare, tel: 0733-255 470, e-post: peter.hansson@karlanders.se

Magnus Johansson, Byggladare, tel: 070-3281698, e-post:

magnus.johansson@karlanders.se

Henrik Brunngård, Arbetsledare HTE Produktion, tel: 0707-658727, e-post:

henrik.brunngard@hteproduktion.se

MIV, verksamhetsanpassning

Aktuellt vecka 43-44

Arbeten startar v.43 avdelning 353 Hematologi och trombos.

Nu pågår planering för avdelning 356B och avdelning 355 diabetes endokrin med start v.44.

Planerad sluttid för projektet är andra kvartalet 2025.

Omgivningspåverkan

Arbetet innebär att man gör lokala Anpassningar med skåp och hyllor. Vissa transporter av material till och från arbetsområdet kan ta plats i korridorer men skall inte vara långvarigt utan försvinner samma dag. Berörd verksamhet informeras.

Kontakt Projektledning, Fastighet, stöd och service

Jesper Hertzman, Projektledare, 0702 38 58 21, Jesper.Hertzman@karlanders.se

Kontakt Entreprenörer

Mikael Sandblom, platschef, 0733 37 41 75, mikael.sandblom@peab.se

Västfastigheters Kundtjänst www.vastfastigheter.se
