

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg



Byggprojekt, Botaniska trädgården 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan vecka 39 och 40

- Gjutning pågår på arbetsplatsen och betongbilar framförs både på Fanny grens väg och Malmgårdsgatan kommande 2 veckor.
- Schaktarbete för ny försörjningsväg pågår, medför trafik från schaktbilar både på Fanny grens väg och Malmgårdsgatan.

- Montage av gabionmuren kommer att ske till och från kommande veckor. Arbetet medför korta avbrott i framkomligheten på stigen vid vitsippsbäcken.
- Byggtrafiken påverkas även av avstängning Askimsgatan och kör därför andra vägar. Avstängning sker med anledning av projektet Ombyggnad Annedalsmotet som utförs av Göteborgs stad.

Generell omgivningspåverkan:

- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15.
- Stora byggtransporter till och från arbetsplatsen sker kontinuerligt.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Lättfyllnadsarbetena är färdiga och man kommer nu att påbörja grovjustering för den östra delen utvändigt. Den nya försörjningsvägen runt växthuset ner mot norra delen kommer att grovjusteras inom kort som förberedelse inför asfaltering. Gabionmurar monteras succesivt medan grovjustering sker. Utvändiga betongarbeten fortsätter också sin framdrift där man färdigställer murarna på östra sidan, för att sedan gå ner till norra sidan och gjuta den sista väggen.

Mellanväggar invändigt som skärmar av de olika avdelningarna börjar bli klara. Därefter fortsätter samtliga installatörer med att färdigställa sina montage.

Ställningarna invändigt demonteras i samma takt som installatörerna gör färdigt sina montage. Kompletteringar fortsätter i kontorsdelarna och arbetsrummen för att färdigställa dessa utrymmen.

Växthusdelarna fortsätter sin framdrift och inom 2 veckor är gångbryggan på plats. Efter det fortsätter markarbeten och betongarbeten i dessa delar.



Figur 1. Vy från söder




Figur 2. Pågående arbete med gabionmur och ny försörjningsväg



Figur 3. Invändig vy från avdelning djungel & ruin



Figur 4. Fläktluftvärmare och shuntgrupper installerade i förökningsavdelning

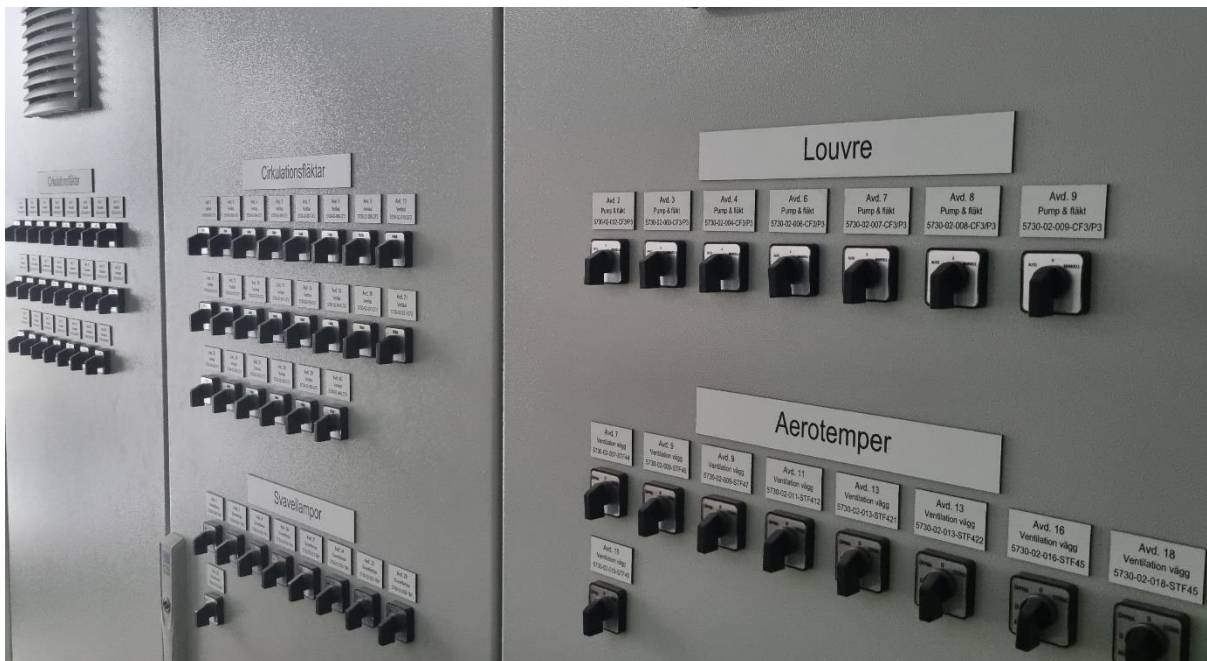

Figur 5. Kontrollpanel för tekniska installationer

Avstängning stig i vitsippsdalen

Stigen mellan Askimgatan och naturreservatet Vitsippsdalen är återigen öppen. Vissa arbeten kvarstår och kommer ske under hösten men dessa arbeten hanteras med flaggvakter, stigen kommer ej att stängas av helt.

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB
