



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

Projektnyheter Östra sjukhuset

2025-november-2026 januari

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset. I projektnyhetererna samlar vi information om projekten samt ger dig som arbetar på området en idé om vad som är på gång de kommande månaderna. Här finns en [karta över byggområden](#).

Här finns också information om hur byggprojekten påverkar framkomligheten på området.

- Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)
- Information om projekten på centralkliniken (CK) skickas varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).
- Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).
- Mer information finns på [VGR fastigheter](#).

Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden.

I projektnyhetsbrevet berättar vi kort om de större projekt som pågår på tomten. Alla påverkar inte omgivningen, men kan vara bra att känna till.

Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

Tack för din förståelse!

Robert Thorn, huvudprojektledare och Jennifer Olsson, huvudförvaltare

Innehåll

Det pågår många projekt på Östra sjukhuset. Genom att klicka på länkarna nedan kan du lätt välja den information du behöver.

[Allmänt läge på tomten](#)

[Nya adresser på Östra sjukhuset](#)

[Ny vårdbyggnad förlossning och neonatal](#)

[Ätstörningscentrum, utemiljö tillfälliga lokaler](#)

[Barn- och ungdomspsykiatri](#)

[Barnkliniken, höjning av sänghiss](#)

[Centralkliniken, dörrbyte i trapphus E](#)

[Centralkliniken, nytt ställverk](#)

[Centralkliniken, ny fasad](#)

[Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare](#)

[Maskincentralen, takplan](#)

[Infektionskliniken, nytt ställverk](#)

[Sprinklersystem, etapp 7.4](#)

[Borrhåslager](#)

[Sop- och tvättsugsanläggning](#)

[Framkomlighet på Östra sjukhuset](#)

Nya adresser på Östra sjukhuset

Den **1 december 2025** förlängs Vitaminvägen och adressförändringar kommer att ske.

De entréer som tidigare haft adress Rondvägen 14 och 15 kommer nu få adresser på Vitaminvägen och en adress på Vitaminvägen kommer få ett nytt nummer.

I och med adressjusteringen kommer isolersalarna i Barnsjukhuset få en egen adress. Det betyder att det går att hämta koordinater vilket underlättar för ambulanstransporter.

Förändringar

- Vitaminvägen 21 ändras till **Vitaminvägen 26**
- Rondvägen 14 ändras till **Vitaminvägen 27**
- Rondvägen 15 ändras till **Vitaminvägen 30**
- Entrén som i nuläget saknar adress får adressen **Vitaminvägen 34** (isolersalarna på den nya delen av Barnsjukhuset).

Ny gatuskyltning och områdekartor kommer att ha uppdaterats tills att gatunamnbytet sker.

Belägenhetsadresserna uppdateras direkt på angivet datum hos Lantmäteriet. Registrerade adresser blir gällande direkt, men det kan ta ett litet tag innan kommersiella karttjänster hämtar och uppdaterar sin adressinformation (ex. google maps).

Kontaktperson

Jessica Uussalu, fastighetsförvaltare, 076-514 56 69,
jessica.uussalu@vgregion.se

Projektnyheter-östra sjukhuset november-januari 2025

Projektnummer etapp 2, 11714 – KK

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q1 2028. Veckobrev skickas ut inom projektet till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

Bilder

På bilderna ser vi hur byggnadsstrukturen växer.



Aktuellt kommande månader

November

Just nu monteras bjälklag och väggelement som ska bli plan 4 & 5 på huset. Ytterväggarna har kommit upp runt huset där man ser fasadens färdiga yta i form av terrazzo på stora delar. De gråa elementen på gavlarna skall kläs med keramikplattor. Cirka 600 prefabricerade element monteras per plan. En

våning i taget görs och tar ca 3–4 veckor. Huset består av totalt 9 våningar ovan mark. Två tornkranar lyfter dessa element på plats.

Samtidigt monteras det stålpelare och smide för konstruktionen.

Längs fasaden reser man ställning för montage av glaspartier och fönster. Via ställningen tas även material in på gavlarna via fyra bygghissar.

Installationer monteras längst ner i huset på plan 98 och 99. Elektriker, rörläggare och sprinklerinstallatörer är på plats. Montage av innerväggar sker på samma våningsplan. På plan 98 görs bland annat rumsbildning för installationsutrymmen, förråd och teknikrum. På plan 99 görs omklädningsrum för personal, konferensrum, personalrum och förråd.

Betonghåltagningar borrar på flera våningsplan för installationer.

December

Stomresning fortsätter på plan 6 och 7. Konstruktionssmide monteras samtidigt.

Montage av glaspartier och fönster runt huset kommer vara i gång från fasadställningen. I samband med detta görs även arbeten med plåtomfattningar och foggjutningar i elementskarvar. Keramikplattor monteras på delar av husets fasad.

Invändigt sker montage av installationer. Arbeten kommer vara i full gång på el, ventilation och rördragningar med fjärrvärme, fjärrkyla och sprinkler. Även innerväggar byggs under denna månad.

Januari

Stomresning fortsätter på plan 8 och 9 vilket är husets översta våningar. Konstruktionssmide monteras samtidigt.

Montage av glaspartier och fönster runt huset kommer vara i gång från fasadställningen. I samband med detta görs även arbeten med plåtomfattningar och foggjutningar i elementskarvar. Keramikplattor monteras på delar av husets fasad.

Invändigt sker montage av installationer. Arbeten kommer vara i full gång på el, ventilation och rördragningar med fjärrvärme, fjärrkyla och sprinkler. Även innerväggar byggs under denna månad.

Kontakt, projektledning VGR

Stefan Carlsson, projektledare, stefan.carlsson@vgregion.se

Jenny Bratberg, projektledare, jenny.bratberg@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, jonas.riedel@karlanders.se

Magnus Johansson, byggledare, magnus.johansson@karlanders.se

Entreprenör: K21 Entreprenad

Platschef: Fredrik Södergren

Ätstörningscentrum, utemiljö tillfälliga lokaler

Projektnummer 12107 - KK

Syfte och mål med projektet: Projektet innefattar att tillskapa en inhägnad utemiljö för patienter till ÄTC samt ny tillgänglig utgång till uteplats. Arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2025.

Arbetsområdet är runt lastkajen på KK (i söder, mot BK). Nödutrymningsväg kommer att hållas öppen men övrig gångtrafik hänvisas till övriga entréer på KK.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, Projektledare, 076-5314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

Barn- och ungdomspsykiatri

Projektnummer 11245 - BK

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt hus för barn- och ungdomspsykiatri på Östra sjukhuset. Det nya huset planeras stå klart för inflyttning Q2 2028.

Det nya huset kommer placeras på samma ställe som det nuvarande BUP-huset och lokalerna anpassas bättre efter verksamheternas behov och krav på säkerhet. Huset kommer anslutas i kulvert till det övriga sjukhuset.

Ätstörningscentrum, som ingår i Barn och ungdomspsykiatri, kommer att få nya lokaler i nuvarande barnsjukhuset i direkt anslutning till det nya BUP-huset.

Arbetet med genomförandeplanering och detaljprojektering pågår under 2025. Politiskt beslut om genomförande väntas under senhösten 2025.

November

Arbete med rivning inleds. Vi kommer bland annat starta med tungrivning (huset börja rivas).

Arbetet medför störningar i form av ljud från grävmaskin.

Framkomligheten till kringliggande verksamheter påverkas väldigt lite då vi är innanför vårt arbetsområde och kör bara iväg lastbilar med fyllda containrar.

December

Arbete med rivning pågår med grävmaskin. Vi kommer även riva fasaden mot MTL (egen info går till dem)

Arbetet medför störningar i form av ljud från grävmaskin när den skrapar rent berget från jordmassor.

Framkomligheten till kringliggande verksamheter påverkas väldigt lite då vi är innanför vårt arbetsområde och kör bara iväg lastbil med fyllda containrar. In och utgång för personal hänvisas till huvudingången och ej i på innegården.

Januari

Arbete med rivningen slutförs under januari månad

Arbetet medför inga störande ljud.

Framkomligheten till kringliggande verksamheter påverkas väldigt lite.

Kontaktperson

Roger Harrysson, projektledare, 072-2012463, roger.harrysson@vgregion.se

Barnkliniken, höjning av sänghiss

Projektnummer 11851 – BK

→ Projekt klart!

Syftet med projektet: är att få en hiss som betjänar plan 7, då endast hiss går till plan 6, detta är för att skapa god arbetsmiljö för transporter av gods.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, 076-5314438, lisa.jerrhagen@vgregion.se

Centralkliniken, dörrbyte i trapphus E

Projektnummer 12001 – CK

Inom ramen för planerat underhåll kommer ett antal dörrar i anslutning till trapphus E i CK att bytas ut.

Arbetet är planerat att inledas vecka 37 och kommer att pågå under hösten 2025. Slutbesiktning är inbokat torsdag 2025-10-30.

Projektet omfattar utbyte av flera befintliga dörrar i och omkring trapphus E.

Tider för respektive dörr kommer sättas upp på respektive plats och veckobrev kommer skickas ut till berörda i projektet.

Syfte och mål med projektet: Att höja säkerhetsnivån, funktionen, förbättra tillgängligheten, brandsäkerheten och modernisera dörrmiljön i trapphusområdet genom ett samlat utbyte av äldre dörrar.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Joel Lindström, projektledare, 076-4003531, joel.lindstrom@vgregion.se

Centralkliniken, nytt ställverk

Projektnummer 11427 – CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q3/Q4 2026. Projektet arbetar med kanalisation och kabeldragning ovan undertak plan 99-09. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 072-2363358, johan.ekstrand@vgregion.se

Centralkliniken, ny fasad

Projektnummer 10969 – CK

Bilder

Närbild på den färdiga fasaden.



Entreprenad pågår och beräknas vara klar Q4 2025. Detta projekt ingår i ett gemensamt nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Att förbättra inneklimatet för verksamheten, samt minska energiförbrukningen och förbättra utseendet på huset. Fasaden kommer tilläggsisoleras, fönster kommer bytas och ny fasad kommer byggas på CK högdal. Även taket kommer bytas. Projektet är en del av regionens mål om att halvera energiförbrukningen till 2030.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Kalle Jarnebrink, projektledare, 070-5934965, kalle.jarnebrink@sweco.se

Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare

Projektnummer 11407 – CK

Bilder

Bilden till höger är en prototyp på hur fasaden ska se ut.



Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt ingår också i det gemensamma nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkamaravdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkamarbehandling både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

Omgivningspåverkan

Nybyggnation

Utvändigt pågår schaktarbeten och första gjutningen av betongplatta är utförd.

Södra infarten till P1 är avstängd för att säkerställa säker passage för gående.

Ombyggnation

Invändigt pågår arbeten med uppbyggnad av ny planlösning för plan 00 samt håltagning för nya installationer.

Aktuellt kommande månader – Nybyggnation

November

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

December

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Det förekommer mycket transporter via lastbil till och från arbetsplatsen.

Januari

Utvändigt pågår arbeten med schaktning, pålningsarbeten, armering och betonggjutningar. Under januari beräknar schaktningen vara nere till berg för nordvästra arbetsområdet och spräckning av berg kommer utföras.

Aktuellt kommande månader – Ombyggnation

November

Invändigt kommer arbeten med uppbyggnad av ny planlösning att fortgå under hösten på plan 00. Arbeten som sker är håltagning för installationer och uppbyggnad av nya väggar. Det förekommer också arbeten som påverkar andra våningsplan. Dessa arbeten görs i samråd och planering med berörda verksamheter.

December

Kabeldragning och montering av installationer på plan 00. Planering för dockning av ny byggnad mot befintlig byggnad pågår. Respektive verksamhet kommer bli kontaktade för detaljplanering av dessa arbeten.

Januari

Kabeldragning och montering av installationer på plan 00. Planering för dockning av ny byggnad mot befintlig byggnad pågår. Respektive verksamhet kommer bli kontaktade för detaljplanering av dessa arbeten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnation, 072-208 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Emma Westerberg, projektledare ombyggnation, 072-201 05 72,
emma.westerberg@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 070-238 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Entreprenör: Skanska

Henrik Lindström, Platschef, 010-448 18 41, henrik.lindstrom@skanska.se

Maskincentralen, takplan

Projektnummer 11750 – MC

Det är klart att entreprenören Saltskar AB övertar ansvaret för genomförandet av projektet.

Uppstart kommer ske under v. 44 och arbeten planeras till att vara färdigställda till slutet av december.

Syfte och mål med projektet: Förlänga livslängden på taket för MC genom nytt fall, komplettering av brunnar och nytt tätskikt. Byggnation av en ny terrass i anslutning till matsal för projektkontor/drift sker i samband med projektet.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Lars Carlsson, projektledare, 070-35 30 533, lars.carlsson.2@wsp.com

Infektionskliniken, nytt ställverk

Projektnummer 11425 – IK

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 072-2363358, johan.ekstrand@vgregion.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Projektnummer 11278

Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 kommer påbörjas under november 2025. Entreprenör jobbar nu med att ta fram en tidplan och genomförandeplan som ska presenteras och förankras med verksamheten och andra berörda intressenter innan arbetena påbörjas.

Detta projekt kommer behöva ha tät dialog med verksamheten. Nyhetsbrev kommer att skickas ut inom projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99. Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt

sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Bygga ut sprinklerinfrastruktur för att förbättra brandsäkerhet samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.


Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Kristoffer Sideby, projektledare, 076-7641316, kristoffer.sideby@ramboll.se

Borrhåslager

Projektnummer 11645

Bilder

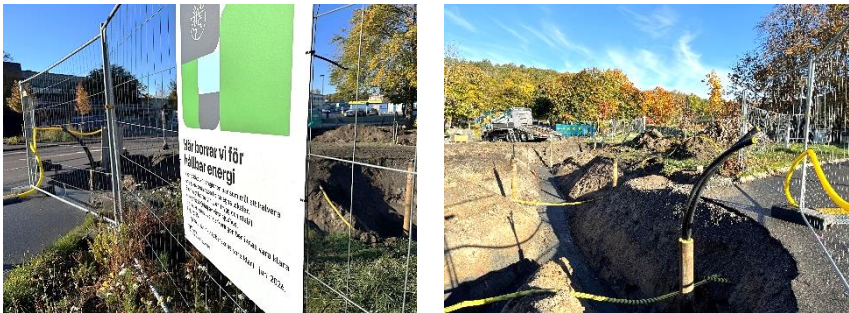

Entreprenaden påbörjades i juli med utvändiga arbeten med borrhning i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. P-platser i anslutning till Gasklockan (P-yta P5) är ännu ej återställda på grund av pågående kulvertarbeten innanför husliv i anslutning till fasad hus MC. Dessa arbeten beräknas vara klara i mitten/slutet av november. Borrhning av borrhål i parken förväntas pågå fram till december. Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till sommaren 2026. Nu pågår även arbeten på tak ovan hus MC inför montage av nya kylmaskiner.

Syfte och mål med projektet: Borrhåslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhåslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även

Återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Mikael Johansson, 070-7321256, mikael.s.johansson@vgregion.se

Sop- och tvättsugsanläggning

Projektnummer 11113

Entreprenad är klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, TBS), inväntar nu att få komma i gång med sista etappen som är FoN som preliminärt startar upp under Q4 2025. Här ingår även att koppla in tvättsugsystemet för KK, BK och TBS. Tidpunkt för uppstart av arbetet i IVA/HBO är ej inplanerat än.

Entreprenad beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Installation av nytt sop- och tvättsystem för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och internservice.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Robert Thorn, projektledare, 072-2450636, robert.thorn@vgregion.se

Framkomlighet på Östra sjukhuset

Bilar

Det finns ingen genomfart på Östra sjukhuset för cykel och bil.

- Rondvägen är stängd för genomfart för cykel och bil från 2023 och framåt.
- Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen
- Ambulans kör in till vuxenakuten via Remissvägen, men ut via Diagnosvägen.
- BUP-akuten nås via Smörslottsgatan 3.
- Övriga akutmottagningar (förlossning, psykiatri och infektion) nås via Vitaminvägen.
- Behandlingsvägen förbi Drottning Silvias barnsjukhus är enkelriktad och passage är enbart möjlig från väster.
- Utfart från Remissvägen, Journalvägen och Behandlingsvägen enbart via Remissvägen.
- Diagnosvägen nås enbart via norra infarten.

Framkomlighet gång och cykel

På grund av arbetsområden, trånga passager samt bygg- och ambulansstrafik finns det ingen genomfart för cykel på Östra sjukhuset. sjukhusområdet. Cyklister hänvisas runt sjukhusområdet.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

Parkering

Parkeringsituationen på området är mycket begränsad. Välj om möjligt alternativa färdvägar till Östra sjukhuset.

Mer information om framkomlighet finns på webbplatsen fastighet.vgregion.se eller via länken [Framkomlighet och byggområden - VGR fastigheter](#)
