



Projektnyheter och omgivningspåverkan Östra sjukhuset

Projektnyheter Östra sjukhuset

2026 maj-juli

För närvarande genomförs flera byggprojekt på Östra sjukhuset. I projektnyhetererna samlar vi information om projekten samt ger dig som arbetar på området en idé om vad som är på gång de kommande månaderna. Här finns en [karta över byggområden](#).

Här finns också information om hur byggprojekten påverkar framkomligheten på området.

- Läs även SU:s [nyhetsbrev om bygg- och lokalfrågor](#)
- Information om projekten på centralkliniken (CK) skickas varje vecka, dessa återfinns på webbplatsen [VGR fastigheter](#).
- Kontaktuppgifter finns i anslutning till respektive projekt. För allmänna frågor kontakta [kundtjänst på VGR Fastigheter](#).
- Mer information finns på [VGR fastigheter](#).

Allmänt läge på tomten

De pågående projekten påverkar såväl verksamhet som framkomlighet på området. Information om projekten skickas ut månadsvis vid behov tillsammans med en karta med markerade byggområden.

I projektnyhetsbrevet berättar vi kort om de större projekt som pågår på tomten. Alla påverkar inte omgivningen, men kan vara bra att känna till.

Ta kontakt med berörd projektledare om du önskar ytterligare information.

Tack för din förståelse!

Robert Thorn, huvudprojektledare och Jennifer Olsson, huvudförvaltare

Innehåll

Det pågår många projekt på Östra sjukhuset. Genom att klicka på länkarna nedan kan du lätt välja den information du behöver.

Allmänt läge på tomten	1
Förlossnings och neonatal	3
Barn- och ungdomspsykiatri.....	6
Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad.....	7
Barnkliniken, nytt ställverk	8
Tillväxthuset, fasadbyte.....	8
Centralkliniken, nytt ställverk.....	9
Centralkliniken, nytt ventilationsaggregat	9
Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare .	11
Infektionskliniken, nytt ställverk	13
Sprinklersystem, etapp 7.4	14
Borrhåslager	15
CHA (Centricity High Acuity)	16
Sop- och tvättsugsanläggning	17
Framkomlighet på Östra sjukhuset.....	18

Förlossnings och neonatal

Projektnummer 11714 – Etapp 2

Etapp 2 (byggentreprenad) startade 4 augusti 2025. Projektet beräknas vara klart i sin helhet Q2 2028.

Syfte och mål med projektet: Ny vårdbyggnad för att säkra framtidens förlossnings- och neonatalvård.

Omgivningspåverkan

Arbetet påverkar framkomligheten på Östratomten. Se information på [VGR fastigheter](#)

- Genomfart för biltrafik via Rondvägen är avstängd.
- Enbart passage för gångtrafikanter mellan arbetsområdet och Centralkliniken. Cykel ska ledas.
- Cykelväg genom sjukhusområdet är avstängd.

Bilder



Från våningsplan 8



Utvändig bild från norra sidan om FoN

Aktuellt kommande månader

Maj

Takanslutningen mot fasad på plan 02 i KK påbörjas liksom rivning av fasadställning på plan 09–02 mot KK. Fasadkeramik fortsätter monteras på husets västra sida. De två tornkranarna på arbetsplatsen demonteras denna månad. Invändigt flytspacklas plan 01 och 03 för att avjämna golvytan. Invändigt fortsätter också installationsarbeten främst på plan 07. Montering

av två personhissar påbörjas denna månad. På plan 99 och 05 påbörjas gipsning av de stommade väggarna när huset nu är tätt.

Juni

Invändigt fortsätter installationsarbeten på samtliga plan. Monteringen av personhissar fortgår denna månad. Gipsning av enklade väggar fortsätter på våning 00. Fasadskivor fortsätter monteras på västra sidan om fasaden.

I förbindelsehallen mot KK fortsätter montering av taksargar och taktäckning påbörjas. Denna månad ska förbindelsehallen mellan KK & FoN ha tätt hus.

Juli

Arbeten som kan tänkas pågå under veckorna 28-31 är installationsarbeten på samtliga våningsplan, samt monteringsarbeten med person- och IVA-hissar. Samtidigt fortsätter montering av gipsväggar på plan 00 (markplan) och plan 06.

Förbindelsegång CK-FoN

Projektnummer 11682

K21 ska bygga en förbindelsegång mellan Centralkliniken och FoN.

Maj

Utfackningsväggarna börjar monteras denna månad.

Juni

Denna månad påbörjas monteringen av fasadpartier på förbindelsegången. Man påbörjar även ombyggnationen av det befintliga skärmtaket på CK.

Juli

Eventuellt håller bygget stängt v. 28-31 p.g.a. byggsemester. Fasadpartier fortsätter monteras.



Kontakt, projektledning VGR

Stefan Carlsson, projektledare, stefan.carlsson@vgregion.se

Jenny Bratberg, projektledare, jenny.bratberg@vgregion.se

Jonas Riedel, byggledare, jonas.riedel@karlanders.se

Magnus Johansson, byggledare, magnus.johansson@karlanders.se

Entreprenör: K21 Entreprenad

Platschef: Fredrik Södergren

Barn- och ungdomspsykiatri

Projektnummer 11245 - BK

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt hus för barn- och ungdomspsykiatri på Östra sjukhuset. Det nya huset planeras stå klart för inflyttning Q2 2028.

Det nya huset kommer placeras på samma ställe som det nuvarande BUP-huset och lokalerna kommer anpassas bättre efter verksamheternas behov och krav på säkerhet. Huset kommer anslutas i kulvert till det övriga sjukhuset.

Ätstörningscentrum, som ingår i Barn och ungdomspsykiatrin, kommer att få nya lokaler i nuvarande barnsjukhuset i direkt anslutning till det nya BUP-huset. Detaljprojektering pågår feb-okt 2026. Byggstart våren 2027.

Maj

Entreprenör har etablerat sig och borring av berg samt sprängning kommer påbörjas. Även schaktning av mark kommer utföras inom arbetsområdet. Planering och uppstart att göra en tillfällig väg förbi arbetsområdet startar.

Juni

Entreprenör har etablerat sig och borring av berg samt sprängning pågår. Schaktning av mark utföras inom arbetsområdet. Ny tillfällig väg förbi arbetsområdet pågår

Juli

Slutskede på sprängning och uppbyggnad av källare och platta på mark pågår. Schaktning av mark utföras inom arbetsområdet. Ny väg förbi arbetsområdet klar och används av transporter till och från tillväxten samt ambulanstransporter till barnsjukhusets isolerrum.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Roger Harrysson, projektledare, 072-2012463, roger.harrysson@vgregion.se

Barnkliniken, plan 2-3, ombyggnad

Projektnummer 12105 – BK

Västra Götalandsregionen planerar ett större ombyggnationsprojekt på Barnkliniken. Ombyggnationen omfattar två våningsplan på BK-höghus.

Detta är ett delprojekt och ingår i samma genomförandebeslut som Barn- och ungdomspsykiatri, nytt BUP-hus.

Dessa plan behöver byggas om för att kunna flytta nuvarande mottagningsverksamhet inom mage, tarm, lever samt ögon i plan 01 samt administration i plan 00 lågdel C. Plan 00-01 i lågdel C ska därefter byggas om för att kunna inrymma framtida ätstörningscentrum, ÄTC.

Våningsplanen ska byggas om för att anpassas till:

Plan 2 – Administrationsplan

Plan 3 – Mottagningsplan

Preliminär inflyttning är februari 2027. Projektet omfattar stomren rivning och totalt utbyte av tekniska installationer för de berörda våningsplanen.

Just nu pågår rivning av framförallt undertak och väggar på båda våningsplanen. Entreprenören planerar nu upp de mer ljudligt störande arbetena så dessa kan samplaneras med omkringliggande vårdverksamhet.

Maj

Rivning och sanering fortsätter på båda planen.

Omkoppling av avlopp som går upp till plan 4.

Byggnation av innerväggar startar på plan 3.

Juni

Rivning och invändiga arbeten

Juli

Invändiga arbeten fortsätter

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Lisa Jerrhagen, projektledare, 0765-31 44 38, lisa.jerrhagen@vgregion.se

Katarzyna Obuchowska, byggledare, 0765215523

katarzyna.obuchowska@vgregion.se

Barnkliniken, nytt ställverk

Projektnummer 11426 – BK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q4 2027.

Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 07 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt ingår i det gemensamma nyhetsbrevet för BK som skickas ut varannan vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Tillväxthuset, fasadbyte

Projektnummer 11993 – TVX

Projektet innebär ett fasadbyte på tillväxthuset. Entreprenaden pågår och beräknas vara klar i sin helhet Q2 2027.

Etapp 1 innefattar den rektangulära delen och färdigställs under Q2 2026

Etapp 2 innefattar den ovala delen och planeras att pågå under Q1-Q2 2027.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Emil Gurbani, projektledare, 0765-279 930, emil.gurbani@vgregion.se

Centralkliniken, nytt ställverk

Projektnummer 11427 – CK

Entreprenad pågår och beräknas vara klar under Q2 2027. Projekt kommer byta ställverk samt installera ny elkraftsinfrastruktur från ställverk plan 98 till plan 09 i form av kanalskenor och nya kraftmatningar ut till elcentraler i nord och syd på alla plan. Detta projekt kommer ingå i det gemensamma nyhetsbrevet för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Arbete pågår på plan 98 samt kanalisation och kabeldragning på våningsplan enligt tidplan.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Centralkliniken, nytt ventilationsaggregat

Projektnummer 11398 – CK

Projektet omfattar byte av befintligt ventilationsaggregat LA50 samt utbyggnad av befintligt fläktrum.


Projektet beräknas starta 2026 juni och pågå fram till och med 2027 september.

Nuläge: Upphandling till 2026 maj

Syfte och mål med projektet: Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd. Befintligt aggregat är från 1978 och betjänar blandade typer av lokaler i byggnad 4236 CK. Det betjänar bland annat entré, administrativa lokaler, labb och vårdlokaler. Aggregatet betjänar totalt ca 12 500 m² inklusive källarvåning (plan 98).

Projektet är också en del i den satsning Västra Götalandsregionen gör för att minska energianvändningen i egna fastigheter målsättningen är en halvering av energianvändningen till år 2030 jämfört med 1995.

Omgivningspåverkan

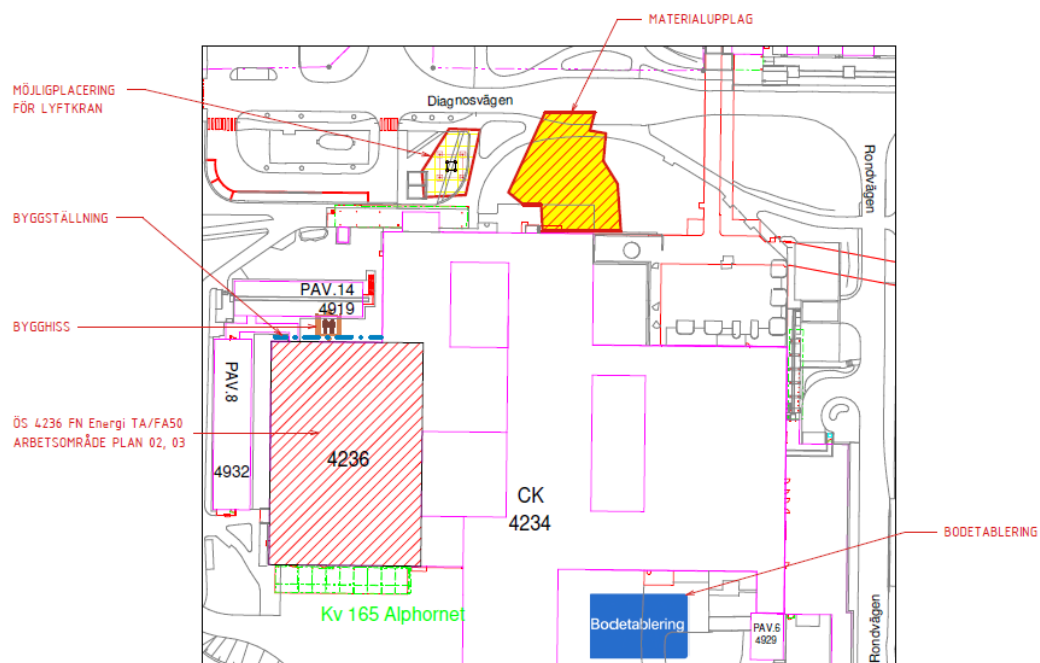

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Robin Staaf, projektledare, 0734-459671, robin.staaf@vgregion.se

Centralkliniken, intensivvård och tryckkammare

Projektnummer 11407 – CK

Bilder

Bilden till höger visar arbetet i norra delen av schaktgropen.



Entreprenad pågår och projektet beräknas vara klart i sin helhet under Q2 2028. Projektet kommer ha en stor omgivningspåverkan på tomten. Detta projekt ingår också i det gemensamma nyhetsbrev för CK som skickas ut varje vecka till berörda intressenter.

Syfte och mål med projektet: Projektet kommer att vara ett viktigt steg i att bygga ut och modernisera Östra Sjukhuset. Det kommer att vara en del i att bygga ett robustare sjukhus som klarar framtida utmaningar. De nya lokalerna kommer att inrymma en intensivvårdsavdelning och en tryckkammarsavdelning anpassat till framtida behov. Östra Sjukhuset kommer att öka kapaciteten för kombinerad intensivvård och tryckkambearbejdning både för regionen och på riksnivå. De nya lokalerna kommer att erbjuda en vårdmiljö som blir en attraktiv arbetsplats och ger möjlighet till avancerad forskning. Patienten sätts i fokus då transporter minimeras genom att lokalisera behandlingsresurser på samma plan och i närheten av varandra.

Omgivningspåverkan

Nybyggnation

Utvändigt pågår markjusteringar, armering och betonggjutningar.

Södra infarten till P1 är avstängd för att säkerställa säker passage för gående.

Ombyggnation

Invändigt pågår arbeten med montering av installationer på plan 00. Stomljud kan förekomma i byggnaden från borringen för installationer.

Dockningsarbeten

Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Gäller södra och västra delen av CK högdal samt vid södra delen av CK lågdal. Utvändigt arbete som tidigare var planerad v.18 med rivning burspråk södra delen av CK högdal har utgått på grund av metodbyte.

Aktuellt kommande månader – Nybyggnation**Maj**

Utvändigt pågår arbeten med armering och betonggjutningar för bottenplatta och källarväggar.

Juni

Utvändigt pågår arbeten med armering och betonggjutningar samt montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag).

Juli

Arbete med stommontage.

Aktuellt kommande månader – Ombyggnation**Maj**

Finjusteringar för ytskikt och montering installationer samt montage av fast inredning.

Invändiga dockningsarbeten i CK högdal och CK lågdal.

Juni

Färdigställande och avslutande arbete på plan 00 inför besiktning. Förberedelse för verksamhetens inredning så som kameror och pendlar.

Invändiga dockningsarbeten i CK högdal samt fasadarbeten för dockning vid norra delen av CK lågdal.

Juli

Ombyggnationen har semesterstängt mellan v.28 och v.31.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Kristoffer Lind, projektledare nybyggnation, 072-208 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se

Malin Dahlstedt, projektledare ombyggnation, 0793-44 00 50,
malin.dahlstedt@vgregion.se

Jesper Hertzman, Byggledare, 070-238 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se

Entreprenör: Skanska

Mattias Svanberg, Platschef, 010-448 37 07, mattias.svanberg@skanska.se

Infektionskliniken, nytt ställverk

Projektnummer 11425 – IK

Arbete pågår med att montera samman det nya ställverket.

Arbetet beräknas pågå till Q4 2026.

Syfte och mål med projektet: Att säkerställa hög driftsäkerhet för kontinuitet i eldistributionen samt redundans för att minimera avbrottstiden vid fel och underlätta planerade underhållsarbeten utan strömavbrott och därmed minimera störningar för verksamheten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se

Sprinklersystem, etapp 7.4

Projektnummer 11278

Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025 och har slutbesiktning under februari 2027.

Samordningsmöten med planeringsledare har hållits och kommer att fortsätta hållas kontinuerligt under projektet.

Nyhetsbrev skickas ut varje vecka av projektet till berörda intressenter gällande åtgärder med omgivningspåverkan inom framförallt plan 99.

Projektet omfattar utbyggnad av sprinklerinstallationer i plan 98 och 99, samt sprinklermatning upp i schakt och trapphus. I samband med sprinklerinstallationer rustas undertak och belysning upp i plan 99. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Projektet ska bygga ut sprinklerinfrastrukturen för att förbättra brandsäkerheten samt underlätta för framtida påkopplingar på sprinklersystemet.

Under maj- juli pågår arbete i kulvertar, schakter och apparatrum på plan 98 samt arbeten med ny sprinklercentral i MC. Centralen blir innanför portarna direkt söder om MC lastkaj. Under maj – augusti kommer även arbeten utföras i CK plan 99. Det omfattar korridorer, omklädningsrum, förråd och gångkulvertar. Men också mer centrala delar som i och utanför reception, utanför butik och bibliotek.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Kristoffer Sideby, projektledare, 076-764 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Borrhåslager

Projektnummer 11645

Bilder



Entreprenaden påbörjades i juli 2025 med utvändiga arbeten med borrhning i parken samt schaktarbeten över parkeringen bakom SH. Bodetablering i norra delen av parken är nu flyttad, endast 2 st rullvagnar står på tomten. Borrhning utförs nu i norra delen av parken och är klart i början av maj. Den sista samlingskammaren levereras v.18. Schaktning i norra delen för samlingskammare och markslangar påbörjas under v.18. Finplanering ska vara klar inför planerad slutbesiktning före semestern.

Markentreprenören arbetar nu med finplanering, trädplanteringar och stensättningar i övriga delen av parken.

Invändiga arbeten inne i MC startade under augusti 2025 och projektet i sin helhet kommer att pågå med olika intensitet fram till sommaren 2026. För tillfället pågår arbeten med rörinstallationer till de nya kylvärmepumparna inne i MC. Under maj/juni planeras samordnad funktionsprovning och slutbesiktning är planerad till 1 juli.

Borrhåslagret ska kopplas till det befintliga tomtöverskridande värmeåtervinningssystemet och på så sätt möjliggöra värmeåtervinning mellan sommar- och vintersäsong för hela fastighetsobjektet, i syfte att minska mängden köpt energi. Sammankoppling mellan borrhåslagret och värmeåtervinningssystemet medför att samlingsledningar från borrhål förläggs i mark och dras igenom befintliga byggnader. Installation av en ny energicentral med kylvärmepumpar och kylmedelkylare ingår också i entreprenaden. Entreprenaden avser även återställande och upprustning av sjukhusparken efter driftsättning av det tekniska systemet.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Mikael Johansson, 070-732 12 56, mikael.s.johansson@vgregion.se

CHA (Centricity High Acuity)

Projektnummer 11933

Projekt CHA ska implementeras på ett antal avdelningar på Östra Sjukhuset, där byggnad KK och avdelning NeoIVA är först ut.

Kortfattat innebär det att data- och eluttag monteras för att kunna koppla upp mot en digital journal (CHA). Främst utförs detta på operationssalar och IVA platser. Befintliga byggnader som i dagsläget är berörda är BK, CK, KK och TBS.

SU planerar att implementera systemet från våren 2027.
Entreprenaden påbörjas i KK under våren 2026.

Status idag är att beslut väntas av SU inför att få starta. Planering sker nu tillsammans med avdelningarna. Första avdelningen kommer att påbörjas under våren 2026, där NeoIVA på KK är först ut. Man planerar att samordna PU-projektet Byte kallelse på NeoIVA plan 5.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Mikael Johansson, 070-732 12 56, mikael.s.johansson@vgregion.se

Sop- och tvättsugsanläggning

Projektnummer 11113

Installation av nytt sop- och tvättsystem görs för att effektivisera och förenkla hanteringen av sop- och tvätt för både verksamhet och intern service.

Entreprenaden är nu klar med huvuddel 2 (CK, IK, KK, BK, Drottning Silvias barnsjukhus). Inkoppling av tvättsugssystemet till KK, BK och Drottning Silvias barnsjukhus är slutbesiktigat och taget i bruk av verksamheten v 13.

Dragning av sop- och tvättrör i ny kulvert för förlossning och neonatal är klart. Montering av rör i husets schakter planeras starta v 15 och vara klart v 17 2026. Montering av sop- och tvättnedkastluckor startar preliminärt under januari/februari 2027.

Tidpunkt för arbetet i IVA/HBO är preliminärt maj till november 2027.

Entreprenaden beräknas vara klar i sin helhet 2027. Nyhetsbrev skickas ut vid behov inom projektet till berörda intressenter. Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Kontakt, projektledning, fastighet, stöd och service

Anton Fredriksson, projektledare, 0762918336,
anton.fredriksson@vgregion.se

Framkomlighet på Östra sjukhuset

Bilar

Det finns ingen genomfart på Östra sjukhuset för cykel och bil.

- Rondvägen är stängd för genomfart för cykel och bil från 2023 och framåt.
- Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen
- Ambulans kör in till vuxenakuten via Remissvägen, men ut via Diagnosvägen.
- BUP-akuten nås via Smörslottsgatan 3.
- Övriga akutmottagningar (förlossning, psykiatri och infektion) nås via Vitaminvägen.
- Behandlingsvägen förbi Drottning Silvias barnsjukhus är enkelriktad och passage är enbart möjlig från väster.
- Utfart från Remissvägen, Journalvägen och Behandlingsvägen enbart via Remissvägen.
- Diagnosvägen nås enbart via norra infarten.

Framkomlighet gång och cykel

På grund av arbetsområden, trånga passager samt bygg- och ambulansstrafik finns det ingen genomfart för cykel på Östra sjukhuset. sjukhusområdet. Cyklister hänvisas runt sjukhusområdet.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

Parkering

Parkeringssituationen på området är mycket begränsad. Välj om möjligt alternativa färd sätt till Östra sjukhuset.

Mer information om framkomlighet finns på webbplatsen fastighet.vgregion.se eller via länken [Framkomlighet och byggområden - VGR fastigheter](#)
