



Projektnyheter och omgivningspåverkan Sahlgrenska sjukhuset

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset mars – april 2025

På Sahlgrenska sjukhuset genomförs flera byggprojekt som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för mars och april 2025. Här hittar du en [karta över byggområden](#) och en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset.

Övergripande:

- [Informationsmöte: Omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska](#)
- [Omläggning media \(C\)](#)
- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)
- [Parkeringsplatser på Sahlgrenska sjukhuset](#)

Blå stråket:

- [Blå stråket 3, cykelparkeringsplatser](#)
- [Värmeåtervinning \(Blå stråket 15-17\)](#)

Bruna stråket:

- [Kulvertarbeten](#)

Gröna stråket:

- [Rivningsarbeten](#)

Vita stråket:

- [Värmeåtervinning \(Vita stråket 12-15\)](#)
-

Informationsmöte: Omgivningspåverkande projekt på Sahlgrenska

Välkommen till ett informationsmöte om projekt, utveckling och förvaltning på Sahlgrenskaområdet.

Datum, tid och plats

Fredagen den 28 februari 2025, kl 10.30-11.30.

Mötesplats: [Teams, klicka här för att ansluta till mötet](#)

Målgrupp och innehåll

Mötet vänder sig till dig som är intresserad av Sahlgrenska sjukhusets utveckling och vill få en uppdatering om aktuella och framtida projekt.

Mötet är också ett forum för att ställa frågor och dela synpunkter. Syftet är att presentera en övergripande bild av nuläget på Sahlgrenskaområdet:

- Ge information om aktuella projekt, utveckling och förvaltning.
- Förklara och utveckla den skriftliga informationen i detta nyhetsbrev, särskilt vad gäller omgivningspåverkande projekt den närmaste tiden.
- Presentera en översiktlig plan för kommande omgivningspåverkande projekt på kort sikt.

Mötesledare

Sofia Svala, huvudförvaltare, och Kajsa Hedlund, huvudprojektledare, Sahlgrenska tomten.

Varmt välkomna!

Omläggning media (C och I)

Projekt Omläggning media innebär att ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, tele, el med mera behöver installeras för att garantera försörjning till det befintliga sjukhuset när rivningsarbetet av Öron-, näsa-, halshuset, Per Dubbshuset och den gamla ambulanshallen genomförs. Projektet genomförs i olika faser och på olika platser på tomten för att säkerställa en kontinuerlig försörjning till sjukhuset under hela byggprocessen.

Blå stråket 5, Gröna stråket 1–4, mediaomläggning VA/fjärrkyla (C)

Arbetet med omläggning av fjärrkyla och VA vid Blå stråket 5 och längs Gröna stråket 1–4 är avslutat. Återställning av marken är påbörjad och pågår fram till och med april månad. Arbetet kan innebära tillfälligt påverkan på bil- och gångtrafik i området. Markvärmen kring entrén till akuttorget ska återställas och kompletteras. Arbetet utförs under mars och kommer under korta perioder påverka framkomligheten. Entrén kommer vara tillgänglig.

Vita stråket, installation av tillfällig reningsanläggning för VA (I)

I slutet av mars levereras en tillfällig reningsanläggning vars syfte är att rena dagvatten innan det leds ut i vitsippsbäcken. Anläggningen är placerad i container i nära anslutning till befintlig reningsanläggning kopparbrunnen. Förberedande mark- och ledningsarbeten pågår. Arbetet kan innebära tillfällig påverkan på bil- och gångtrafik i området.

Kontaktuppgifter för frågor om omläggning media

Bengt Toftby, byggledare, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Blå stråket 3, nya cykelparkeringsplatser

Nu finns det 65 nya cykelparkeringsplatser på Blå stråket 3.



Nya cykelparkeringsplatser på Blå stråket 3.

För mer information, kontakta

Bengt Toftby, byggledare, 072-388 21 90, benkt.toftby@karlanders.se

Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Bruna/Gröna stråket, kulvertarbeten (D)

Återställningsarbeten vid korsningen Bruna och Röda stråket, som inkluderar parkeringsplatser, rundkörningsytor, finplanering och installation av dagvattenbrunnar, är påbörjat. Arbetet kommer att utföras i flera steg och beräknas vara helt färdigställt i april 2025. Arbetsområdet kommer att variera under perioden, men framkomlighet kommer alltid vara möjligt.



Kulvertarbeten vid korsningen mellan Bruna och Röda stråket


För mer information, kontakta

- Kristoffer Flodin, byggledare, 073-361 95 58,
kristoffer.flodin@karlanders.se
- Peter Hansson, projektledare, 073-325 54 70,
peter.hansson@karlanders.se

Gröna stråket, rivningsarbeten (E)

Sponten mellan den nya ambulanshallen och platsen där den gamla ambulanshallen stod är nu på plats. Rivning av tak och väggar på Öron-, näsa-, halshuset har precis börjat. Den kommer att fortsätta under vår och sommar. Rivningsarbetet medför risk för spridning av damm samt buller och vibrationer. Projektet vidtar åtgärder för att minimera dessa risker. Verksamheter i byggnaderna närmast rivningsområdet ombeds att hålla fönster stängda.

Vårdverksamheter uppmanas att ta del av dokumentation från Vårdhygien och genomföra eventuella åtgärder inomhus. [Byggarbete i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra mögel- och legionellainfektion](#). Verksamheter som kan påverkas av störningar välkomnas till digitala samordningsmöten på måndagar. Kontakta [Hannah Gradman](#) eller [Christian Andersson](#).

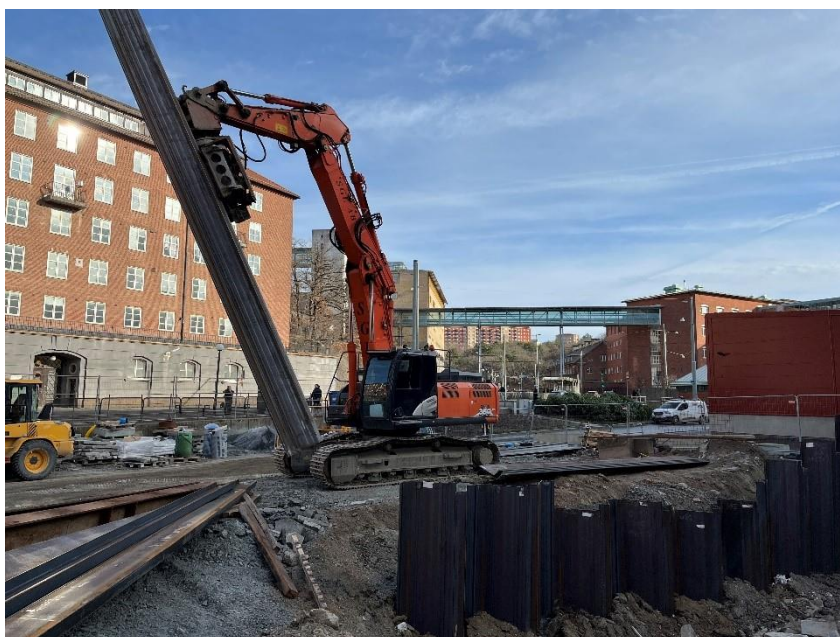

Spontningsarbeten utförs mellan den nya ambulanshallen och den tidigare ambulanshallens plats för att stabilisera marken vid schaktning.

Framkomlighet under rivningsarbeten

När rivningsarbetet görs på de byggnader som ligger närmast Per Dubbsgatan har rivningsområdet utökats och inkluderar även gång- och cykelbanan. För att säkerställa framkomligheten har gång- och cykeltrafiken flyttat ut i det innersta körfältet och biltrafiken vävs in i körfältet för kollektivtrafik. Framkomlighet för blåljusfordon och kollektivtrafik prioriteras. Körfältet har avgränsats med tydliga staket och andra fysiska hinder. Information om trafikpåverkan kommuniceras via Göteborgs stads kanaler (trafik Göteborg) och på [Förberedande arbeten för Sahlgrenska Life - VGR fastigheter](#)

För mer information, kontakta


- Christian Andersson, bygglidare, 073-156 57 06, christian.andersson@caconsult.se
- Hannah Gradman, projektledare, 072-203 10 17, hannah.gradman@vgregion.se

Vita stråket/Blå stråket, värmeåtervinning (K)

Vita stråket 13–15 och baksidan Blå stråket 15–17

Arbetena vid Blå stråket är färdiga och i slutet av februari övergick arbetet till Vita stråket där det kommer pågå i cirka 3,5 månader. Gångtrafikanter hänvisas med särskild skyltning. Framkomlighet till Vita stråket 12 från Bruna stråket finns, men väändomöjligheterna är begränsade. Vid schaktning kring kulverten på Vita stråket sätts spont, vilket medför högre ljudnivåer och mer

vibrationer än vid enbart schaktning. Vecka 9 och 10 sätts bullerskydd upp vid angränsande byggnader, det kan påverka ljusinsläppet (markerat i blått).

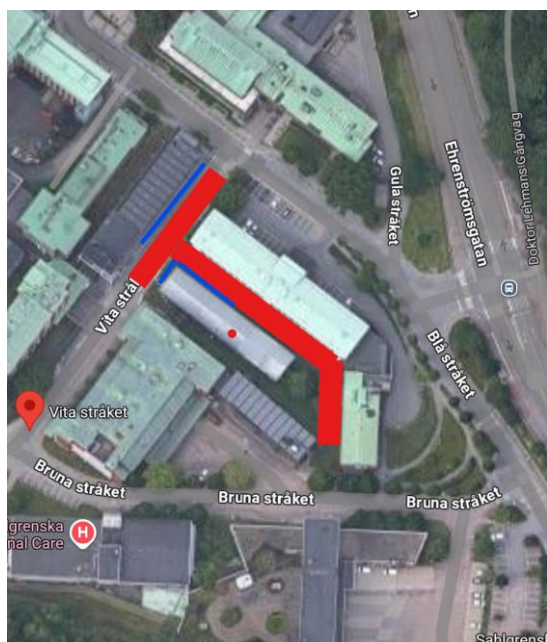

Vita stråket 12 – tillfällig flytt av busshållplats

Under arbetet med värmeåtervinningen (15 oktober–31 juli 2025) flyttas hållplatserna för Suturen och Returen från Vita stråket 12 till hörnet Vita stråket/Bruna stråket.

För mer information, kontakta

- Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
- Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07, jacob.jaeger@markenergibyggnarna.se

Infarter till Sahlgrenska sjukhuset

Sjukhuset har två infarter för biltrafik: Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan och Sahlgrenska huvudentré via Per Dubbsgatan. Infarten via Per Dubbsgatan är i första hand för transporter till akutmottagning och verksamheter på Blå stråket.

För mer information, kontakta

- Lotta Norlander, fastighetsförvaltare, 072-211 04 06, lotta.norlander@vgregion.se
- Sofia Svala, huvudförvaltare, 076-275 99 86, sofia.svala@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är brist på parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinaregatan.

För mer information, kontakta

parkering@vgregion.se
