

Projektnyheter Sahlgrenska sjukhuset januari – februari 2025

På Sahlgrenska sjukhuset genomförs flera byggprojekt som påverkar tillgänglighet och framkomlighet. Nedan följer en uppdatering för januari och februari 2025. Här hittar du en [karta över byggområden](#) och en [visuell tidplan](#) för Sahlgrenska sjukhuset.

Övergripande:

- [Infarter till Sahlgrenska sjukhuset](#)
- [Parkeringsplatser på Sahlgrenska sjukhuset](#)

Bruna stråket:

- [Bruna stråket, värmeåtervinning, etapp 2](#)
- [Bruna stråket 19–21, värmeåtervinning \(N\)](#)

Bruna/Gröna stråket

- [Bruna/Gröna stråket, kulvertarbeten \(D\)](#)

Gula stråket

- [Gula stråket 10, byte av anläggning \(G\)](#)

Gröna stråket:

- [Omläggning media \(C\)](#)
- [Gröna stråket, rivningsarbeten \(E\)](#)

Blå stråket:

- [Blå stråket, värmeåtervinning, etapp 2](#)

Vita stråket:

- [Vita stråket 12, flytt av hållplats för Suturen och Returen](#)
- [Vita stråket, värmeåtervinning, etapp 2](#)
- [Vita stråket 11/Bruna stråket 19, Vita stråket 11/Bruna stråket 19, byte av andningskompressor \(F\) byte av andningskompressor \(F\)](#)

Omläggning media (C)

Projekt Omläggning media innebär att ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, tele, el med mera behöver installeras för att garantera försörjning till det befintliga sjukhuset när rivningsarbetet av Öron-, näsa-, halshuset, Per Dubbshuset och den gamla ambulanshallen genomförs. Projektet genomförs i olika faser och på olika platser på tomten för att säkerställa en kontinuerlig försörjning till sjukhuset under hela byggprocessen.

Blå stråket 5, Gröna stråket 1–4, mediaomläggning VA/fjärrkyla (C)

Arbetet med omläggning av fjärrkyla och VA vid Blå stråket 5 och längs Gröna stråket 1–4 fortsätter under januari och februari. Arbetet med att anlägga ett dagvattenmagasin är i sin slutfas. Dock kan det förekomma buller från maskiner och transporter. Arbetet innebär tillfälligt påverkan på genomfart för mötande biltrafik vid Pressbyrån, som är begränsad fram till månadsskiftet januari-februari. Flaggvakter kommer att finnas på plats vid behov för att omdirigera trafiken och säkerställa en smidig passage för alla trafikanter. Återställning och återlämnade av ytor påbörjas i januari och arbetet avslutas i månadsskiftet mars-april.

Kontaktuppgifter för frågor om omläggning media

Bengt Toftby, byggledare, 072-388 21 90, bengt.toftby@karlanders.se

Josefin Hjorth, projektledare, 031-708 30 41, josefin.hjorth@caconsult.se

Bruna stråket, värmeåtervinning, etapp 2 (N)

Bruna stråket 21, markarbeten


Markarbetena vid Brunna stråket 21 pågår preliminärt fram till januari 2025, med återställning och asfaltering planerad under februari. Under arbetet kommer en kortare sträcka av vägen att vara begränsad till en fil, vilket innebär att trafiken kan passera i en riktning åt gången. Gångtrafikanter påverkas inte och kan passera obehindrat under hela arbetsperioden.

Bruna stråket 28–30, markarbeten vid lastgården

Markarbetena, som startade i september, har återupptagits och fortsätter fram till mitten av februari 2025. Lastgården är tillgänglig för transporter och har försetts med körplåtar, men under december kan det vara trångt i området. Vid behov finns flaggvakter på plats för att underlätta trafiken.

Kontaktperson:

Pontus Johansson, platsansvarig, 073-698 88 62

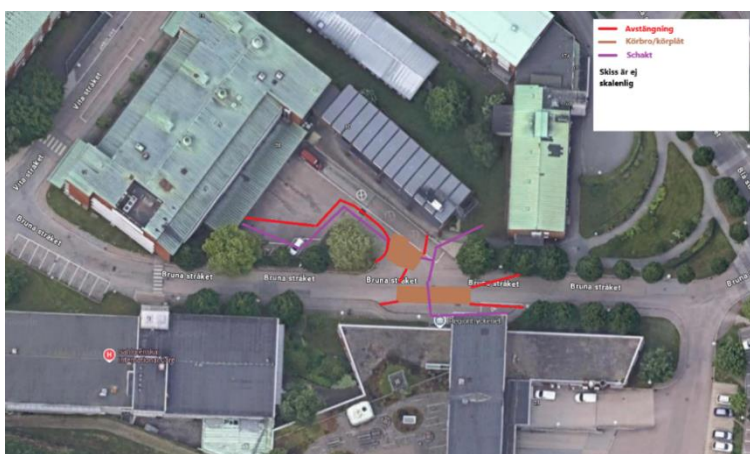

För mer information, kontakta

- Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
- Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07, jacob.jaeger@markenergibyggnarna.se

Bruna/Gröna stråket, kulvert (D)

Återställningsarbeten vid korsningen Bruna och Röda stråket, som inkluderar parkeringsplatser, rundkörningsytor, finplanering och installation av dagvattenbrunnar, är påbörjat. Arbetet kommer att utföras i flera steg och beräknas vara helt färdigställt i april 2025. Arbetsområdet kommer att variera under denna period men framkomlighet kommer alltid vara möjligt.



Kulvertarbeten vid korsningen mellan Bruna och Röda stråket

För mer information, kontakta

Kristoffer Flodin, byggledare, 073-361 95 58, kristoffer.flodin@karlanders.se
Peter Hansson, projektledare, 073-325 54 70, peter.hansson@karlanders.se

Gröna stråket, rivningsarbeten (E)

Den gamla ambulanshallen är nu riven. Under mitten av januari sätts en spont mellan den nya och platsen där den gamla ambulanshallen stod. Under mitten av februari påbörjas rivningen av Öron-, näsa-, halshuset. Spontnings- och rivningsarbetena medför risk för spridning av damm samt buller och vibrationer.

Projektet vidtar åtgärder för att minimera dessa risker. Verksamheter i byggnaderna närmast rivningsområdet ombeds att hålla fönster stängda. Vårdverksamheter uppmanas att ta del av dokumentation från Vårdhygien och genomföra eventuella åtgärder inomhus. [Byggarbete i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder för att förhindra mögel- och legionellainfektion.](#)

Verksamheter som kan påverkas av störningar välkomnas till digitala samordningsmöten på måndagar från mitten av januari. Tid och länk meddelas separat.

För mer information, kontakta

- Christian Andersson, byggledare, 073-156 57 06, christian.andersson@caconsult.se
- Hannah Gradman, projektledare, 072-203 10 17, hannah.gradman@vgregion.se

Blå stråket, värmeåtervinning, etapp 2 (K)


Blå stråket 7-15 (längs den tidigare matsalsbyggnaden), markarbeten

Markarbeten, som startade i september, pågår fram till och med januari 2025. Återställning och asfaltering sker under februari, och Blå stråket beräknas vara helt återställt och utan påverkan i mitten av februari. Arbetet sker i två etapper för att säkerställa åtkomst till CÖ-gården vid Blå stråket 9.

Biltrafik leds om bakom den tidigare matsalsbyggnaden, medan gående och cyklister kan passera som vanligt. Området vid Blå stråket 7 är fortsatt trångt. Under jul kommer schaktet täckas, men området är avspärrat och får inte användas som passage.

Kontakt för större transporter till CÖ-gården:

Pontus Johansson, platsansvarig, 072-698 88 62

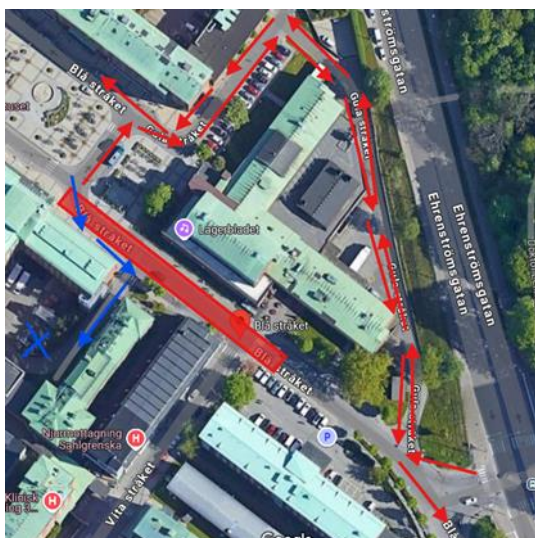

För mer information, kontakta

- Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
- Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07, jacob.jaeger@markenergibyggarna.se

Vita stråket 12, flytt av hållplats

Under arbete med värmeåtervinningsprojektet, perioden 15 oktober till 31 mars flyttas hållplatsen för Suturen och Returen från Vita stråket 12 till hörnet Vita stråket/Bruna stråket.

För mer information, kontakta

Pernilla Dittmer, projektledare,
072-887 07 32,
pernilla.dittmer@vgregion.se

Jacob Jaeger, entreprenör,
070-525 67 07,
jacob.jaeger@markenergibyggarna.se



Vita stråket, värme-återvinning, etapp 2

När arbetet med schaktning och återställning vid Blå stråket är slutfört och trafiken åter kan flöda som vanligt där, fortsätter projektet på Vita stråket. Arbetet beräknas pågå i cirka 3,5 månader. Gångtrafikanter ombeds följa anvisad skyltning.

Framkomlighet till Vita stråket 12 från Bruna stråket kommer att finnas, men vändmöjligheterna är begränsade.

För mer information, kontakta

- Pernilla Dittmer, projektledare, 072-887 07 32, pernilla.dittmer@vgregion.se
- Jacob Jaeger, entreprenör, 070-525 67 07, jacob.jaeger@markenergibyggarna.se



Bruna stråket 19–21, värmeåtervinning (N)

Ett projekt för att installera ett nytt system för värmeåtervinning pågår vid försörjningsbyggnaden, Bruna stråket 21. Arbetet sträcker sig från oktober 2024 till december 2025 och innebär att värme från försörjningsbyggnaden, kommer att återvinnas och återföras till sjukhusområdets värmenät. Projektet omfattar också installation av ett nytt kylaggregat och utbyggnad av befintligt teknikrum, där kylmedelkylare placeras på taket. Rödrdragningar sker längs fasaden och över taket på Bruna stråket 21.

I samband med installationen byts fjärrkyleväxlare och styrsystem ut. Ytterligare rödrdragningar utförs under lastkajen vid Bruna stråket 19–21, samt inkopplingar till befintliga undercentraler på Vita och Blå stråket för att koppla samman återvinnningssystemen. Bilden nedan visar arbetsområde.

**För mer information, kontakta**

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se

Vita stråket 11/Bruna stråket 19, byte av andningskompressor (F)



Från oktober till januari pågår arbete med att byta andningskompressorerna vid Vita stråket 11 och Bruna stråket 19. Det kan medföra kortvariga avstängningar av gångväg särskilt vid takarbete och håltagning, samt ljudstörningar från fasadarbete. En hyrkompressor finns vid Bruna stråket 4 för att säkerställa drift under bytet.

För mer information, kontakta

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se

Gula stråket 10, byte av anläggning (G)

Från oktober till februari byts anläggningen för xylen och formalin på patologen ut. Arbetet innebär rivning och montage i teknikutrymmet, och ett arbetsområde kommer att spärras av enligt bilden nedan.

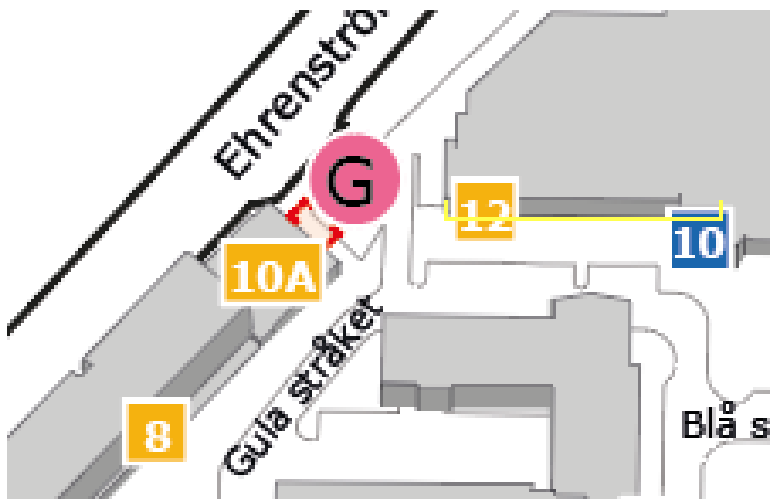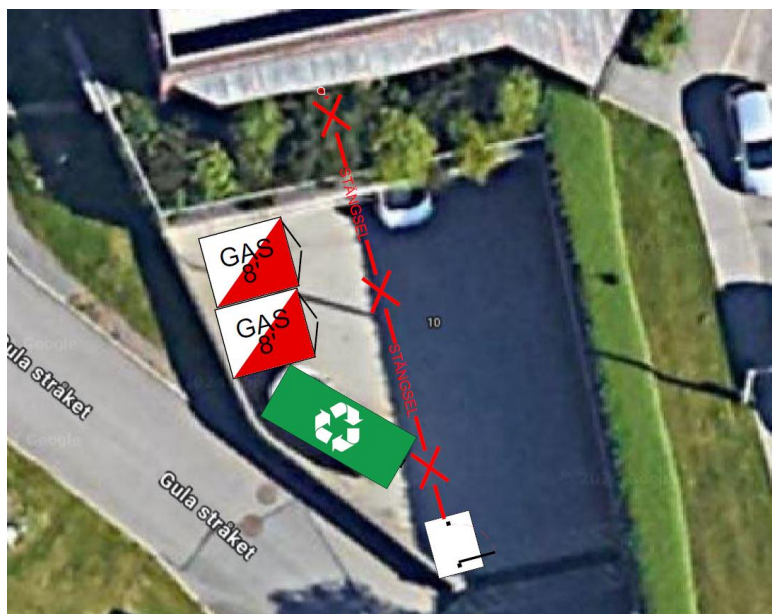

För mer information, kontakta

Robin Staaf, projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se

Infarter till Sahlgrenska sjukhuset

Sjukhuset har två infarter för biltrafik: Sahlgrenska södra från Ehrenströmsgatan och Sahlgrenska huvudentré via Per Dubbsgatan. Infarten via Per Dubbsgatan är i första hand för transporter till akutmottagning och verksamheter på Blå stråket.

För mer information, kontakta

- Lotta Norlander, fastighetsförvaltare, 072-211 04 06, lotta.norlander@vgregion.se
- Sofia Svala, huvudförvaltare, 076-275 99 86, sofia.svala@vgregion.se

Parkeringsplatser, Sahlgrenska sjukhuset

Det är brist på parkeringsplatser på området. Besöksparkering hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan, alternativt parkering vid Medicinaregatan.

För mer information, kontakta parkering@vgregion.se
