

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården maj 2024, vecka 20 och 21


Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan maj

- Omfattande pålningsarbeten kommer ske under perioden 9-14 maj. Arbetet medför buller och vibrationer.
- Byggtrafik till och från arbetsområdet kör på provisorisk byggväg som ansluter via Fanny Gréns väg. Ökad frekvens av trafik i samband pågående schaktarbeten.

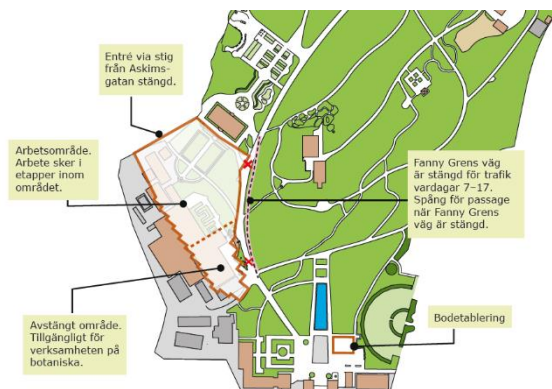

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Schakt- och markarbeten pågår inom arbetsområdet för etapp 2 området. Detta genererar ökad mängd transporter till- och från arbetsområdet. Pålning för kranfundament är nu slutfört och arbete med gjutning av kranfundament är påbörjat.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Figur 2: Markarbete pågår

Planering kommande två veckor:

Omfattande pålningsarbeten kommer ske under perioden 9-14 maj. Pålningschema med aktuella tider och säkerhetszoner har kommunicerats ut direkt till berörd verksamhet. Arbetet medför både buller och vibrationer.

Tillfällig bro vid infart Malmgårdsgatan

Anläggande av tillfällig bro pågår och bron beräknas stå klar och tas i bruk under vecka 20.



Figur 3: Tillfällig bro från Malmgårdsgatan in mot arbetsområdet

Spång längs med Fanny Gréns väg

Med anledning av ökad frekvens av transporter till- och från arbetsplatsen kommer Fanny Gréns väg att stängas av vardagar dagtid kl. 07:00-17:00. I dagsläget ej fastställt vilket datum detta kommer att ske. Arbetet pågår för att klargöra rutiner för hur arbetsfordon, leveranser och boendes fordon skall passera.

I samband med att Fanny Gréns väg stängs av kommer gående i trädgården att ledas om via en tillfällig spånlösning. Spången är nu på plats, några kompletterande arbeten skall göras innan spången kan tas i bruk, bland annat kommer öppningen upp mot ljusbågstrappan att stängas.



Figur 4: Pågående byggnation av spång

Planering kommande två veckor:

När spång är färdigställd påbörjas arbete med att ställa upp körgrindar och lösning för trafikreglering. Information om rutiner för hur arbetsfordon, leveranser och boendes fordon skall passera kommer att delges berörda när dessa är fastställda.

Övrigt- Återbruk

I samband med markarbeten så avverkades träd inom arbetsområdet. Dessa träd planeras användas i någon form av återbruk i projektet och ligger nu uppsågade och torkar på sågverket.



Figur 5: Uppsågade träd för återbruk

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst

vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se
