


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården vinter 2024/2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

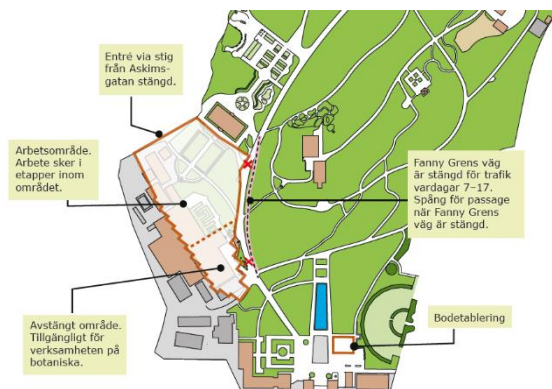

Omgivningspåverkan december/januari

- Arbete VA-schakt pågår. Fanny Gréns väg avstängd kl 07.30-16.30 måndag och tisdag samt torsdag och fredag, preliminärt fram till årsskiftet (dock inget arbete röda dagar).
- Tisdag den 17/12 och torsdag 19/12 kommer arbete pågå även kvällstid.
- Under perioden som VA-schaktarbete pågår körs samtliga transporter till och från arbetsområdet via Malmgårdsgatan.
- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.

- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Betongstommen för växthusen börjar bli färdig och det återstår några få meter betongsockel runt huset innan det momentet är helt slutfört. Skrotning (lagning betonghål/ skarvar) i källarplan är klart och skall nu utföras även på våning två. Innerväggar i källaren är snart klara och samtliga installatörer har startat sina arbeten med rör, el, sprinkler och ventilation.

Växthusmontörerna fortsätter med montering av stålstomme i de höga delarna av växthuset. Dessa arbeten medför säkerhetszon för befintlig verksamhet (Hanteras i separat info till berörda).

Under de kommande veckorna kommer väggar och tak i källaren att målas. Det kommer också ske fortsatta arbeten med installationer i taket i källaren. Växthusmontören kommer efter mellandagarna att fortsätta sin framdrift med montage av stålkonstruktion.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Bild 2. Pågående montering stålstomme

Arbete VA-schakt

Arbetet med VA-schaktning pågår och medför stor påverkan på framkomligheten på Fanny Grens väg. Vägen är avstängd dagtid kl 07.30-16.30 på måndag och tisdag samt torsdag och fredag, preliminärt fram till årsskiftet (dock inget arbete på röda dagar). Tisdag den 17/12 och torsdag 19/12 kommer arbete även att pågå kvällstid vilket påverkar framkomligheten ytterligare. Dessa arbeten kan också komma att orsaka buller och vibrationer. Avstängningen av Fanny Grens väg medför att samtliga transporter till och från arbetsområdet går via Malmgårdsgatan under hela perioden som arbetet pågår.



Bild 3. Område som berörs av arbete VA-schaktning.

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst: vastfastigheter.kundtjanst@vregion.se

Övriga byggprojekt i trädgården

Dagvattenprojekt och breddning grusväg Åsen

I arbetet med att förbättra trädgårdens dagvattenhantering skall det anläggas ett dräneringspaket på centralfältet och grässlänten öster om örtagården. Arbetet beräknas pågå till mars 2025.

Grusvägen fram till bergshuset på Åsen skall breddas några decimeter och förstärkas. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 24/25.

Arbetena på centralfältet är nu utförda och grusvägsbreddningen pågår. Arbetet med dränering i slänten från Örtagården ner mot Fanny Gréns väg påbörjas.
