

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården vinter 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



Omgivningspåverkan januari

- Stor mängd leveranser medför mycket trafik på Malmgårdsgatan och Särögatan.
- Viss påverkan på framkomlighet Fanny Grens väg under vecka 4 och 5 på grund av VA-schaktarbete.
- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.

- Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

De kommande veckorna väntas en stor mängd material till arbetsplatsen vilket innebär mycket trafik på Malmgårdsgatan och Särögatan.

Betongarbeten fortgår med de sista gjutningarna. Samtidigt utförs spackling och slipning av betongen för att ge den en fin slutfinish. Växthusmontörerna startar montering av stålkonstruktionen i det tredje "växthusskeppet". De har även ett nytt team på plats som fokuserar på montering av aluminiumkonstruktionen som skall hålla uppe glaset runt byggnaden.

För installatörerna i källaren går det framåt med många stråk i taket som skall försörja huset med både vatten och ventilation. Snickarna på plats börjar avveckla då innerväggar och andra snickarjobb är avklarade för tillfället. De fortsätter sitt arbete längre fram när taket är på och det är dags att bygga väggar på plan 2.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2

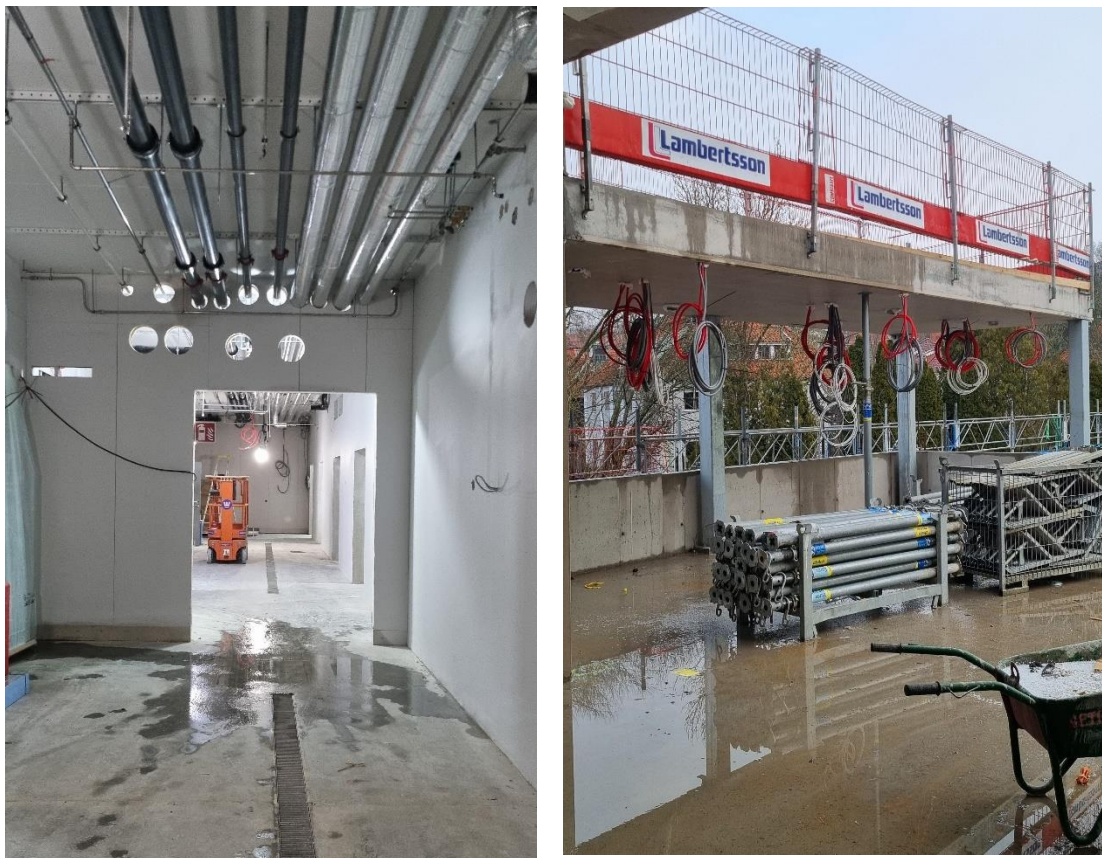


Bild 2. Pågående installationsarbeten

Arbete VA-schakt

Schaktarbeten pågår just nu framför verkstaden där man installerar ett antal VA-ledningar. Måndag den 13/1 sker trädfällning längs med tomtgräns. Trädfällningen sker med hjälp av en lastbil med gripklo för att säkerställa att inget träd kan falla okontrollerat. När trädfällningen är gjord kommer rivning av staket och diverse buskar att påbörjas. Därefter skall nya L-stöd monteras och ytan skall fyllas ut och jämnas till.

De arbeten som pågår under vecka 3 har ingen påverkan på trafik och framkomlighet för transporter till Fanny Grens väg. Däremot påverkas framkomligheten för verksamhetens fordon som skall till och från verkstaden. Under vecka 4 och 5 planeras schaktarbete pågå i röd zon. Dessa arbeten kan komma att ha viss påverkan på framkomligheten till och från Fanny grens väg via Särögrinden. Separat utskick till berörda när påverkan är känd.

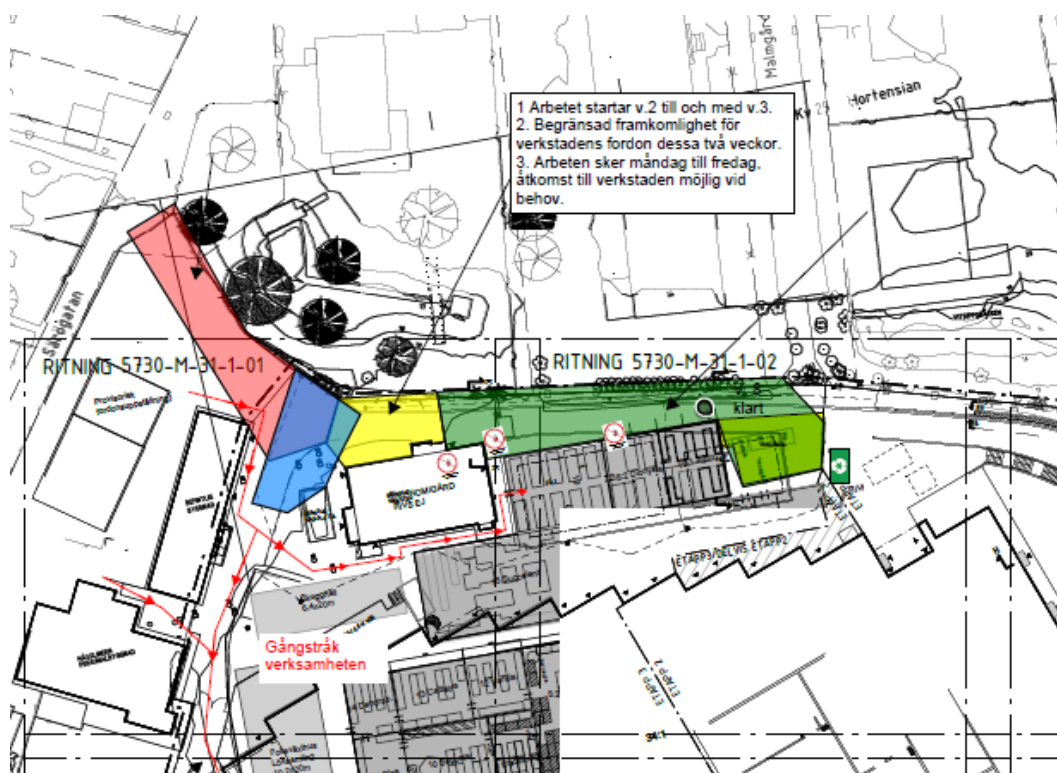


Bild 3. Område som berörs av arbete VA-schaktning. Vecka 2 och 3 pågår arbete i gul zon, vecka 4 och 5 pågår arbete i röd zon och ev grön zon.

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst: vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se

Övriga byggprojekt i trädgården

Dagvattenprojekt och breddning grusväg Åsen

I arbetet med att förbättra trädgårdens dagvattenhantering skall det anläggas ett dräneringspaket på centralfältet och grässlänten öster om örtagården. Arbetet beräknas pågå till mars 2025.

Arbetet med dränering i slänten från Örtagården ner mot Fanny Gréns väg pågår.
