


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg

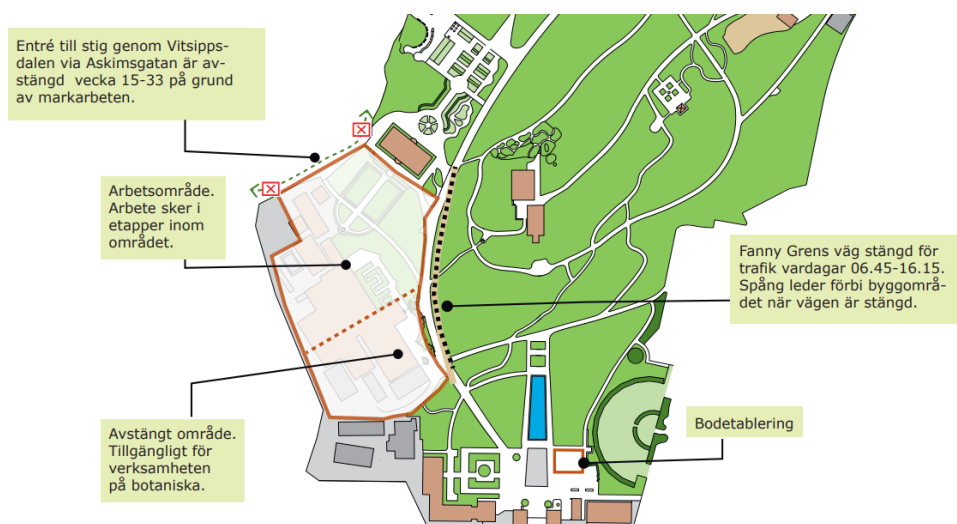

Byggprojekt, Botaniska trädgården våren 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028 och beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan mars

- Avstängning stig i Vitsippsdalen vecka 15 till och med vecka 33 från entré Askimgatan.
- Pålning påbörjas vecka 13. Detta medför höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen. Pålningsarbete beräknas pågå fram till sommaren 2025.
- Mycket trafik in- och ut på Särögatan på grund av stor mängd leveranser av material samt transport av schaktmassor.

- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Växthusmontage pågår fortsatt med flera olika aktiviteter så som glasning, takläggning, aluminiumprofiler och stålstomme. Detta arbete kräver en stor mängd material som transporteras till arbetsplatsen via Särögatan. Detta medför större frekvens av transporter än vanligt. Installationsarbete pågår nu parallellt både på plan 1 och plan 2. Kommande arbeten är montering av innerväggar på plan 2.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Bild 2. Glasning av fasad mot Fanny Gréns väg påbörjad

Markarbeten

Schaktarbete och pålning i öster

Nu påbörjas schakt- och pålningsarbete för att förbereda östra sidan där det skall grävas ner tankar, byggas gabionmurar och en ny försörjningsväg. Det stora schaktningsarbetet är redan påbörjat och lastbilar körs in/ut via Fanny Gréns väg/Särögatan vilket medför hög frekvens av lastbilar. Med start vecka 13 påbörjas pålningsarbetet som kommer att ske etappvis fram till sommaren. Både pålnings- och schaktarbetena medför höga ljud och vibrationer från arbetsplatsen.



Bild 3. Pågående schaktarbete i öster

Schaktarbete fjärrvärme

Fjärrvärmeledning är nu lagd och inkopplad, det återstår endast arbete med isolering därefter avslutas detta arbetsmoment.

Montering L-stöd i tomtgräns

Fortsatt arbete med montering av L-stöd pågår i de östra delarna. Pågår även arbete med att förlägga installationer i mark.

El-schakt Särögatan

Schaktarbetet i Särögatan är färdiggrävt och just nu ligger det en körplåt där inkommande el skall dras. Arbetet är nu avslutat så långt det går och återupptas igen längre fram i vår/sommar.

Avstängning stig i vitsippsdalen

Under vecka 15 till och med vecka 33 kommer stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen att stängas av, se bild nedan. Detta beror på omläggning av stigen samt byggnation av gabionmur. Markarbetena sker ej i naturreservatet.



Bild 4. Avstängning stig vid entré Askimsgatan till Vitsippsdalen

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Övriga byggprojekt i trädgården

Markarbeten huvudentré

Markarbeten i huvudentréområdet pågår för att möjliggöra nya el-matningar och el-kanalisationer till belysningsarmaturer som finns spridd i Botaniska Trädgårdens huvudentréområde. Arbetet sker både med grävmaskin och för hand. Arbetet pågår

dagtid, måndag-fredag och beräknas pågå fram till vecka 14. Mindre arbetsområden kommer temporärt att spärras av för att minska skaderisk på obehöriga. Det blir ingen nämnvärd påverkan för omkringliggande verksamhet eller besökare.



Bild 5. Pågående markarbeten för kommande elkanalisation i huvudentréområdet

Takbyte alpstugan

Alpstugan är i eftersatt skick och kommer att renoveras löpande under kommande år. I år börjar man med att lägga nytt tak för att säkerställa dess funktion. Alpstugan är belägen mellan Rhododendrodalen och Klippträdgården. Den är ej publik utan nyttjas endast av Botaniskas verksamhet.

Arbetet påbörjades i månadsskiftet februari-mars och beräknas pågå till början av april. Arbetet pågår måndag-fredag, kl.07-16 och en firmabil kommer att stå parkerad i närheten av byggnaden under denna tid.

Arbetet kommer inte ha nämnvärd påverkan för varken verksamhet eller besökare mer än det oväsen ett takbyte medför (ljud från att spika/hamra, såga, kasta tegelpannor i container m.m.).



Bild 6. Alpstugan.
