


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum Botaniska trädgården i Göteborg

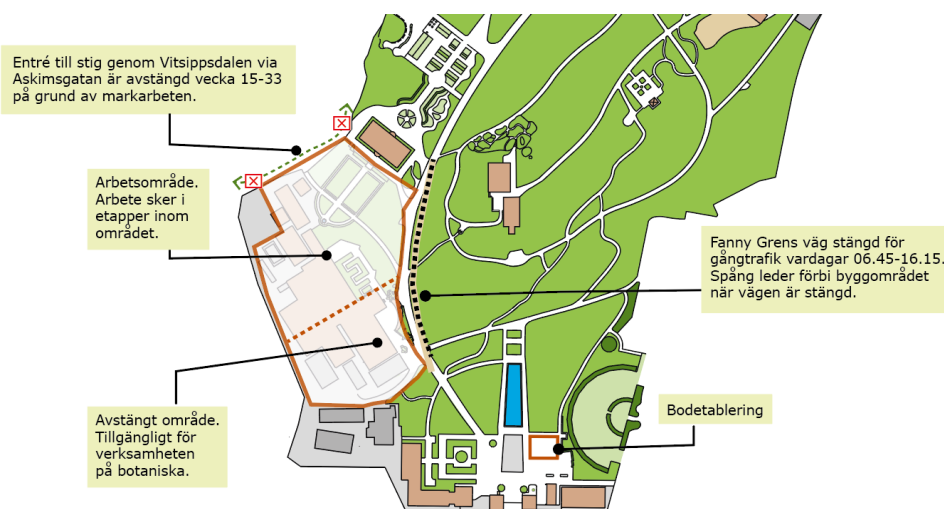

Byggprojekt, Botaniska trädgården våren 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet genomförs i flera etapper under åren 2021–2028. Nya växthus- och besökscentrum beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

Omgivningspåverkan maj

- Pågående gjutningsarbete medför hög frekvens av transporter på Malmgårdsgatan.
- Nästa etapp av pålnings- och schaktarbete påbörjas inom två veckor. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.

- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Avstängning stig i Vitsippsdalen vecka 15 till och med vecka 33 vid entré Vitsippsdalen från Askimsgatan.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Under de kommande veckorna fortsätter växthusentreprenören att montera glas, profiler och detaljer på växthuset. Det har även påbörjats montage av vävar invändigt i taket. Det har påbörjats montage av större installationer på plan 3 så som ventilationsaggregat och belysningscentraler. Installationsstråk på plan 2 pågår och plan 3 har precis startat. Det skall byggas färdigt väggar på plan 3, samt flytspackling av golv på plan 3. För att möjliggöra åtkomst till alla byggdelar har ställning monterats på flera stället i och runt växthuset.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2

Kommande veckor sker gjutning av utvändiga konstruktioner. Gjutningar kommer att pågå ett tag framöver vilket innebär mycket transporter på Malmgårdsgatan vissa dagar.



Figur 2. Förberedelse för kommande gjutning



Figur 3. Färdigmonterad hiss

Markarbeten

Schaktarbete och pålning i öster

Schakt- och pålningsarbeten återupptas inom 1-2 veckor.



Figur 4. Pålur för kommande väg och gabionmur

Montering L-stöd och plank i tomtgräns

Montage av plank mot grannar avslutas i veckan på västra sidan, det återstår målning. Montaget fortsätter ut mot östra sidan tills färdigt montage.



Figur 5. Plank västra sidan



Figur 6. Montage L-stöd östra sidan

Avstängning stig i vitsippsdalen

Under vecka 15 till och med vecka 33 kommer stigen mellan Askimsgatan och naturreservatet Vitsippsdalen att stängas av, se bild nedan. Detta beror på omläggning av stigen samt byggnation av gabionmur. Markarbetena sker ej i naturreservatet.



Figur 7. Översiktskarta avstängning stig Vitsippsdalen



Figur 8. Avstängning stig vid entré Askimsgatan till Vitsippsdalen

Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vgregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB
