

Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum
Botaniska trädgården i Göteborg

Byggprojekt, Botaniska trädgården hösten 2024

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)



Omgivningspåverkan november

- Arbete VA-schakt pågår. Fanny Gréns väg avstängd kl 07.30-16.30 måndag och tisdag samt torsdag och fredag från och med 18/11 till och med 23/12.
- Under perioden 18/11 till och med 23/12 kommer samtliga transporter till och från arbetsområdet att gå via Malmgårdsgatan med anledning av VA-schaktarbete som stänger av Fanny Gréns väg. Se punkt ovan.
- En större gjutning är planerad till fredag 15/11 vecka 46. Arbetet medför hög frekvens av transporter (betongbilar) till och från arbetsområdet via Särögatan.

- Arbete med stålstomme växthus är påbörjat. Kommer de närmsta veckorna innebära stora transporter på Malmgårdsgatan och höga ljud från arbetsplatsen.
- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten är reglerade till vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3


Betongväggar för avdelning djungel/ruin är färdigställda och arbete med betongplintar för växthusstomme är också klara. Arbetet med att färdigställa betongstommen pågår för fullt. Ytterväggarna på plan 1 har precis avslutats och arbeten med innerväggarna är i gång. De kommande veckorna skall betongstommen slutföras och sista leveransen av prefab elementen kommer måndag 18/11. Växthusentreprenören är på plats för montage av stålstommen och detta kommer att innebära stora transporter på Malmgårdsgatan kommande veckor.



Figur 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2

Det pågår även mycket arbete med den sista bottenplattan och en större gjutning är planerad fredag 15/11. Detta arbete genererar en hög frekvens av betongbilar till och från arbetsplatsen via Fanny Gréns väg och Särögatan vilket medför begränsad framkomlighet för fordon på Fanny Gréns väg. Betongbilar kommer att backa upp för Fanny Gréns väg, kör sedan ut framlänges ner igen. Flaggvakter är bokade för att säkerställa framkomligheten och säkerheten på Fanny Gréns väg.

Betongbilar behöver ha plats att vända vid ekonomigården under hela dagen, se orange cirkel.

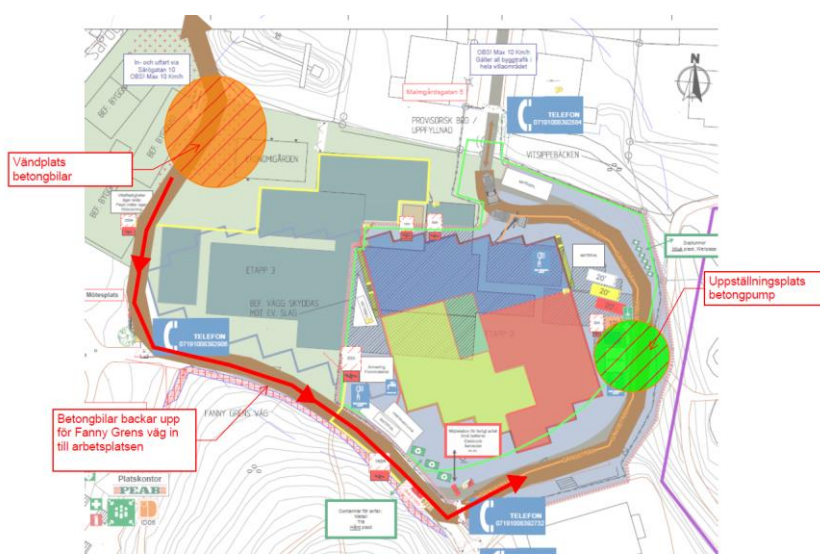

Figur 2. Planerad arbetsgång för större gjutning fredag 15/11 vecka 46.



Figur 3. Påbörjad gjutning av bottenplatta.

Arbete VA-schakt

Arbetet med VA-schaktning pågår och vattnet till de nya ledningarna är nu anslutet. Schaktet vid grönytan är igenfyllt för att säkerställa framkomligheten för besökarna ner mot entréområdet. Arbetet fortsätter nu framåt vilket kommer att ha stor påverkan på framkomligheten på Fanny Gréns väg. Vägen är avstängd dagtid kl 07.30-16.30 på måndag och tisdag samt torsdag och fredag från och med 18/11 till och med 23/12. Avstängningen av Fanny Gréns väg medför också att samtliga transporter till och från arbetsområdet går via Malmgårdsgatan under hela perioden som arbetet pågår.



Figur 4. Område som berörs av arbete VA-schaktning. Under perioden 18/11 – 23/12 är vägen helt avstängd dagtid kl 07.30-16-30, mån-tis samt tor-fre.

Fanny Gréns väg avstängd vardagar kl. 06.45-16.15

Körgrindar längs Fanny Gréns väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

Kontakt

För allmänna frågor om projektet: Nyavaxthus@vregion.se

För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

Mer information:

Västfastigheters Kundtjänst: vastfastigheter.kundtjanst@vregion.se

Övriga byggprojekt i trädgården

Fasadrenovering trädgårdskontoret

Fasaden på trädgårdskontoret renoveras för att bevara fastigheten och förlänga dess livslängd. Fogar mellan tegel lagas och byts ut helt på vissa ställen då de är i väldigt dåligt skick. Puts kring fönster samt fastighetsdekor längs hängrännor m.m. renoveras. Fönster renoveras och målas utvändigt. Även taksäkerhet monteras på taket, detta för att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för personer som sköter drift och skötsel av fastigheten. Under tiden som arbetet pågår är ställning uppställd runt huset. Arbetet medför visst buller för de personer som arbetar i huset, men stör inte trädgårdens verksamhet i övrigt.

Alla transporter sker via entré från Särögatan. Projektet väntas pågå till november 2024.

Kontakt: Charlotta Karlsson, Projektledare Västfastigheter Bygg och förvaltning. Mail: charlotta.bogya.karlsson@vregion.se

Dagvattenprojekt och breddning grusväg Åsen

I arbetet med att förbättra trädgårdens dagvattenhantering skall det anläggas ett dräneringspaket vid gräsyta centralfältet och grässlätten öster om örtagården. Arbetet beräknas pågå till mars 2025.

Grusvägen fram till bergshuset på Åsen skall breddas några decimeter och förstärkas. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 24/25.

Arbetena på centralfältet är nu utförda och grusvägsbreddningen har påbörjats.

