


Projektnyheter och omgivningspåverkan nya växthus och besökscentrum  
Botaniska trädgården i Göteborg

## Byggprojekt, Botaniska trädgården vinter 2025

Nya växthus och ett besökscentrum ska ge trädgårdens besökare en attraktiv upplevelse när som helst under året. De nya växthusen är viktiga för att ytterligare stärka trädgårdens starka

nationella och internationella roll inom forskning och folkbildning. Projektet byggs i flera etapper under åren 2021–2028 och beräknas öppna för allmänheten 2030.

För aktuell karta över området, [Se länk](#)

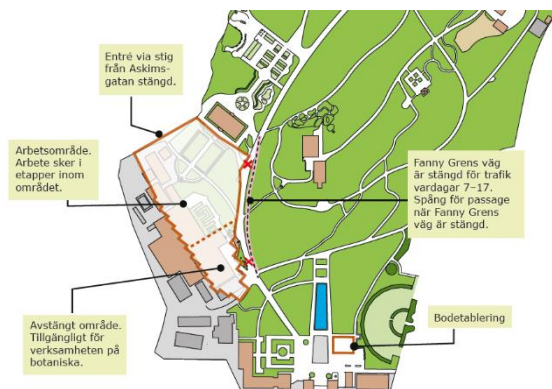

### Omgivningspåverkan februari/mars

- Viss påverkan på infart Särögatan vecka 9-11 på grund av elschaktarbete.
- Pågående schaktarbete fjärrvärme medför stort antal transporter till och från arbetsplatsen via Malmgårdsgatan under vecka 8-12.
- Arbeten avseende montering stålstomme för växthus pågår. Medför höga ljud från arbetsplatsen.

- Arbeten med grundläggning såsom schaktning och makadamisering pågår. Dessa arbeten medför både buller, vibrationer och höga ljud från arbetsplatsen.
- Bullrande arbeten förekommer vardagar kl. 07:00-19:00. Projektet följer naturvårdsverkets riktlinjer för bullrande och störande arbeten.
- Arbeten pågår företrädevis vardagar men kan även förekomma under helger för att säkra framdriften av projektet. Under helgen utför entreprenören endast enklare arbeten som ej bedöms ha samma omgivningspåverkan som det vardagliga arbetet.
- Fanny Gréns väg avstängd för besökare vardagar kl. 06:45-16:15. Detta är en åtgärd för resterande byggtiden av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

## Nya växthus och besökscentrum etapp 2–3

Just nu arbetar växthusmontören med att montera tak på installationsytor samt aluminiumprofiler och glas i de tre skepp som är uppe. Kommande veckor påbörjas montage av stålstomme i nästa skepp.



Bild 1. Översiktsbild arbetsområde etapp 2



Bild 2. Växthusstomme med profiler förberedda för glasing

## Markarbeten

### Schaktarbete fjärrvärme

Schaktarbete nära infartsbron vid Malmgårdsgatan för kommande fjärrvärme- och vattenledningar har påbörjats. Detta arbete medför hög frekvens av schaktbilar som kör både in och ut på Malmgårdsgatan. Trafikflödet för schaktbilarna planeras enligt följande: De kommer att köra ner på Askimsgatan och Apotekaregatan, för att sedan backa in på Malmgårdsgatan. Efter lastning av massor kör de sedan ut mot Apotekaregatan igen och vidare ut på leden via Carl Skottsbergs gatan. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 12.

### Montering L-stöd

Arbete med montering av L-stöd i tomtgräns på norrsidan fortsätter. Arbetet rör sig mot bron vid Malmgårdsgatan och aktuell etapp förväntas vara klar under vecka 9. Därefter pausas arbetet för att sedan fortsätta i ett senare skede. Arbetsområdet är inhägnat för att säkerställa att inga obehöriga vistas

på yta där arbetet pågår. Fordon i form av hjullastare och schaktbilar rör sig på Fanny grens väg under denna period.

### El-schakt Särögatan

Vecka 9 påbörjas ett schaktarbete i Särögatan för att möjliggöra nedgrävning av elkablar som skall vidare in i det nya växthuset. Arbetet sker med en mindre variant av grävmaskin. Detta arbete skall inte stoppa trafiken men mindre påverkan kan uppstå. Arbetet förväntas pågå till och med vecka 11.

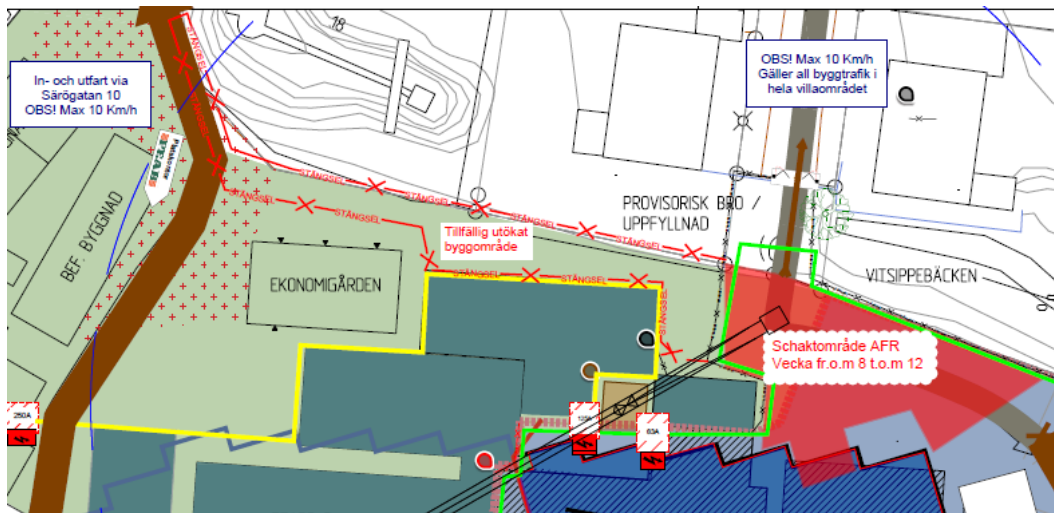


Bild 3. Område som berörs av pågående markarbeten är markerade på bild med röd yta "Schaktområde AFR" samt grön yta med röd markering stängsel "Tillfälligt utökat byggområde".

## **Fanny Gréns väg avstängd för allmänhet vardagar kl. 06.45-16.15**

Körgrindar längs Fanny Grens väg är monterade för att skilja på flödet av besökare och byggtrafik. Allmänheten hänvisas till spång eller alternativa stigar för att ta sig från entréområdet upp till resten av trädgården. Fanny Gréns väg kommer att vara öppen under helger och kvällar. Avstängning med körgrindar är en åtgärd för resterande byggtid av etapp 2 vilket innebär fram till första kvartalet 2026.

### **Kontakt**

**För allmänna frågor om projektet:** Nyavaxthus@vgregion.se

**För arbete inom projektet Nya växthus och besökscentrum et 2-3:**

Byggherre: VGR, Västfastigheter Bygg och förvaltning

Entreprenör: Peab Sverige AB

**Mer information:**

Västfastigheters Kundtjänst: [vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se](mailto:vastfastigheter.kundtjanst@vgregion.se)

## Övriga byggprojekt i trädgården

### Dagvattenprojekt

I arbetet med att förbättra trädgårdens dagvattenhantering anläggs ett dräneringspaket på centralfältet och grässlätten öster om örtagården. Arbetet är avslutat.

Arbetet med dränering i slänten från Örtagården mellan Fanny Gréns väg och grusvägen är avslutat.

### Markarbeten huvudentré

Vecka 8 påbörjades markarbeten i huvudentréområdet för att möjliggöra nya el-matningar och el-kanalisationer till belysningsarmaturer som finns spritt i Botaniska Trädgårdens huvudentréområde. Arbetet sker både med grävmaskin och för hand. Arbetet pågår dagtid, måndag-fredag och beräknas pågå ca 6 veckor. Mindre arbetsområden kommer temporärt att spärras av för att minska skaderisk på obehöriga. Det blir ingen nämnvärd påverkan för omkringliggande verksamhet eller besökare.





*Bild 4 och 5. Pågående markarbeten på olika platser i huvudentréområdet*
