

Projektnyheter

Sahlgrenska Life Hus 1, etapp 1


Datum för utskick: 2026-09-04

Nästa nyhetsbrev: 2026-09-11

Projektnyheter **Sahlgrenska Life Hus 1, etapp 1** skickas ut varje vecka för att säkerställa att påverkad verksamhet har kännedom om kommande störningar och påverkan på verksamheten.

För ytterligare information om omgivningspåverkan på Sahlgrenska sjukhus – se nyhetsbrev på webbplatsen fastighet.vgregion.se

[Nyhetsbrev projekt - VGR fastigheter](#)

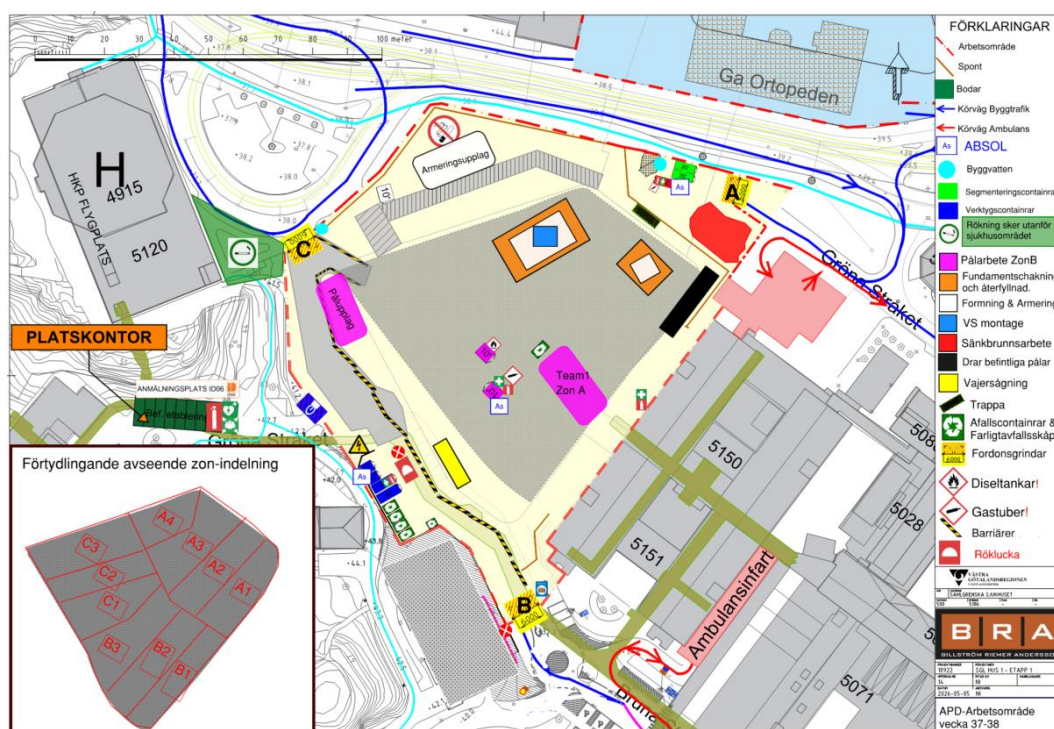

Figur 1 APD-plan (Arbetsplats Dispositions Plan) för byggarbetsområdet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas, bland annat inom satsningen Sahlgrenska Life. Det första huset kommer ge plats åt regional laboratoriemedicin, en intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, ambulanshall och akutmottagning. Våren 2026 inleddes arbetet med etapp 1, schaktning, sprängning och gjutning av stommen för Hus 1.

Sahlgrenska Life Hus 1 etapp 1

Under september arbetar vi brett på arbetsplatsen med att slutföra de förberedande grundarbeten i form av pålning, sprängning och detaljschakter. Samtidigt har arbetet med grunden till byggnaden startat.

När grunden utförs så är det i första skedet fundamenten under källaren som gjuts, när dessa är klara startar arbetet med källarens golv, väggar och tak.

Samtidigt som grunden tar form arbetar vi med att lägga ner rör i marken för avlopp och dagvattenhantering för byggnaden och området som idag är byggarbetsplatsområde.

Aktuellt kommande veckor

Under de kommande två veckorna rullar arbetet vidare för fullt. Vi förbereder just nu grunden för byggnaden, vilket innebär att det är mycket aktivitet nere i marken. Detta arbete kommer att se likvärdigt ut under hösten i det stora hela.

Pålmaskinerna arbetar med att borra ner stålörspålar i marken för grunden, där dessa är klara tar grävmaskinerna över för att precisionsgräva fram för nästa gäng som är betongarbetarna som gjuter betongfundament som byggnaden sedan kommer att stå på. I betongfundamenten finns det även rödragningar som utförs som förberedelse för byggnadens spillvatten.

I ytterkant av arbetsområdet fortsätter arbetet med sänkbrunnen, en brunn som gjuts bit för bit och sedan sänks ner i marken. Denna används sedan för dagvattenhanteringen (regnvatten, ytvatten). Under kommande vecka kommer sprängning ske i den ytan.

Bergsschakt sker i sydvästra delen av området, gula området på APD-planen på sida 1, bergsschakten sker genom att berget sågas loss. Detta arbete kommer att pågå de närmsta veckorna.

Påverkan på omgivningen

Under de två kommande veckorna kommer betongarbeten starta upp ordentligt, detta medför en ökad andel transporter vid vändslingan vid Per Dubbsgatan.

Sprängning kommer att ske under vecka 37 i det röda området på kartan på sida 1, i hörnet av byggarbetsplatsen nära ambulanshallen, detta kan ge upphov till högt buller i form av sprängsignalen och själva sprängningen, störningen är kort och inträffar vid de tre förutbestämda sprängtiderna som finns angivna nedan.

Pålningssarbetet, arbetet där stålörspålar borras ner i lera och berg fortsätter och ljudnivån kommer vara likvärdigt tidigare.

Bergsschakt sker i sydvästra delen av området, gula området på APD-planen på sida 1, bergsschakten sker genom att berget sågas loss. Detta kan ge upphov till ett visst buller.

Sprängtider: kl. 09:00 och 12:30 samt kl. 14:00.

Status just nu

Just nu pågår arbeten med grunden och grundläggning, arbetet med grunden kommer att fortsätta hela hösten in i vinter.

Tidigt under hösten avslutas arbetena pålningen och sprängning som är en del av de förberedande arbeten för grunden.

Kontakt

Daniel Estling, projektledare, 070-212 08 72

daniel.estling@vgregion.se

Sara Brännström, byggledare, 0734- 47 25 21

sara.brannstrom@jhbpl.se

Kundtjänst fastighet.vgregion.se
