

Projektnyheter

Sahlgrenska Life Hus 1, etapp 1


Datum för utskick: 2026-09-11

Nästa nyhetsbrev: 2026-09-18

Projektnyheter **Sahlgrenska Life Hus 1 Etapp 1** skickas ut varje vecka för att säkerställa att påverkad verksamhet har kännedom om kommande störningar och påverkan på verksamheten.

För ytterligare information om omgivningspåverkan på Sahlgrenska sjukhus – se nyhetsbrev på webbplatsen fastighet.vgregion.se

[Nyhetsbrev projekt - VGR fastigheter](#)

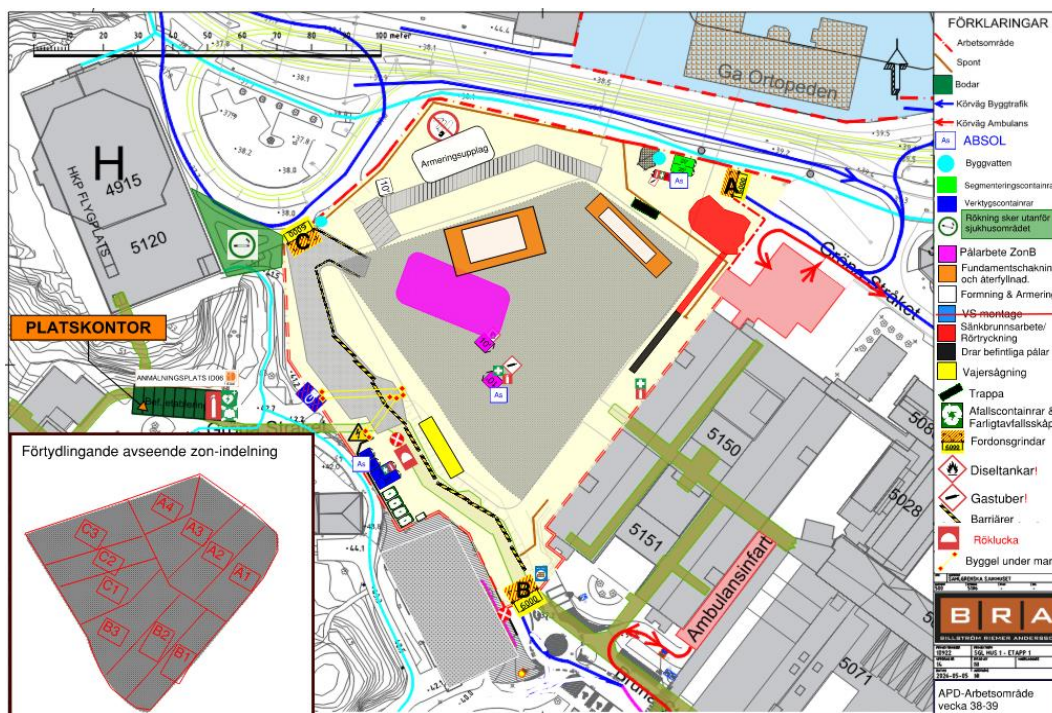

Figur 1 APD-plan (Arbetsplats Dispositions Plan) för byggarbetsområdet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas, bland annat inom satsningen Sahlgrenska Life. Det första huset kommer ge plats åt regional laboratoriemedicin, en intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, ambulanshall och akutmottagning. Våren 2026 inleddes arbetet med etapp 1, schaktning, sprängning och gjutning av stommen för Hus 1.

Sahlgrenska Life Hus 1 etapp 1

Under september arbetar vi brett på arbetsplatsen med att slutföra de förberedande grundarbeten i form av pålning, sprängning och detaljschakter. Samtidigt har arbetet med grunden till byggnaden startat.

När grunden utförs så är det i första skedet fundamenten under källaren som gjuts, när dessa är klara startar arbetet med källarens golv, väggar och tak.

Samtidigt som grunden tar form arbetar vi med att lägga ner rör i marken för avlopp och dagvattenhantering för byggnaden och området som idag är byggarbetsplatsområde.

Aktuellt kommande veckor

Under de kommande två veckorna rullar arbetet vidare för fullt. Vi förbereder just nu grunden för byggnaden, vilket innebär att det är mycket aktivitet nere i marken. Detta arbete kommer att se likvärdigt ut under hösten i det stora hela.

Pålmaskinerna fortsätter att arbeta med att borra ner stålrörspålar i marken för grunden, där dessa är klara tar grävmaskinerna över för att precisionsgräva fram för nästa gång som är betongarbetarna som formar och gjuter betongfundament som byggnaden sedan kommer att stå på.

I ytterkant av arbetsområdet fortsätter arbetet vid sänkbrunnen. Brunnen är nu på plats och arbetet övergår till rörtryckning i marken, vilket innebär en schaktfri förläggning av rör under arbetsområdet som sedan används för dagvattenhanteringen (regnvatten, ytvatten).

I sydvästra delen av arbetsområdet längs med kulvert kommer vajersågning av berg att utföras. Vajersågningen ger upphov till viss störande ljud.

Påverkan på omgivningen

Betongarbeten som pågår medför en ökad andel transporter vid vändslingan vid Per Dubbsgatan.

Sprängning

Under kommande två veckor kommer det vara låg intensitet avseende sprängning och eventuellt kommer sprängning inte att förekomma.

När sprängning förekommer kan ge upphov till högt buller i form av sprängsignalen och själva sprängningen, störningen är kort och inträffar vid de tre förutbestämda sprängtiderna som finns angivna nedan.

Sprängningsarbete kan även ge upphov till märkbara vibrationer.

Pålningssarbetet, arbetet där stålrörspålar borrar ner i lera och berg fortsätter och ljudnivån kommer vara likvärdigt tidigare.

Sprängtider: kl. 09:00 och 12:30 samt kl. 14:00.

Status just nu

Just nu pågår arbeten med grunden och grundläggning, arbetet med grunden kommer att fortsätta hela hösten in i vinter.

Även arbeten med förläggning av ledningar pågår.

Senare under hösten kommer de förberedande arbeten för grunden, i form av pålningen och sprängning att avslutas och ersätts allt eftersom av arbeten med att gjuta betongkonstruktioner för byggnaden stomme.

Kontakt

Daniel Estling, projektledare, 070-212 08 72

daniel.estling@vgregion.se

Sara Brännström, byggledare, 0734- 47 25 21

sara.brannstrom@jhbpl.se

Kundtjänst fastighet.vgregion.se
