



Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas, bland annat inom satsningen Sahlgrenska Life. Det första huset kommer ge plats åt regional laboratoriemedicin, en intensivvårdsavdelning, operationsavdelning, ambulanshall och akutmottagning.

Våren 2026 inleddes arbetet med etapp 1, schaktning, sprängning och gjutning av stommen för Hus 1.

Projektnyheter

Sahlgrenska Life Hus 1, etapp 1

Datum för utskick: 2026-09-25

Nästa nyhetsbrev: 2026-10-02

Projektnyheter **Sahlgrenska Life Hus 1 Etapp 1** skickas ut varje vecka för att säkerställa att påverkad verksamhet har kännedom om kommande arbeten och eventuella störningar. APD-plan över arbetsområdet och de pågående arbetena finns längst ner.

Varannan måndag udda veckor, klockan 08:00 informerar projektledningen om pågående arbeten via teams.

Länk till mötet: [Informationsmöte SGL 1 etapp 1](#).

För ytterligare information om omgivningspåverkan på Sahlgrenska sjukhus- se nyhetsbrev på webbplatsen fastighet.vgregion.se

[Nyhetsbrev projekt - VGR fastigheter](#)

Sahlgrenska Life Hus 1 etapp 1

Under september arbetar vi med att slutföra förberedande grundarbeten i form av pålning, sprängning och detaljschakter. Samtidigt har arbetet med grunden till byggnaden startat.

Grundarbetet innebär att fundamenten under källaren gjuts, därefter startar arbetet med källarens golv, väggar och tak.

Samtidigt arbetar vi med att lägga ner rör i marken för avlopp och dagvattenhantering.


Arbeten kommande två veckor (40-41)

- Under helgen 26/9 och 27/9 kommer arbeten med vadersågning av berg att förekomma på byggarbetsplatsen.
- Pålningsarbetet är nu klart. Och övergår till enbart kapning och gjutning av pålar.
- Grävmaskiner förbereder inför fortsatta betongarbeten.
- Betongarbetarna formar och gjuter betongfundament som byggnaden sedan kommer att stå på.
- Arbetet vid sänkbrunnen fortsätter med rörtryckning i marken, vilket innebär en schaktfri förläggning av rör under arbetsområdet som sedan används för dagvattenhanteringen (regnvatten, ytvatten).
- Dragning av gamla träpålar parallellt med rörtryckningens framfart.
- Vadersågning kommer att utföras i berg för kommande sprängning.
- Sprängning sker framför allt under v.41

Påverkan på omgivningen

- Ökad andel transporter vid vändslungan vid Per Dubbsgatan på grund av betongarbeten och övriga leveranser.
- Störande ljud från vadersågning kan förekomma.
- Sprängning ger upphov till högt buller i form av sprängsignalen och själva sprängningen, störningen är kort och kan inträffa vid de tre förutbestämda sprängtiderna som finns angivna nedan.
- Sprängningsarbete kan även ge upphov till märkbara vibrationer.

Sprängtider: kl. 09:00 och 12:30 samt kl. 14:00.

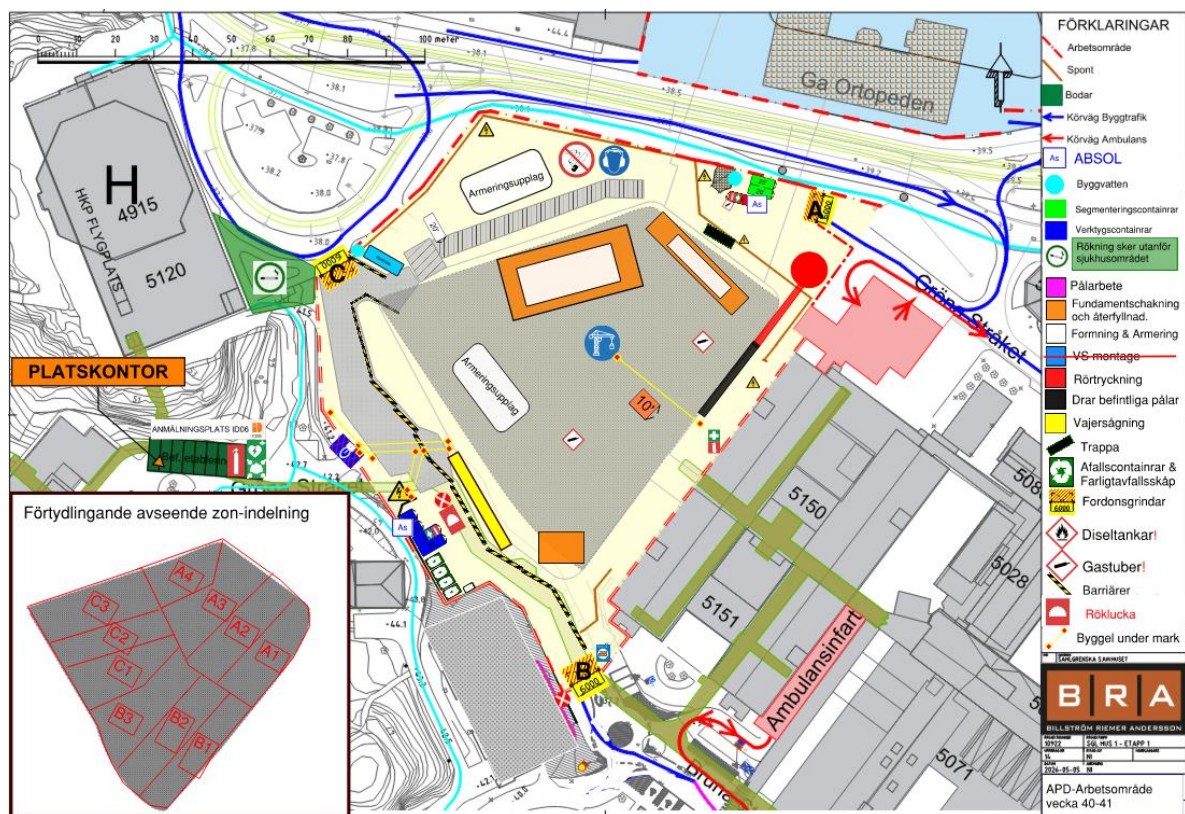

Figur 1 APD-plan (Arbetsplats Dispositions Plan) för byggarbetsområdet.

Kontakt

Daniel Estling, projektledare, 070-212 08 72

daniel.estling@vgregion.se

Sara Brännström, byggledare, 0734- 47 25 21

sara.brannstrom@jhbpl.se

Kundtjänst fastighet.vgregion.se
