2026-09-17

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 38-39 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.
För att säkerställa att ni som arbetar i lokalerna har kännedom om vad som sker skickar vi ut information varje vecka till påverkade verksamheter.
För övergripande information om fastighetsutvecklingen på Östra sjukhuset hänvisar vi till Projektnyheter Östra.

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion utomhus
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Lägre ljudnivåer utomhus.
Byggstart: 2025
Klart för inflyttning: 2028
För aktuell karta över området, se länk

Utvändiga arbeten

- **Betongarbeten:** Pågår arbete med form, armering och gjutning av betongväggar för nybyggnationen.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår. I söder pågår montage på plan 01 och i norr pågår montage på plan 00.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen och vissa arbetsmoment kan kräva tillfällig avstängning av vägen.

Invändiga arbeten

- **Plan 00 Klinisk fysiologi:** Under v. 37 kommer SU påbörja städning av plan 00. Under v. 38 startar arbetet med att åtgärda besiktningsanmärkningar samt assistera SU med snickeriåtgärder.
- **Dockningsarbeten CK flera plan**: Ytorna som skall ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.

Omgivningspåverkan

- Utomhus: Arbete med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder skall infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.

- Invändigt: Under arbete med besiktningsanmärkningar samt snickeriåtgärder för SU kan lägre ljudnivåer samt borrning förekomma.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,
rebecca.engvall@vgregion.se
Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se
Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,
kristoffer.lind@vgregion.se
Malin Dahlstedt, projektledare, 0793-44 00 50
malin.dahlstedt@vgregion.se
Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,
mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen
Färdigställande: Q3 2026

Projektet avslutas i november. Just nu sker enbart mindre anpassningar i enstaka rum. Dialog sker direkt med påverkad verksamhet.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 070-238 58 21, Jesper.Hertzman@karlanders.se
Omid Khavary, platschef, 076-346 14 59, omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget
Projektets start:
Färdigställande: Q4 2026
För aktuell karta över området, se länk

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

Plan 98: Nya väggar och demontering.
Plan 99–09: Fortsatt arbete med att komplettera med kanalisation ovan undertak samt kabeldragning.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt
Johan Ekstrand, projektledare, 072-236 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se
Maria Nikolic, projektledare, 072-200 98 67, maria.nikolic@vgregion.se
Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

---

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen
Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.
Färdigställande: Q2 2027
För aktuell karta över området, se länk

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.


Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:

• Etapp 4 – Arbete med trumma i Måsgången fortsätter med byggnation av ny inbyggnadslåda.
• Etapp 7B - Montage av lampor återstår.
• Etapp 7A - Sprinkler sätter stammar. Undertak startar på tisdag.
• Etapp 6A - Rivning. Sprinkler startar med stammar.

Projektnyheter Sprinkler 7.4

• Etapp 6B Startar vecka 39.
På grund av ändring på etapptidplan revs
tak i fysioterapin före semestern och nu ska vi försöka dra in sprinkler där i nästa vecka om bemanningen tillåter detta.

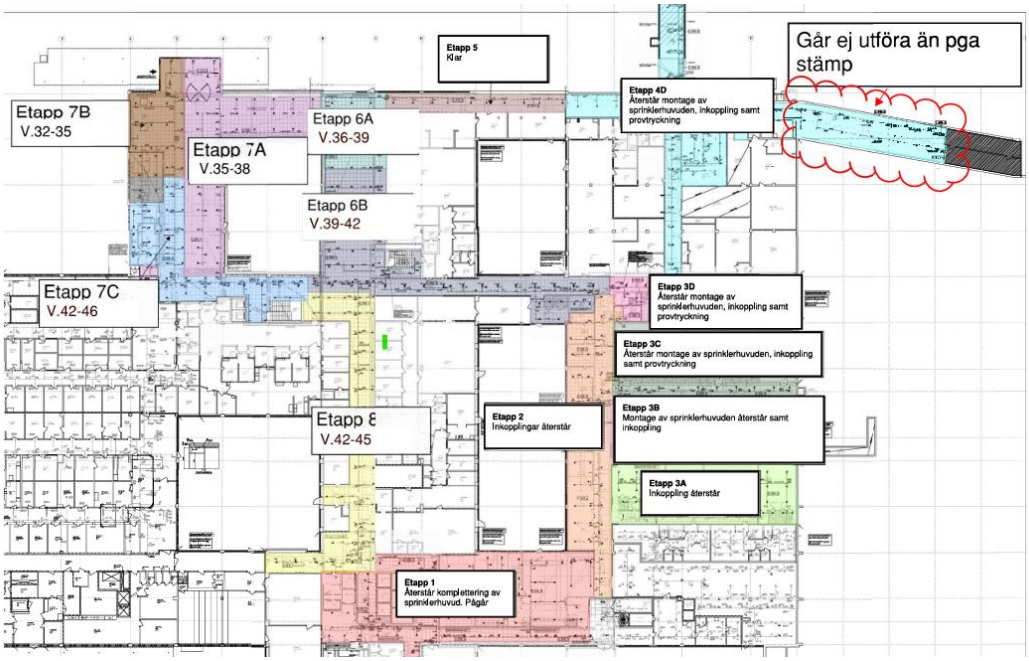

Sprinklercentralen MC: Installationsarbeten pågår.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,
ebba.ericson@vgregion.se
Kristoffer Sideby, Projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se
Benjamin Khatibi, Byggledare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se
Stefan Berntsson, Kontrollant sprinkler,070-811 15 78,
stefan.berntsson@epg.se


Entreprenör:

Anders Jarlgård, Projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se
Jesper Rosén, Platschef, 0700 – 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se
Fredrik Unosson, Tillträdande platschef, 0704-45 50 27,
fredrik.unosson@serncon.se

Diagnosvägen 11, Byte av ventilationsaggregat

Nuläge: Byte av ventilationsaggregat
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Kranlyft, materialupplag samt byggställning och bygghiss
Projektets start: september 2026.
Färdigställande: oktober 2027

Projektet avser byte av ventilationsaggregat placerat i fläktrum på plan 3 ovan CK lågdel väster (mot parkeringen). Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd. Aggregatet betjänar totalt cirka 12 500 kvadratmeter inklusive källarvåning (plan 98). Bytet innefattar en utbyggnad av fläktrummet på plan 3 samt lokala arbeten på plan 99 till 02 med installation av brandspjäll.
Kranlyft kommer att göras framför huvudentrén enligt nedan arbetsplatsöversikt.
Materialupplag med staket runt etableras enligt arbetsplatsöversikt samt en byggställning och bygghiss sätts upp mot lågdelens norra fasad. Ett väderskydd kommer också byggas över fläktrummet.

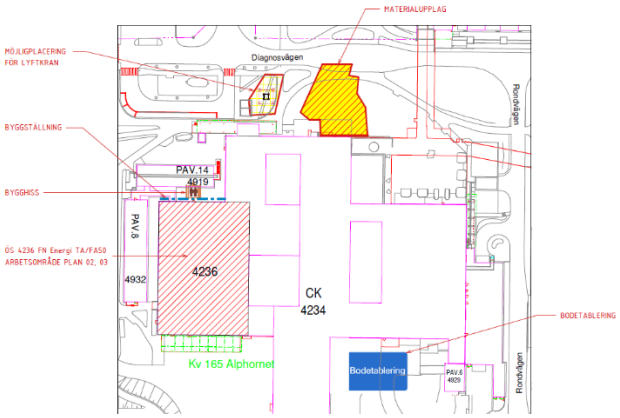

Kontakt

Robin Staaf, Projektledare, 073-445 96 71, robin.staaf@vgregion.se
