2026-10-16

Projektnyheter Centralkliniken

Vecka 43-45 2026

Många olika bygg- och upprustningsprojekt genomförs just nu i Centralkliniken på Östra sjukhuset.

Från och med sista veckan i oktober kommer projekten i CK ingå i vårt övergripande nyhetsbrev för Östra sjukhuset. Ett nyhetsbrev kommer skickas ut sista torsdagen varje månad (förutom december och juli). Förändringen görs för att underlätta för såväl verksamheter som projektledare. Respektive projekt kommer även fortsättningsvis få information via projektledare.
Övergripande nyhetsbrev för Östra sjukhuset publiceras på www.fastighet/vgregion.se
Länk direkt till vårt nyhetsbrevsflöde Projektnyheter Östra.

IVA/HBO

Nuläge: Full produktion utomhus

Påverkan för verksamheten kommande veckor: Lägre ljudnivåer utomhus.

Byggstart: 2025

Klart för inflyttning: 2028

Utvändiga arbeten

- **Markarbeten:** Återfyllning av jord närmst nya byggnaden.
- **Stomuppbyggnad:** Arbetet med montering av prefabricerade betong-element (väggar och bjälklag) pågår.
- **Avstängning väg mellan CK och BK:** En kran är placerad mellan körbanorna längst behandlingsvägen. Behandlingsvägen är avstängd i västlig riktning.

Invändiga arbeten

- **Dockningsarbeten CK flera plan**: Ytorna som ska ansluta till nybyggnationen förbereds för kommande förbindelse/dockning. Invändiga arbeten i södra delen av CK pågår till och från på plan 99–02.
- **Plan 98:** Arbete i kulvert.
- **Plan 01:** Losskoppling av installationer och demontering för återbruk.

Omgivningspåverkan

- **Utomhus:** Arbete med montage av den prefabricerade stommen genererar ljud och vibrationer. Under perioder ska infästningar göras i befintlig byggnad och det kan då under korta perioder ge höga ljud och vibrationer. Mätning sker kontinuerligt för att säkerställa att uppsatta gränsvärden hålls.
- Tätskiktsarbeten på bottenplatta kan skapa tillfällig påverkan i form av lukt.
- **Invändigt:** Vid dockningarbeten i södra delen av CK förekommer borrningar vilket genererar mindre stomljud som kan upplevas störande.

Kontakt

Rebecca Engvall, projektingenjör, 073-039 75 50,
rebecca.engvall@vgregion.se
Jesper Hertzman, byggledare, 0702-38 58 21,
jesper.hertzman@karlanders.se
Kristoffer Lind, projektledare, 0722-08 85 58,

kristoffer.lind@vgregion.se
Bodil Sjans, projektledare, 070- 368 29 98
bodil.sjans@vgregion.se
Mattias Svanberg, platschef, 010-448 18 41,
mattias.svanberg@skanska.se

MIV, verksamhetsanpassning

Nuläge: Lokala anpassningar med skåp och hyllor. Transporter av material.
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen
Färdigställande: Q4 2026

Projektet avslutas i november. Just nu sker enbart mindre anpassningar i enstaka rum. Dialog sker direkt med påverkad verksamhet.

Kontakt

Jesper Hertzman, projektledare, 070-238 58 21,
Jesper.Hertzman@karlanders.se
Omid Khavary, platschef, 076-346 14 59, omid.khavary@k21.se

Nytt ställverk CK

Nuläge: Installation av nytt ställverk
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Inget
Färdigställande: Q3 2027

Vi bygger om ställverk för att säkerställa en redundant och robust elförsörjning. Arbetet påverkar plan 98 och 99 i Centralkliniken.

- **Plan 98:** Arbete pågår med nya ställverken.
- **Plan 99–09:** Arbete med nya uttagslådor på kanalskenor.

Omgivningspåverkan

Ingen känd omgivningspåverkan i detta skede.

Kontakt
Johan Ekstrand, projektledare, 0722 36 33 58, johan.ekstrand@vgregion.se
Maria Nikolic, projektledare, 0722 00 98 67, maria.nikolic@vgregion.se
Lars Börjesson, projektledare, 0340-64 14 55, lars@elektro-emanuel.se

---

Sprinklersystem, etapp 7.4

Nuläge: Installation av sprinklersystem (flera etapper)
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Ingen
Projektets start: Entreprenaden som berör (MC, IK, KK, BK, CK) plan 98 och 99 påbörjades under november 2025.
Färdigställande: Q2 2027

Projektet syftar till att bygga ut sprinklerinfrastrukturen på Östra sjukhuset genom att installera sprinkler i kulvertplan och matning av sprinkler upp i schakt för att förbereda för framtida anslutningar på våningsplan.

Omgivningspåverkan

Projektet har inte någon direkt omgivningspåverkan på tomten.

Aktuellt kommande veckor

Centralkliniken plan 99:


- Etapp 4: Målning av trumma i korridor Måsgången.
- Etapp 6B: Sprinkler demonteras i undertak.
- Etapp 7C: Sprinklermontage.
- Sprinklerhuvud sätts i fysioterapin.
- Ihopkoppling av sprinkler i etapp 1–5.
- Provtryckning sprinkler i etapp 3–4.
- Jobb i VVS-schakt 24 (plan 98–08) enligt separat tidplan.
- Etapp 3: Start av sanering asbest i WC-grupper i omklädningsrum. Arbetsområdet kommer att vara väl inplastat och försett med undertryck så det finns ingen risk för spridning av skadliga partiklar.

Barnkliniken plan 99:

- Etapp 3–4: Sprinklerarbeten pågår.
- Klädförråd: flyttar till plan 00.

Kvinnokliniken plan 99:

Etapp 1: Demontering av undertak i senare delen av veckan.

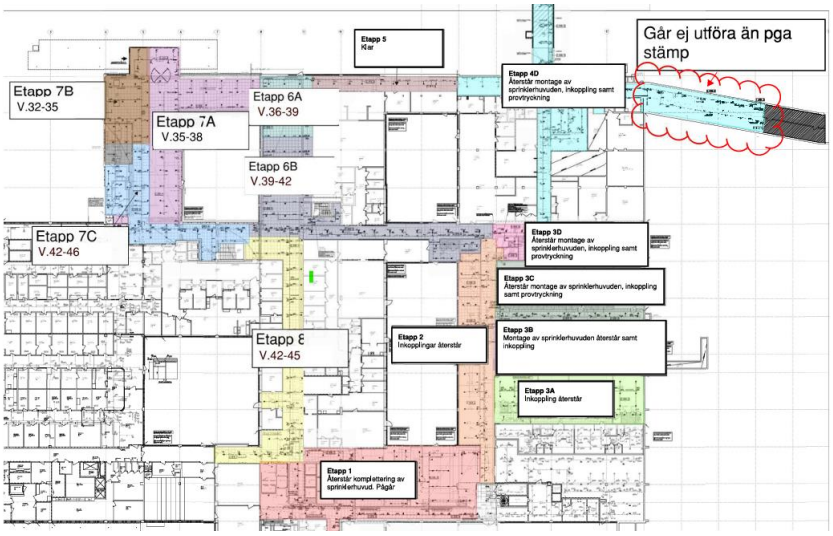

Sprinklercentralen MC: Installationsarbeten pågår.

Kontakt

Ebba Ericson, Ombud, 0735-98 29 91,
ebba.ericson@vgregion.se

Kristoffer Sideby, projektledare, 0767-64 13 16, kristoffer.sideby@ramboll.se

Benjamin Khatibi, byggledare, 0721-61 06 22, benjamin.khatibi@ramboll.se

Stefan Berntsson, kontrollant sprinkler,070-811 15 78,
stefan.berntsson@epg.se

Entreprenör:

Anders Jarlgård, projektchef, 0726-60 13 14, anders.jarlgard@serncon.se


Jesper Rosén, platschef, 0700 – 81 93 16, jesper.rosen@serncon.se

Fredrik Unosson, tillträdande platschef, 0704-45 50 27,
fredrik.unosson@serncon.se

Diagnosvägen 11, Byte av ventilationsaggregat

Nuläge: Byte av ventilationsaggregat i fläktrum på plan 3 ovan CK lågdel
Påverkan för verksamheten kommande veckor: Etablering ställning och bygghiss enligt nedan, inhägnad materialupplag och bodetablering. Installation av brandspjäll plan 99, 00, 01
Projektets start: september 2026
Färdigställande: oktober 2027

Nuvarande aggregat är gammalt, drar mycket energi och har passerat sin tekniska livslängd.
Bytet innefattar en utbyggnad av fläktrummet på plan 3 samt lokala arbeten på plan 99 till 02 med installation av brandspjäll.
Etablering av yta för materialupplag på gräsyta i anslutning till CK huvudentré, staket sätts upp, pågår under vecka 42. Bygghiss samt ställning vid fasad planeras komma på plats under vecka 43.
Arbetet innebär lyft mellan paviljongerna 4919 & 4932 samt anpassning av gångbryggan som leder in mellan paviljongerna och 4236 för att skapa en gång väg in till bygghissen.
Installation brandspjäll på plan 99,00,01 start i vecka 43. Arbetet innebär jobb på planen, i anslutning till verksamheten och lokala inplastningar och arbetsområden kommer att upprättas. Detaljplanering med berörda kommer att göras.

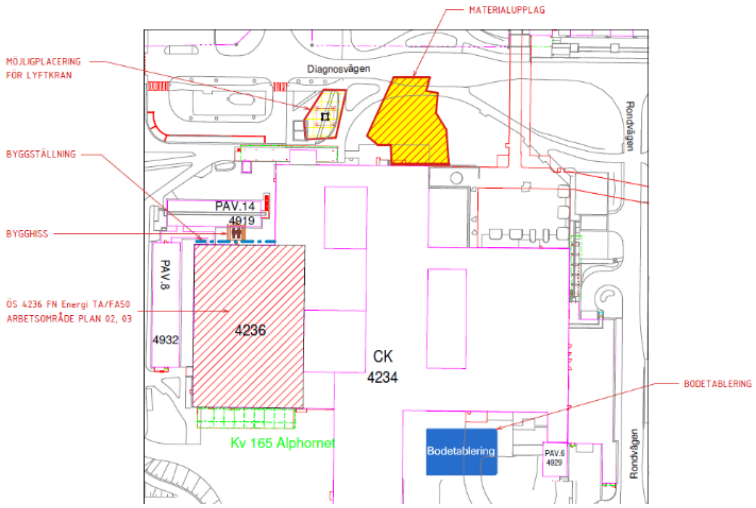

Kranlyft kommer att göras framför huvudentrén enligt nedan arbetsplatsöversikt.

Omgivningspåverkan

Materialupplag med staket runt etableras enligt arbetsplatsöversikt. Byggställning och bygghiss sätts upp mot lågdelens norrafasad. Ett väderskydd kommer byggas över fläktrummet.

Kontakt

Robin Staaf, Projektledare, 0734-459671, robin.staaf@vgregion.se

Daniel Dimitriev, Bitr. Projektledare, 0704-203024,

daniel.dimitriev@vgregion.se

Entreprenör

Peter Schülén, entreprenadchef ISAB, 070- 8346521,

peter.schulen@isabvent.se

Ola Stridh, Arbetsledare ISAB, 0721-63 45 88, ola.stridh@isabvent.se
