

Internt beslutsunderlag

Datum: 2025-10-06

Västra Götalandsregionen

Sahlgrenska, Laboratoriemedicin

Handläggare: Carl Thyberg

Telefon: 073 661 40 23

E-post: carl.thyberg@vgregion.se

Till Klinisk ledning

Tidplan projekt LISA

Beslut

Klinisk ledning ställde sig bakom och ordförande beslutade enligt förslag att:

1. Senarelägga driftstarten för Klinisk Kemi från andra halvåret 2026 till första halvåret 2027
2. Senarelägga driftstarten för Primärvården från första halvåret 2027 till andra halvåret 2027
3. Tidigarelägga driftstarten för Klinisk Patologi från kvartal 2 2027 till kvartal 4 2026

Sammanfattning av ärendet

Tidplanen för LISA var tidigare sammankopplad med program Millenniums delleverans 4 (PD4). Den tidplanen var komprimerad jämfört med originalplanen vilket innebar högre kostnader och ökade risker.

LISA-systemet måste integreras med de system där laboratediagnostik beställs. Ursprungligen planerades integration med bland annat Millennium. Med anledning av förändringarna i program Millennium är det i nuläget oklart vilka system LISA ska integreras med. Oavsett vilka system det blir kommer integrationsarbetet att vara så omfattande att en driftstart för Klinisk Kemi hösten 2026 inte längre är möjlig.

Med anledning av detta måste driftstarten för Klinisk Kemi senareläggas till första halvåret 2027.

Detta innebär i sin tur att driftstarten för Primärvården måste flyttas från första halvåret 2027 till andra halvåret 2027.


För att inte försena projektet i sin helhet tidigareläggs driftstarten för Klinisk Patologi till kvartal 4 2026.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Senareläggning av driftstarten för Klinisk Kemi till första halvåret 2027 bedöms inte försena projektets slutdatum. Eftersom Klinisk Patologi tidigareläggs är det fortfarande möjligt att slutföra projektet under 2027.

En utredning pågår med syftet att identifiera vilket eller vilka beställarsystem (oftast journalsystem) LISA lämpligen bör integreras med. I samband med detta samlas även in behov och synpunkter från beställarna (remittenterna), det vill säga Laboratoriemedicins kunder. Utredningen beräknas vara klar i månadskiftet september-oktober 2025.

Inom VGR saknas idag elektroniska beställar- eller svarsflöden för Klinisk Genetik, Klinisk Patologi eller Transfusionsmedicin. Behovet av detta är dock stort. Utredningen kommer även ta hänsyn till detta behov.

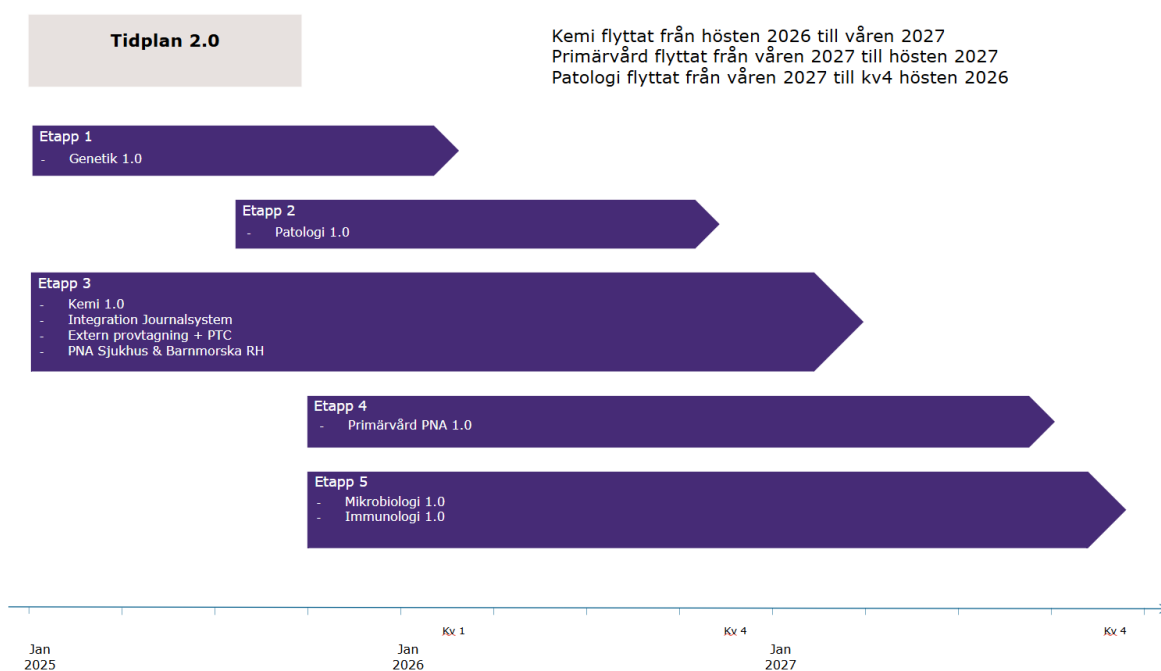

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

En del av resurskostnaden för den förra fullt komprimerade tidplanen försvinner, ca 7 MSEK.

Resurskostnader för det omfattande integrationsarbetet utökas med 3 MSEK.

Det är i nuläget oklart om LIS-leverantören kommer att kräva ökad ersättning för denna relativt stora förändring av tidplanen.

LIS-leverantören kan dock komma att kräva att VGR betalar enligt den ursprungliga tidplanen.

I övrigt bedöms ändringarna i tidplanen inte påverka projektets totala kostnad eller resurser.

Risk

Denna förändring av tidplan minskar risken för förseningar i projektet.

Samtidigt innebär den oklara situationen avseende gemensamt vårdinformationssystem och VGRs befintliga systemflora av beställarsystem att risken ökar för förseningar och komplikationer.

Ställningstagandet skickas till

- Peter Gjertsson peter.gjertsson@vgregion.se, Områdeschef Område 4 samt Uppdragsgivare LISA-projektet, för genomförande
- Annette Lövefors Daun annette.lovefors.daun@vgregion.se, Operativ chef Område 4 samt Projektägare LISA-projektet, för kännedom
- Jennie Georgsson jennie.georgsson@vgregion.se, Verksamhetschef Klinisk Kemi, för kännedom
- Michael Wilstermann michael.wilstermann@vgregion.se, Verksamhetschef Klinisk Patologi, för kännedom
- Christer Bogren christer.bogren@vgregion.se, projektledare CHA, för kännedom
- Håkan Nyström hakan.nystrom@vgregion.se, projektledare Arken, för kännedom
- Carl Thyberg carl.thyberg@vgregion.se, projektledare LISA, för kännedom
