


# Lägesrapport beredning av handlingsalternativ

Underlag till referensgrupp 2025-02-25

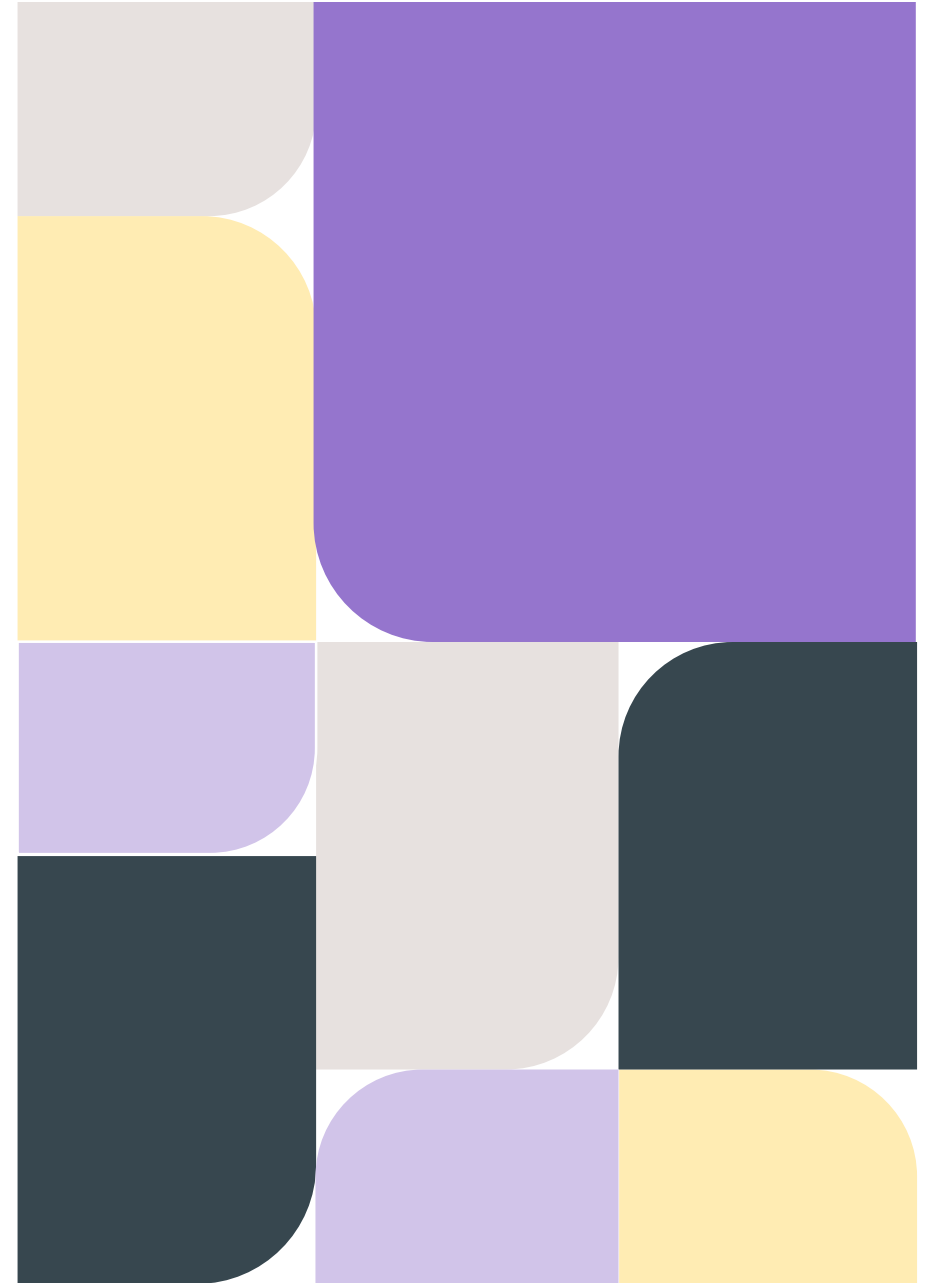

Samordnings-  
grupp IVIS  
startar

Dec -24

Jan -25

Feb -25

Mars -25

2025-12-22

KPMG inleder  
extern granskning

Region Skåne meddelar  
uppskjutet införande

Extern granskning  
presenteras

Förslag  
Handlings-  
alternativ  
klart

### Framtagning av handlingsalternativ för adekvat patientsäkert vårdinformationssystem

Fas 1

Utveckling av handlingsalternativ

Metod för utvärdering av handlingsalternativ

Fas 2

Utrullningsalternativ

Analys för-/nackdelar

### Regional erfarenhetsinsamling

Förvaltningarnas erfarenheter och Lessons Learned


Intervjuer och webbfråga

Program Millennium och KSDs erfarenheter och Lessons Learned

Risikanalys på vad pausen innebär

Analys av tidsåtgång vanliga arbetsmoment

Extern granskning

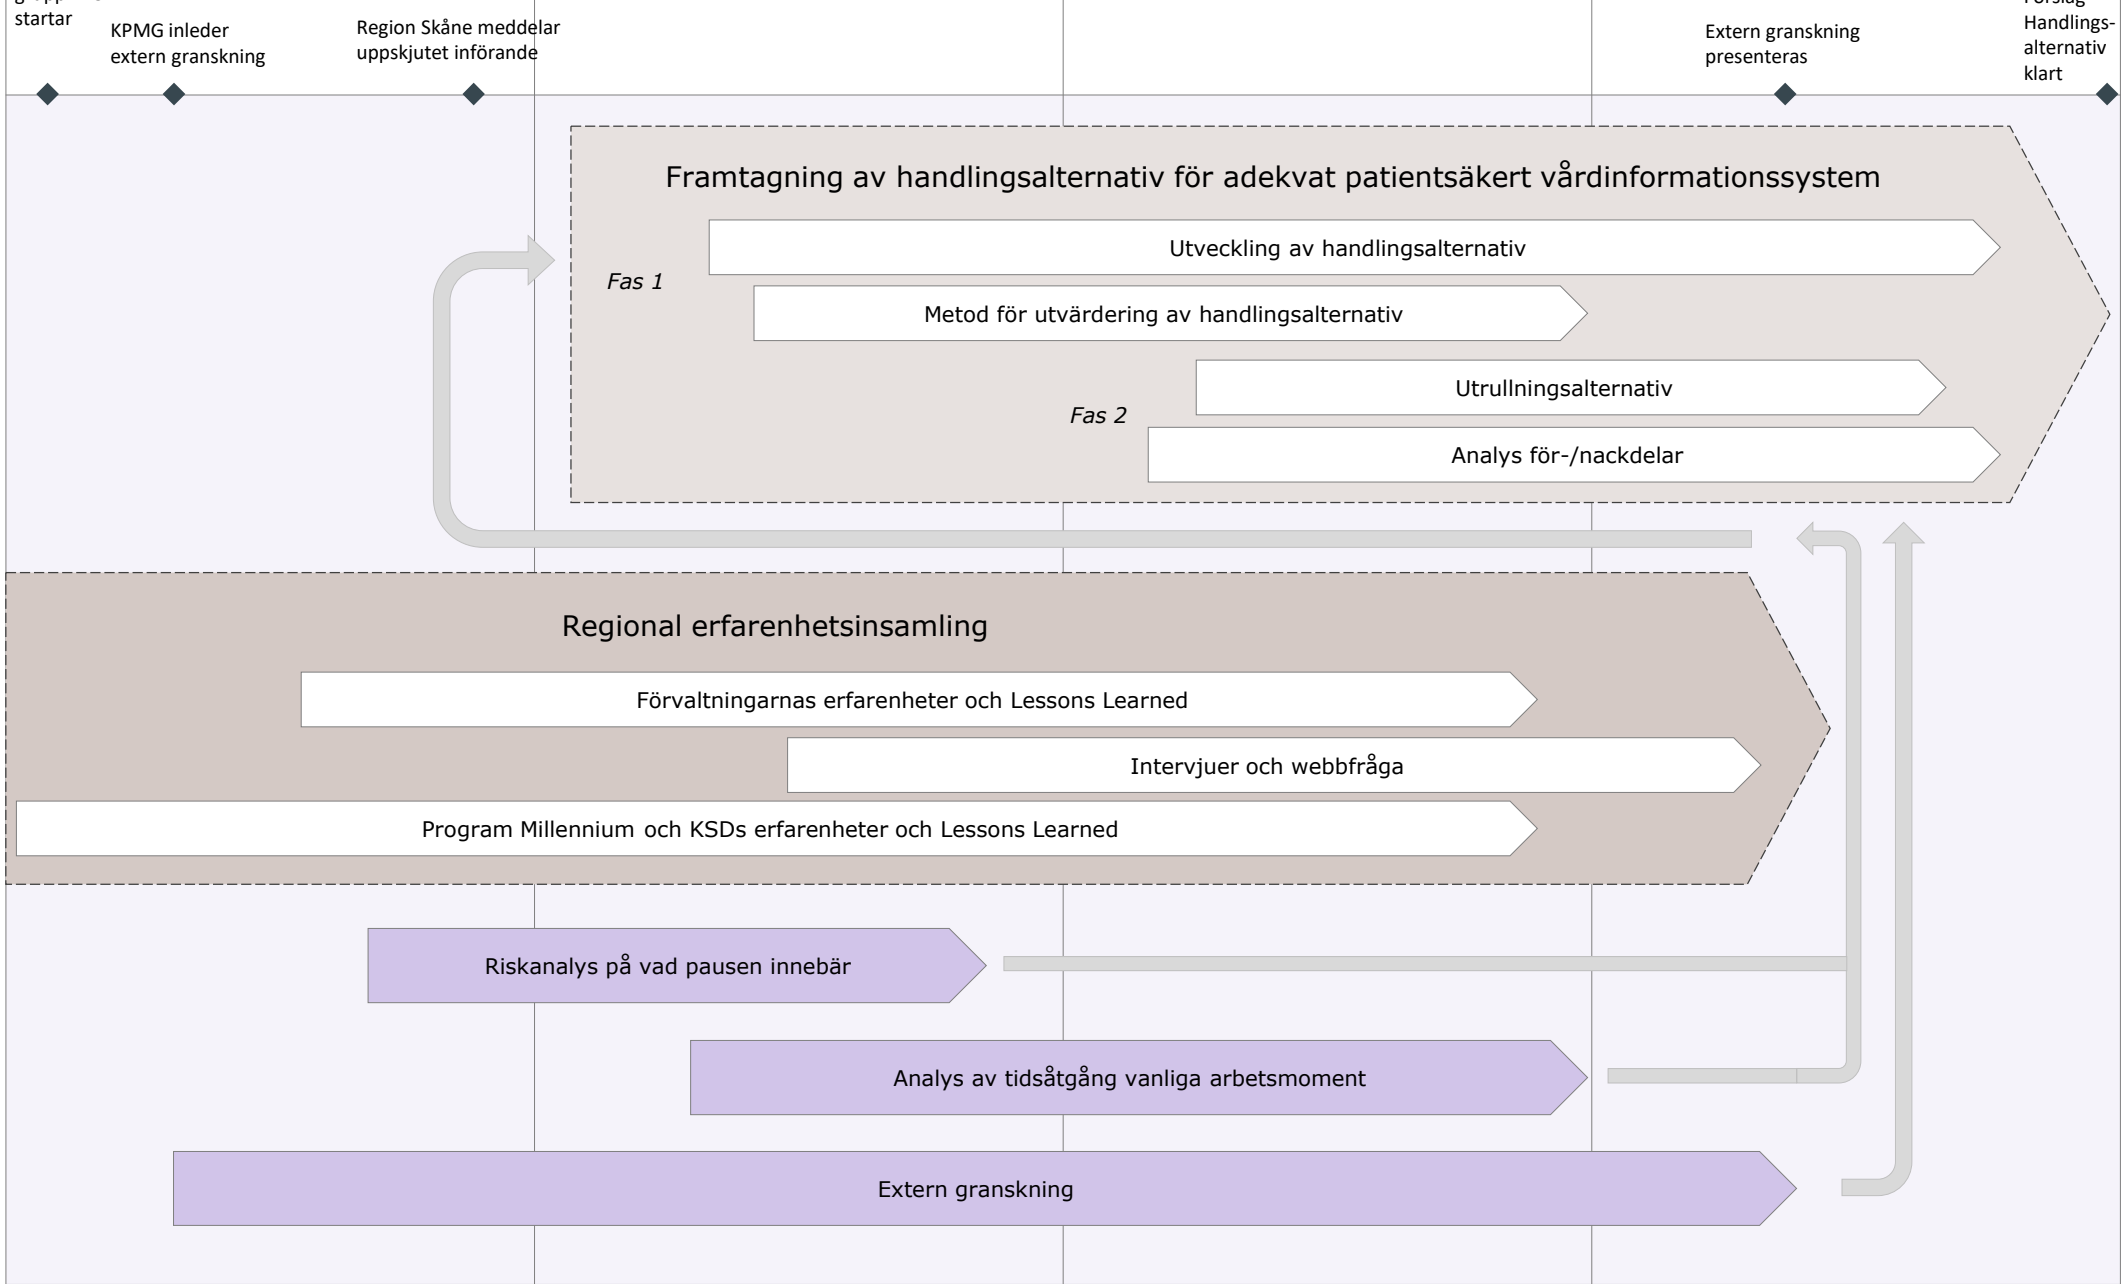

Samordnings-  
grupp IVIS  
startar

Dec -24

Jan -25

Feb -25

Mars -25

2025-12-22

KPMG inleder  
extern granskning

Region Skåne meddelar  
uppskjutet införande

Extern granskning  
presenteras

Förslag  
Handlings-  
alternativ  
klart

### Framtagning av handlingsalternativ för adekvat patientsäkert vårdinformationssystem

Fas 1

Utveckling av handlingsalternativ

Metod för utvärdering av handlingsalternativ

Fas 2

Utrullningsalternativ

Analys för-/nackdelar

### Regional erfarenhetsinsamling

Förvaltningarnas erfarenheter och Lessons Learned


Intervjuer och webbfråga

Program Millennium och KSDs erfarenheter och Lessons Learned

Risikanalys på vad pausen innebär

Metod för analys av tidsåtgång

Extern granskning

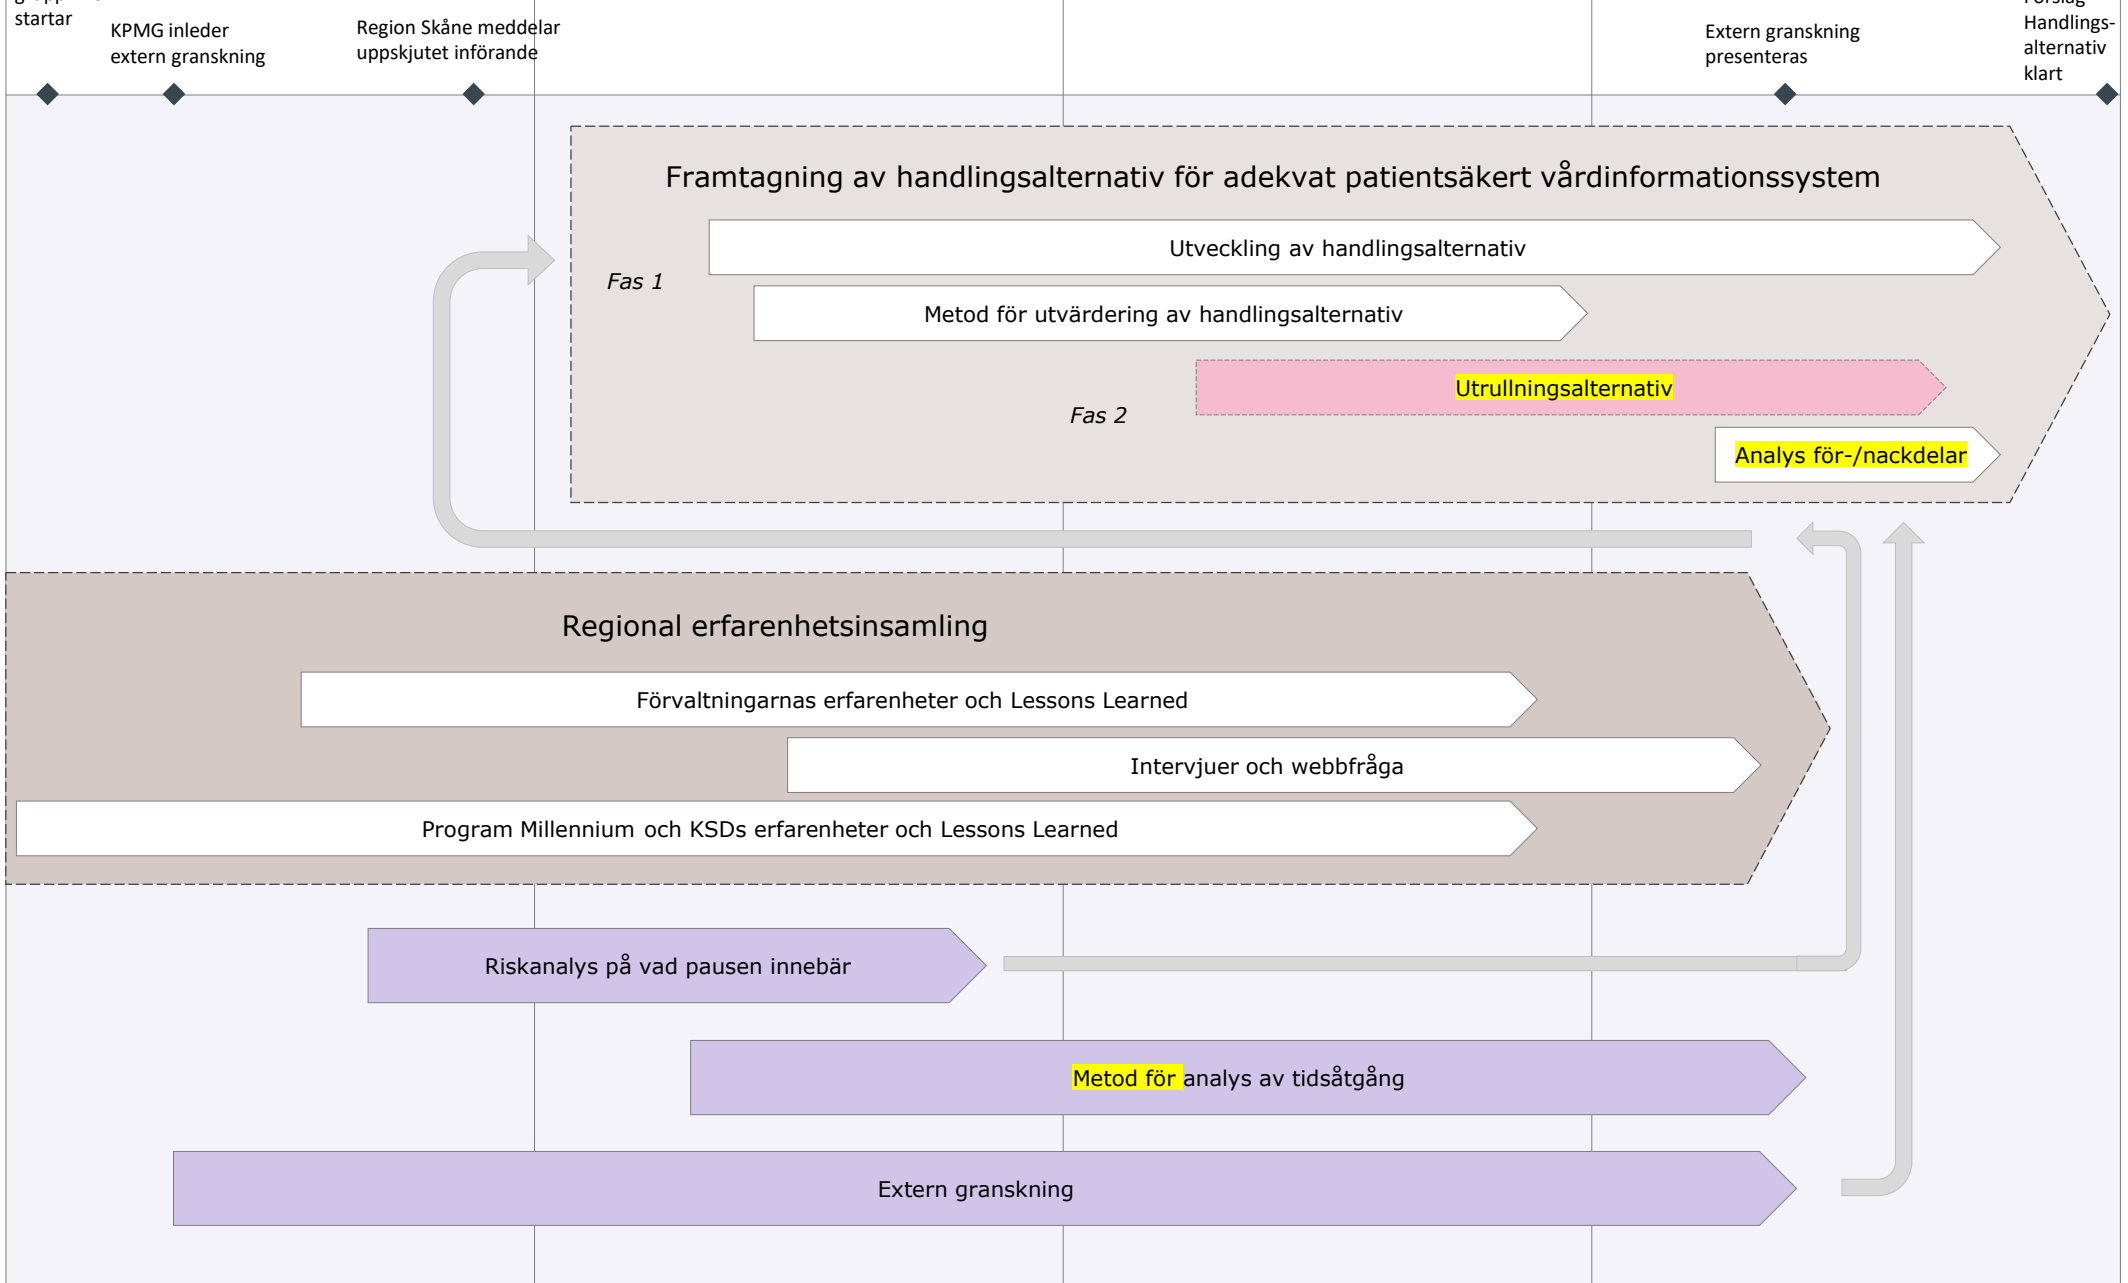

# Handlingsalternativ som ska fördjupas

Oracle Millennium

Upphandling av kärnsystem

Upphandling(-ar) baserat på  
openEHR / Modulbaserat


Egen utveckling av EHR



# Problem

ID	Beskrivning	Orsak	Konsekvens	Åtgärd	Status
P1	Vi har inte fått tillräckligt tydliga instruktioner hur samarbetet med Oracle ska ske. Oracle behöver involveras för att fördjupa handlingsalternativ	En dialog måste föras med Oracle för att förstå vad som är möjligt utifrån VGRs behov	Fördjupning av handlingsalternativ med Millennium är tillfälligt pausat och kan inte genomföras  Gör att risken för försening ökar	Beslut om samarbete med Oracle och på vilket sätt det ska ske behöver tas (tillvägagångssätt, och former)	Inväntar besked samt färdigställande av pausavtal

# Fördjupning och analys

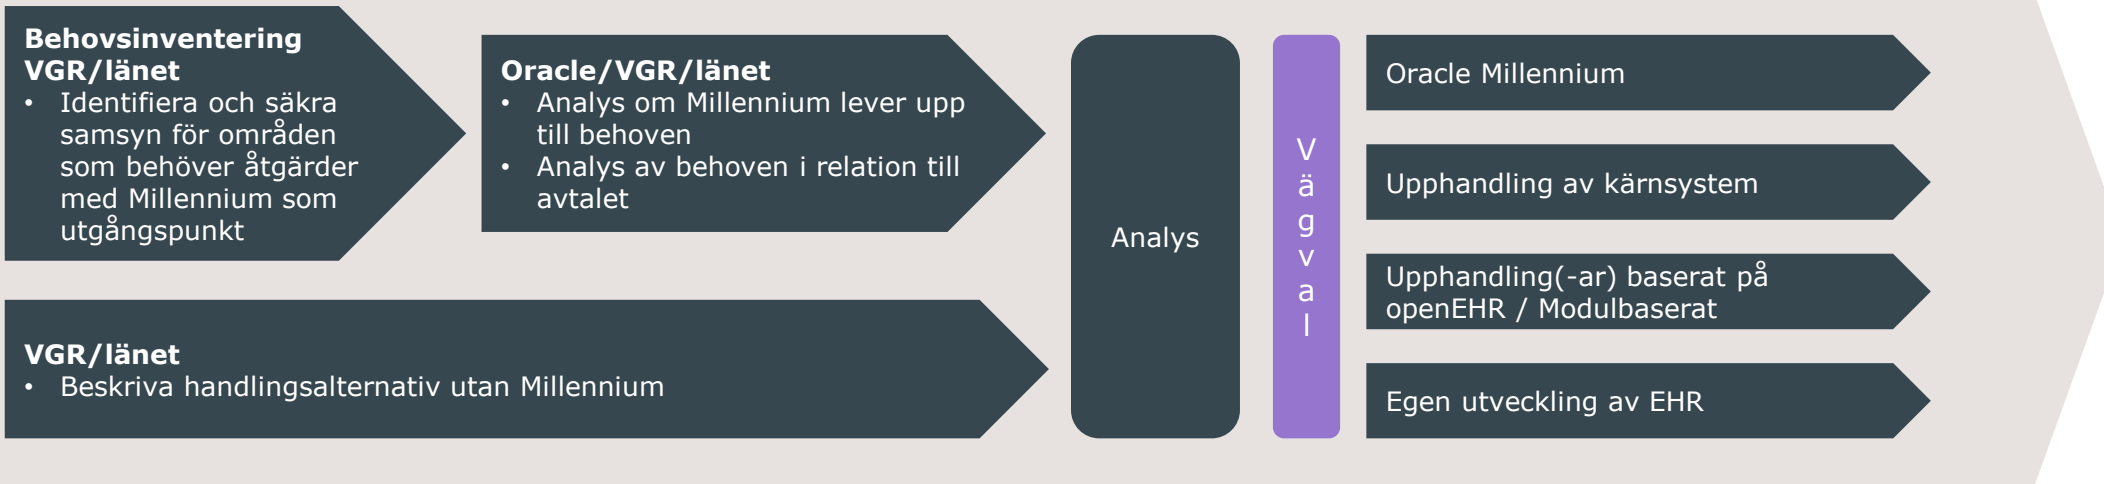

## Fördjupning för respektive handlingsalternativ enligt arbetsfördelning

- Ta fram ett grundmaterial kring respektive alternativ inkl. utkast SWOT. Tillvägagångssättet under denna aktivitet kommer skilja mellan de olika grupperna

## Sammanställning och analys gemensamt i arbetsgruppen

- Grundmaterialet sammanställs, synkroniseras, kvalitetssäkras och analyseras - görs i arbetsgruppen, stäms av med handlingsgrupperna

# Fördjupning för respektive handlingsalternativ

- Oracle-spåret
  - Mål: Identifiera och säkra samsyn för områden som behöver förbättras (blomman) samt beskriva viktiga aktiviteter som behöver genomföras. I den mån det är möjligt summera utfallet från samarbete med Oracle inkl. grov preliminär tidplan för identifierade aktiviteter. Genomföra SWOT-analys utifrån metod för utvärdering. Stämt av med referensgruppen. Klart 14 mars.
- Upphandlings- och egenutvecklingsspåren
  - Mål: Beskriva förutsättningar, huvudsakliga aktiviteter för att genomföra alternativen samt tids- och kostnadsuppskattningar. Genomföra SWOT-analys utifrån metod för utvärdering. Stämt av med referensgruppen. Klart 14 mars.



# Fortsatt beredning handlingsalternativ fram till 14 mars

- Oracle
  - Färdigställande av blomman utifrån erfarenhetsinsamlingen
  - Kvalitetssäkra tillsammans med program Millennium
- Upphandling
  - Workshopar heldag i Göteborg: 27/2, 6/3 och 13/3
  - Arbetsmöten
- Egen utveckling
  - Löpande arbetsmöten under perioden

