

Nätverk Införandeansvariga (IA), hälso- och sjukvårdens digitalisering 2024-04-10

- Grundprincip om du vill ha ordet – Räck upp handen i chatten
- Ställ hellre frågor i mötet än i chatten



Agenda 2024-04-10

- | | | |
|---------------|--|---------------------------|
| 15:30-15:35 | Inledning
- inkl. återkoppling föreg. möte samt mötesanteckning | <i>(Christian C)</i> |
| 15:35 – 16:00 | Tidplan taktiskt styrgrupp för ett sammanhållet vårdinformationssystem | <i>(Annika Mortensen)</i> |
| 16:00-16:15 | Simuleringslab Millennium
- Information | <i>(Maria Svensson)</i> |
| 16:15 – 16:25 | Övrigt | |
| 16:25-16:30 | Sammanfattning samt Planering | <i>(Christian C)</i> |

Övergripande tidplan för Millennium, LISA, An/IVA och FVM EE

2024-04-09



Innehåll

- **Övergripande tidplan Millennium, LISA, An/IVA, FVM EE**
 - Tidplan
 - Tidplan per förvaltning
- **Programplaner**
 - Millennium
 - An/IVA CHA
 - LISA
 - FVM EE



Uppdrag för Taktisk styrgrupp för ett sammanhållet vårdinformationssystem

*Taktisk styrgrupp för ett sammanhållet vårdinformationssystem*s uppdrag är att samordna de större digitaliseringsprojekt som pågår samt förtydliga ansvar för att säkerställa ett framgångsrikt införande i Västra Götalandsregionen (VGR) samt de externa aktörer som berörs.

Gruppen ansvarar för att helheten beaktas så att arbetet sker inom ramen för fattade beslut och ekonomiska ramar. Dessutom ska gruppen säkerställa prioritering och samordning av tidplaner och sammantagen systemlösning sker så att program Millennium inte påverkas negativt. Det är av största vikt att gruppens arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar förankras i VGR:s berörda förvaltningar. Beslut som har större budgetpåverkan eller tidplans eller avtalspåverkande vägvalsfrågor med konsekvenser för vårdverksamheten ska eskaleras till strategisk nivå, Styrgrupp Hälso- och sjukvårdens digitalisering. Innan en fråga eskaleras ska den beredas.

Uppdraget avgränsas i ett första steg att inkludera program Millennium och de projekt som har beröring till Millennium inom ÖGA såsom AnIVA, LISA och FVM EE. Fler projekt och aktörer kan komma att ingå över tid.

(Hämtat ur Diarienummer RS 2024-00748)

Tidplan taktisk styrgrupp för ett sammanhållet vårdinformationssystem

- info

Annika Mortensen



Läsinstruktion


- Alla ingående detaljer är inte beskrivna utan fokus på presentationen är beroenden mellan aktuella projekt.
- Millenniums tidplan är beslutad och fastställd sedan tidigare.
 - Privata vårdgivare hanteras separat enligt nytt beslut våren 2024
 - Kommuner använder enbart SamVy
- An/IVA CHA-planeringen efter SÄS är under framtagande
- LISA är under upphandling



Instruktion för feedback

- Läs tidplanen för er förvaltning och kommentera specifika utmaningar som riskerar att påverka den Övergripande tidplanen
- Finns andra lokala projekt som kan påverka?
- Hur hanterar ni resursbehovet som krävs för de förberedande aktiviteterna som beskrivs?

ARBETSMATERIAL 2024-04-09

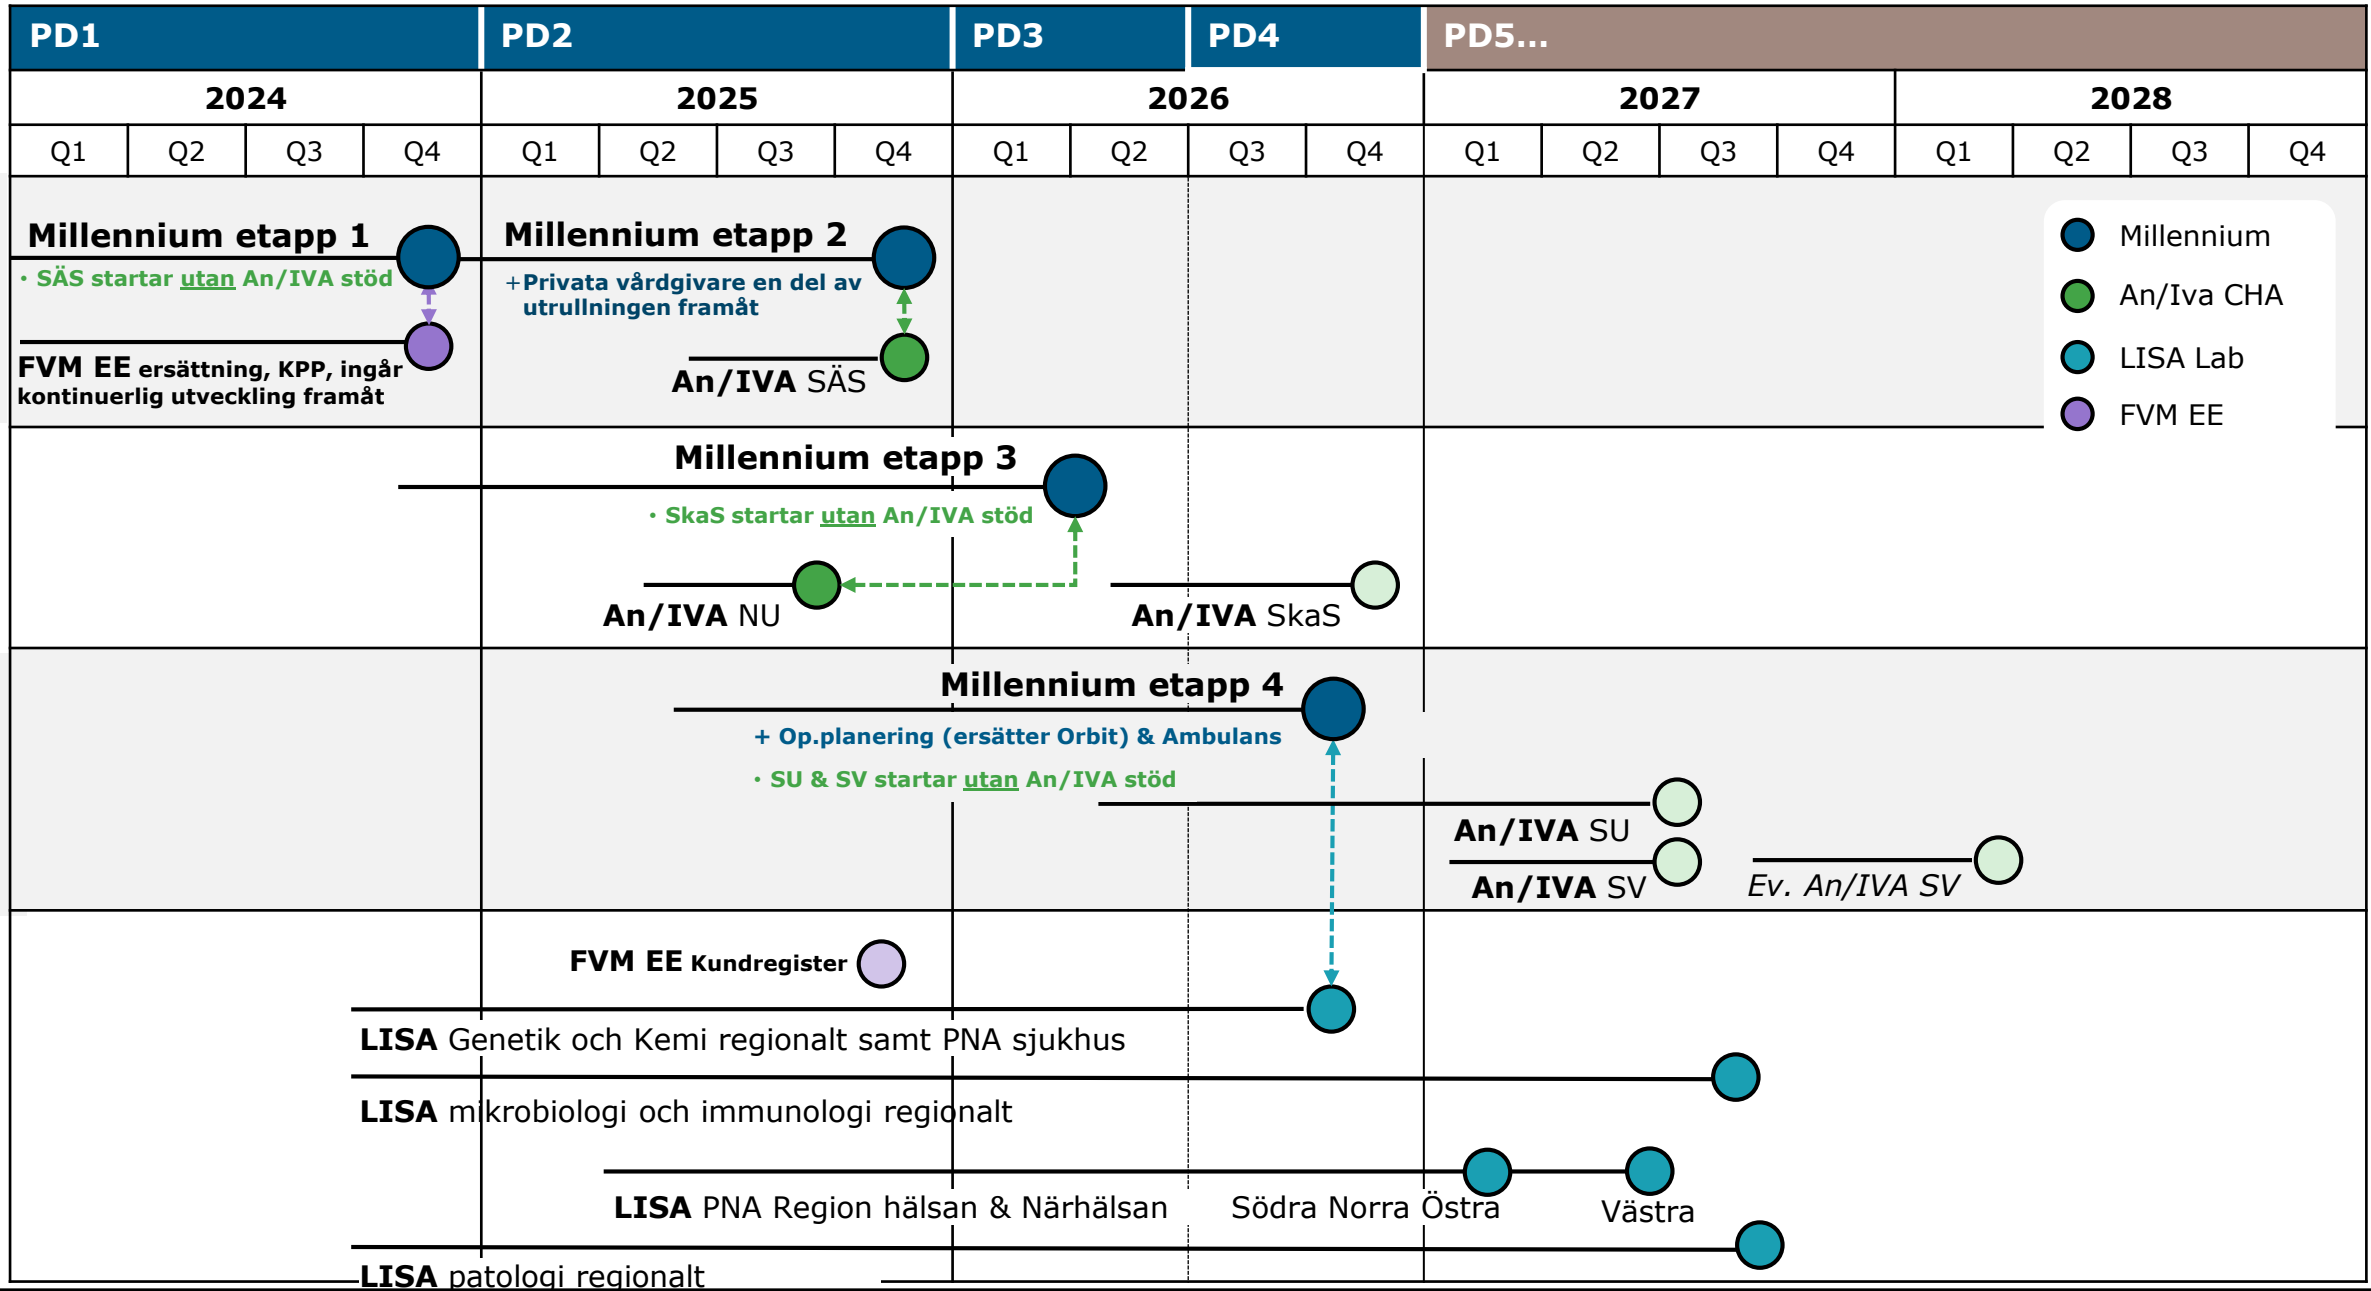

Tidplan per förvaltning

SÄS

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START	<p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startar utan An/IVA stöd <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Mikro wwLab • Transfusionsmedicin, Prosang • Patologi, Sympathy <p>Andra större projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sectra/Klinfys 	<p>Millennium, ny funktionalitet</p> <p>An/IVA CHA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • An/IVA integrerat med Millennium 		<p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA sjukhus • Genetik
FÖRBEDANDE	<p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium • Integration Millennium & An/IVA 	<p>Delta i regional design för PD4</p> <p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA & Genetik 	<p>Delta i regional design för PD4</p> <p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA & Genetik <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi 	<p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi

Närhälsan

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START	<p>Millennium</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Lokalt lab, LabCenter • Mikro wwLab • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang 	<p>Millennium</p>	<p>Millennium</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Lokalt lab, Lifecare Light • Mikro wwLab • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unilab (kemi, mikro, patologi, transfusion) 	<p>Millennium</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt lab, Lifecare Light • Mikro, BaktLis • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi
FÖRBEDANDE	<p>Start 16-månadersplan Millennium PD2</p> <p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium 	<p>Start 16-månadersplan Millennium PD3</p> <p>Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNA Region hälsan & Närhälsan 	<p>Start 16-månadersplan Millennium PD4</p> <p>Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNA Region hälsan & Närhälsan 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PNA Region hälsan & Närhälsan

Regionhälsan

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START	Millennium Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Lokalt lab, LabCenter • Mikro wwLab • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang 	Millennium	Millennium Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Lokalt lab, Lifecare Light • Mikro wwLab • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang 	Millennium Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Lokalt lab, Lifecare Light • Mikro, BaktLis • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang
FÖRBEDANDE	Start 16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD2 <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium 	Start 16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • PNA Regionhälsan & Närhälsan 	Start 16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • PNA Region hälsan & Närhälsan 	16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • PNA Region hälsan & Närhälsan

Habilitering och hälsa

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START		Millennium Diagnostik (Millennium) ? <ul style="list-style-type: none"> • ? 		
FÖRBEDANDE	Start 16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD2 <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium 	16-månadersplan Millennium		

NU

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START		<p>An/IVA CHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsätter An/IVA CHA 	<p>Millennium</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, LifeCare • Mikro, wwLab • Transfusionsmedicin, Prosang • Patologi, Sympathy <p>An/IVA CHA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsätter integration med Millennium 	<p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA sjukhus • Genetik
FÖRBEDANDE	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium • Integration Millennium & An/IVA 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, LifeCare <p>Delta i regional design för PD4</p> <p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA(Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>Delta i regional design för PD4</p> <p>Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik LISA(Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi 	<p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi

SkaS

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START			Millennium Startar utan An/IVA stöd Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Unilab (kemi, mikro, patologi, transfusion) 	Millennium <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans An/IVA CHA (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Driftsätter integration med Millennium
FÖRBEDANDE	Start 16-månadersplan Millennium Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Unilab (kemi, mikro, patologi, transfusion) Delta i regional design för PD2 <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium • Integration Millennium & An/IVA 	16-månadersplan Millennium Diagnostik (Millennium) <ul style="list-style-type: none"> • Unilab (kemi, mikro, patologi, transfusion) Delta i regional design för PD4 Millennium <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans 	16-månadersplan Millennium Delta i regional design för PD4 Millennium <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans 	

ARBETSMATERIAL 2024-04-09

SU

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIIFT & START				<p>Millennium Startar utan An/IVA stöd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA sjukhus (LISA) • Genetik (LISA) • Mikro, BaktLIS • Transfusionsmedicin, ProSang • Patologi, Sympathy
FÖRBEDANDE	<p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium • Integration Millennium & An/IVA 	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro, BaktLIS <p>Diagnostik LISA(Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro, BaktLIS <p>Diagnostik LISA(Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>An/IVA CHA PD5</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHA inklusive integration till Millennium <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi

SV

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIIFT & START				<p>Millennium Startar utan An/IVA stöd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA sjukhus (LISA) • Genetik (LISA) • Mikro, BaktLIS • Mikro, wwLab • Transfusionsmedicin, ProSang • Patologi, Sympathy
FÖRBEDANDE	<p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium • Integration Millennium & An/IVA 	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro, BaktLIS <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik <p><i>Högsbo?</i></p>	<p>16-månadersplan Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operationsplanering • Ambulans <p>Diagnostik Millennium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro, BaktLIS <p>Diagnostik LISA(Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA och Genetik <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>An/IVA CHA PD5</p> <ul style="list-style-type: none"> • CHA inklusive integration till Millennium <p>Delta i regional design för PD5</p> <p>Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi

Regionlab

	PD1 Jan – Dec 2024	PD2 Jan – Dec 2025	PD3 Jan – Jun 2026	PD4 Jul - Dec 2026
DRIFT & START	<p>Diagnostik Millennium SÄS, Närhälsan, Regionhälsan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, Analytix • Lokalt lab, LabCenter • Mikro wwLab • Patologi, Sympathy • Transfusionsmedicin, Prosang 	<p>Diagnostik Millennium Habilitering och hälsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • ? 	<p>Diagnostik Millennium NU, Närhälsan, Regionhälsan</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, LifeCare • Mikro, wwLab • Transfusionsmedicin, Prosang • Patologi, Sympathy <p>Diagnostik LISA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Genetik (utan integration till Millennium) 	<p>Diagnostik Millennium SU, SV, Närhälsan, Regionhälsan</p> <p>Diagnostik (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA sjukhus (LISA) • Genetik (LISA) • Mikro, BaktLIS • Transfusionsmedicin, ProSang • Patologi, Sympathy
FÖRBEDANDE	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <p>Delta i regional design för PD2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny funktionalitet Millennium 	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <p>Delta i regional design för PD3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, LifeCare • SU & NU design Mikro (wwLab) <p>Regional design för PD4 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA & Genetik • PNA Regionhälsan & Närhälsan <p>Regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi • PNA Region hälsan & Närhälsan 	<p>Start 16-månadersplan Millennium</p> <p>Regional design för PD4 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemi, PNA & Genetik • PNA Regionhälsan & Närhälsan <p>Regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi • PNA Region hälsan & Närhälsan 	<p>16-månadersplan Millennium</p> <p>Regional design för PD5 Diagnostik LISA (Millennium)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro & Patologi • PNA Region hälsan & Närhälsan

Programplaner

Basen utgörs av tidplan för införandet av Millennium

Införanden
i geografiska
områden

Hösten 2024

Södra del 1



- Södra Älvsborgs sjukhus
- Vårdcentraler och Rehab (egen regi)
- Regionhälsan
- Regional laboratoriemedicin
- Städ och service
- Kommunal primärvård och privata vårdgivare (informationsutbyte)

Hösten 2025


Södra del 2



- Södra Älvsborgs sjukhus (ny funktionalitet)
- Vårdcentraler och Rehab (privat regi)

Våren 2026


Norra & Östra



- NU-sjukvården
- Skaraborgs sjukhus
- Vårdcentraler och Rehab*
- Regionhälsan
- Regional laboratoriemedicin
- Städ och service
- Kommunal primärvård (informationsutbyte)

Hösten 2026

Västra



- Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Sjukhusen i väster
- Vårdcentraler och Rehab*
- Regionhälsan
- Regional laboratoriemedicin
- Städ och service
- Kommunal primärvård (informationsutbyte)

Regionala
införanden i hela
Västra Götaland
samtidigt

Regionala införanden



- Habilitering & Hälsa
- Försörjningsförvaltningens hjälpmedelscentraler
- Primärvårdens hjälpmedelsenhet (Regionhälsan)

Regionala införanden



- Regionhälsans expertenheter, ungdomsmottagningar och prehospital verksamhet
- Ambulanssjukvård

Översiktlig beskrivning av leveranser per driftstart Millennium

Hösten 2024 Första driftstart

- Journalen utgör grunden för det gemensamma stödet med beslutsstöd, standardiserade vårdförlopp, interaktiva vyer, processtöd, läkemedels-hantering och stöd för ordinationsdrivna vårdprocesser

- SAMVY
- Översiktstavla
- Akutmodul
- Logistikmodul
- Patientadministrativ modul
- Klassificerings- och kodmodul
- E-tjänster
- Nationella tjänster
- Integrationer mot andra system och med medicinteknisk utrustning
- Stöd för verksamhetsuppföljning och utdata till kvalitetsregister

Hösten 2025 Andra driftstart

- ePed - en ordination, en instruktion
- Stöd för forskning
- Mobila applikationer för läkare och sjuksköterskor
- Beslutsstöd sepsis
- Infektionsverktyg
- Avancerad infusionspump
- Larmhantering

Våren 2026 Tredje driftstart


*Ingen ny funktionalitet
är planerad*

Hösten 2026 Fjärde driftstart


- Stöd för ambulanssjukvård
- Stöd för cytostatikahantering
- Operationsplanering

An/IVA CHA

BP 1, 2 och 5 ligger enligt avtal. BP 4x är prognoser och ska planeras med leverantör, förvaltningar och KSD

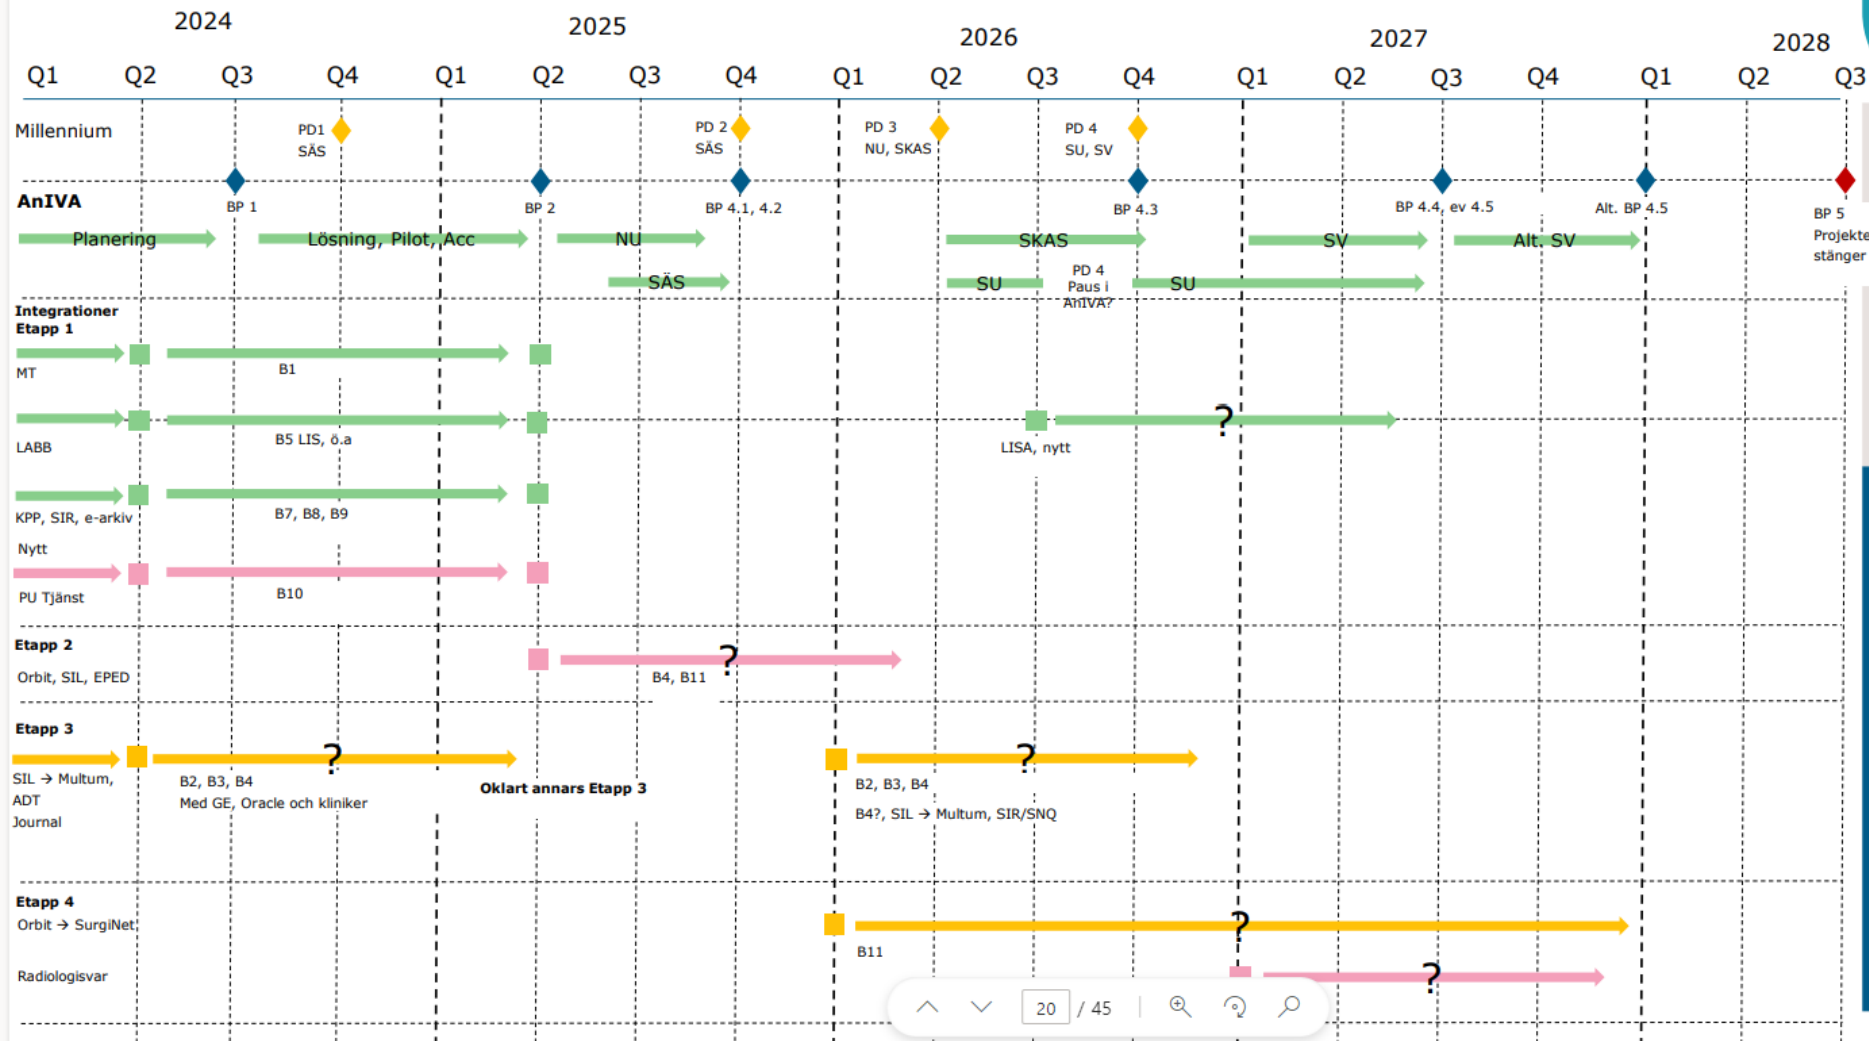


LISA

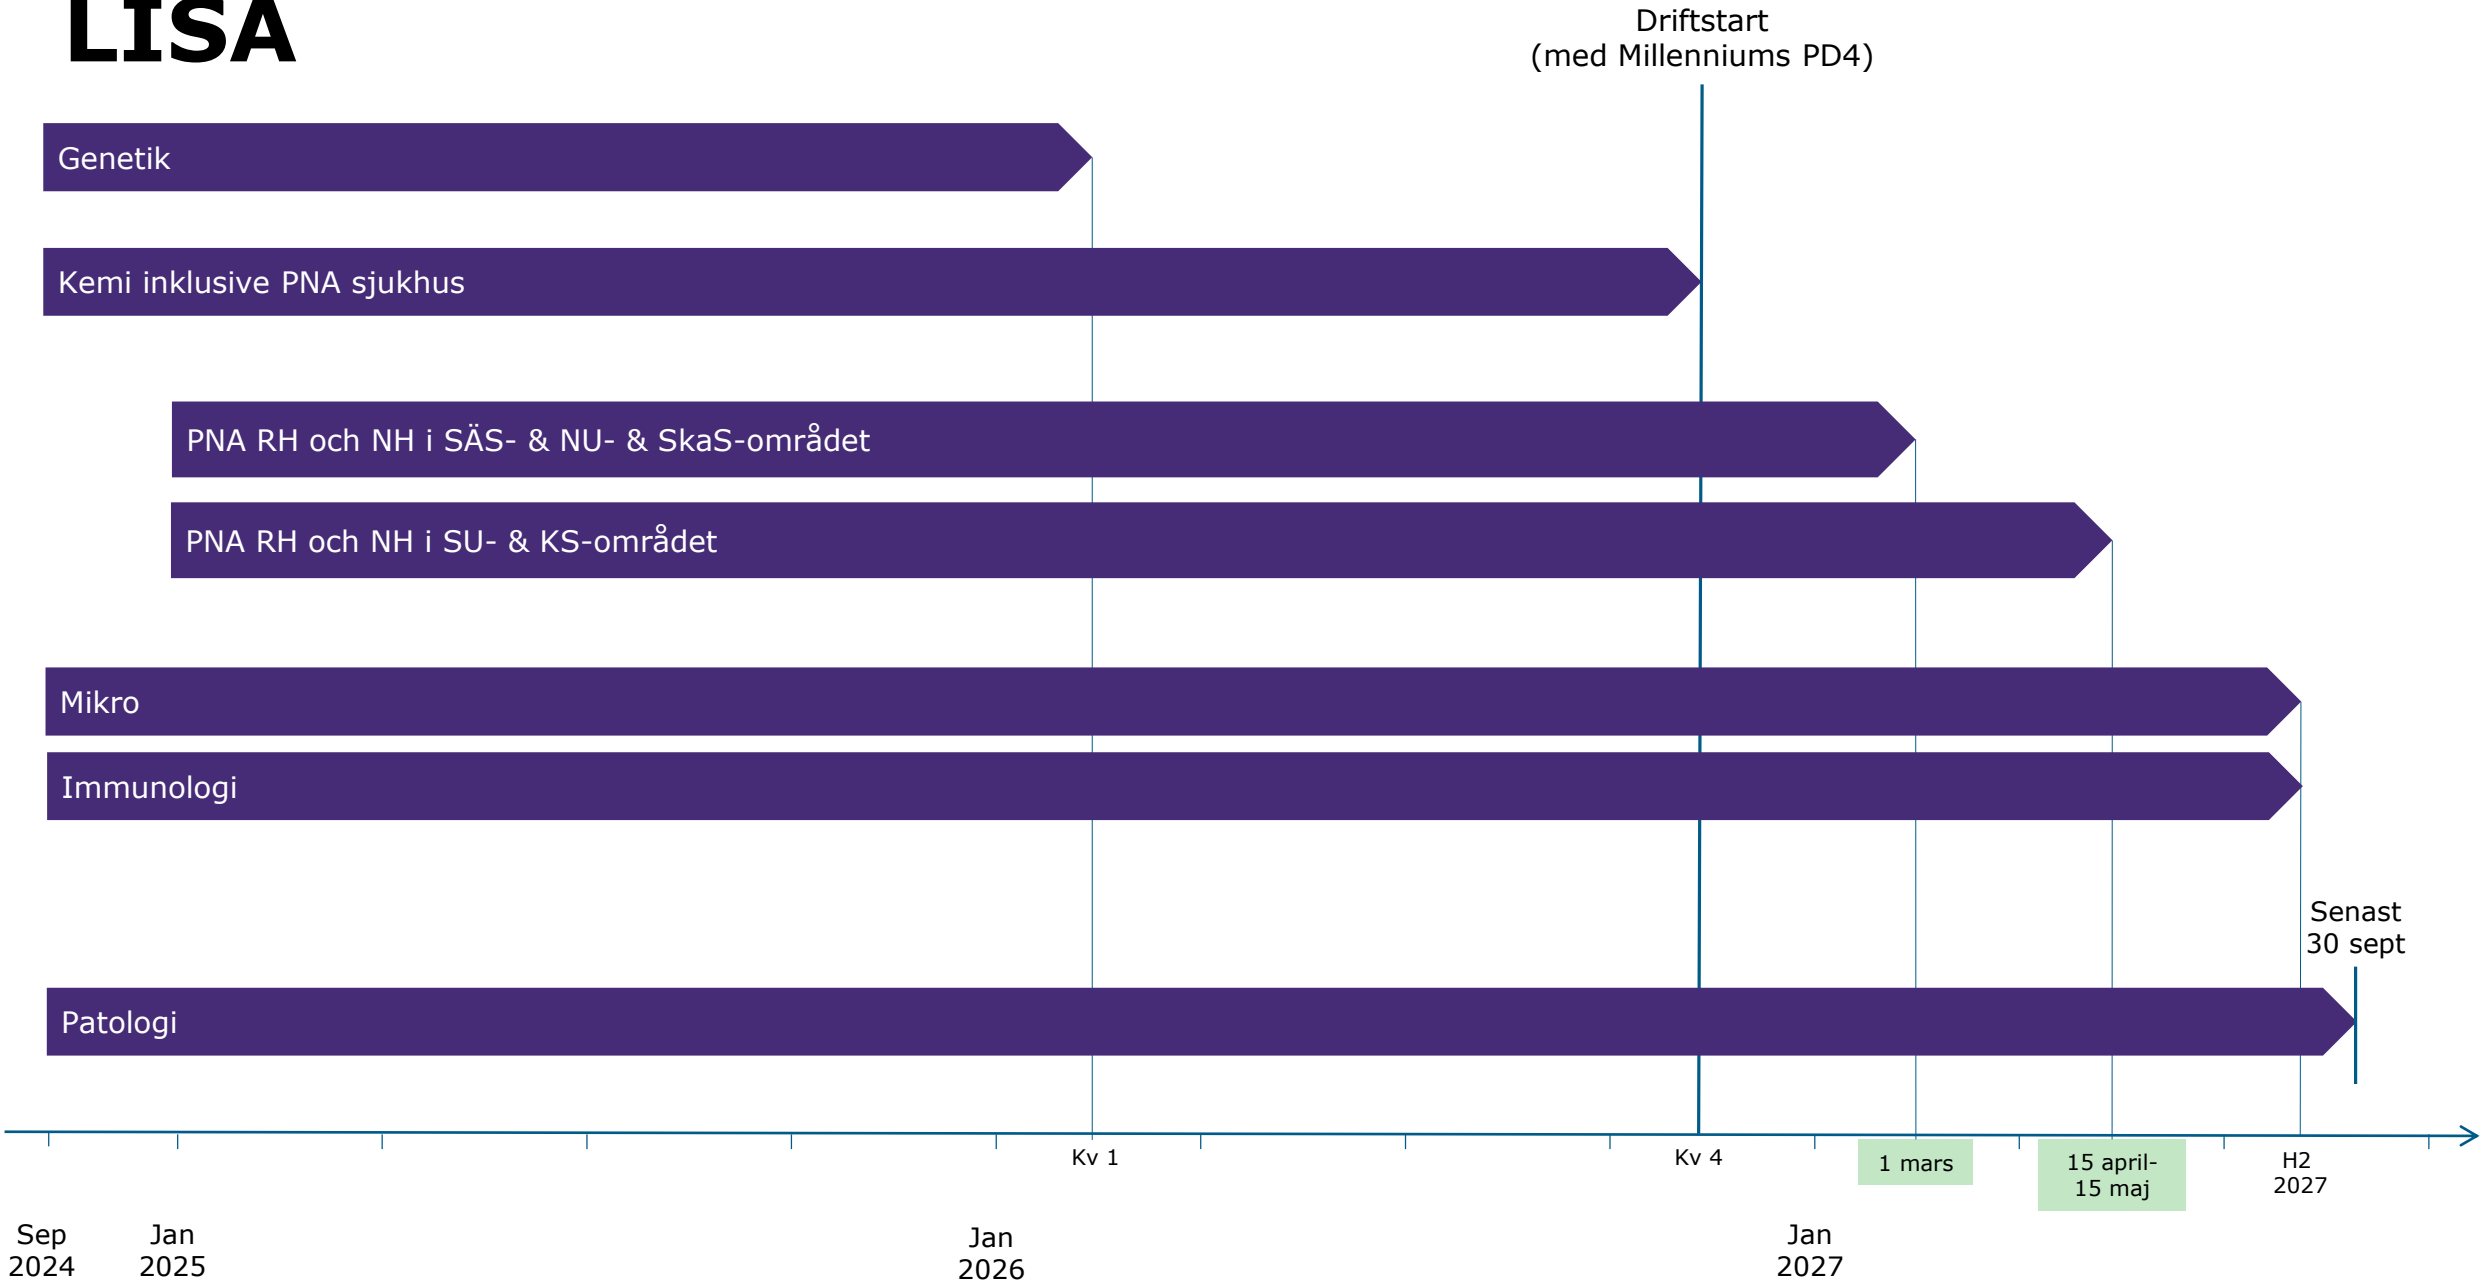

FVM EE Vårdersättningsplattformen (VEP)

2024-03-18

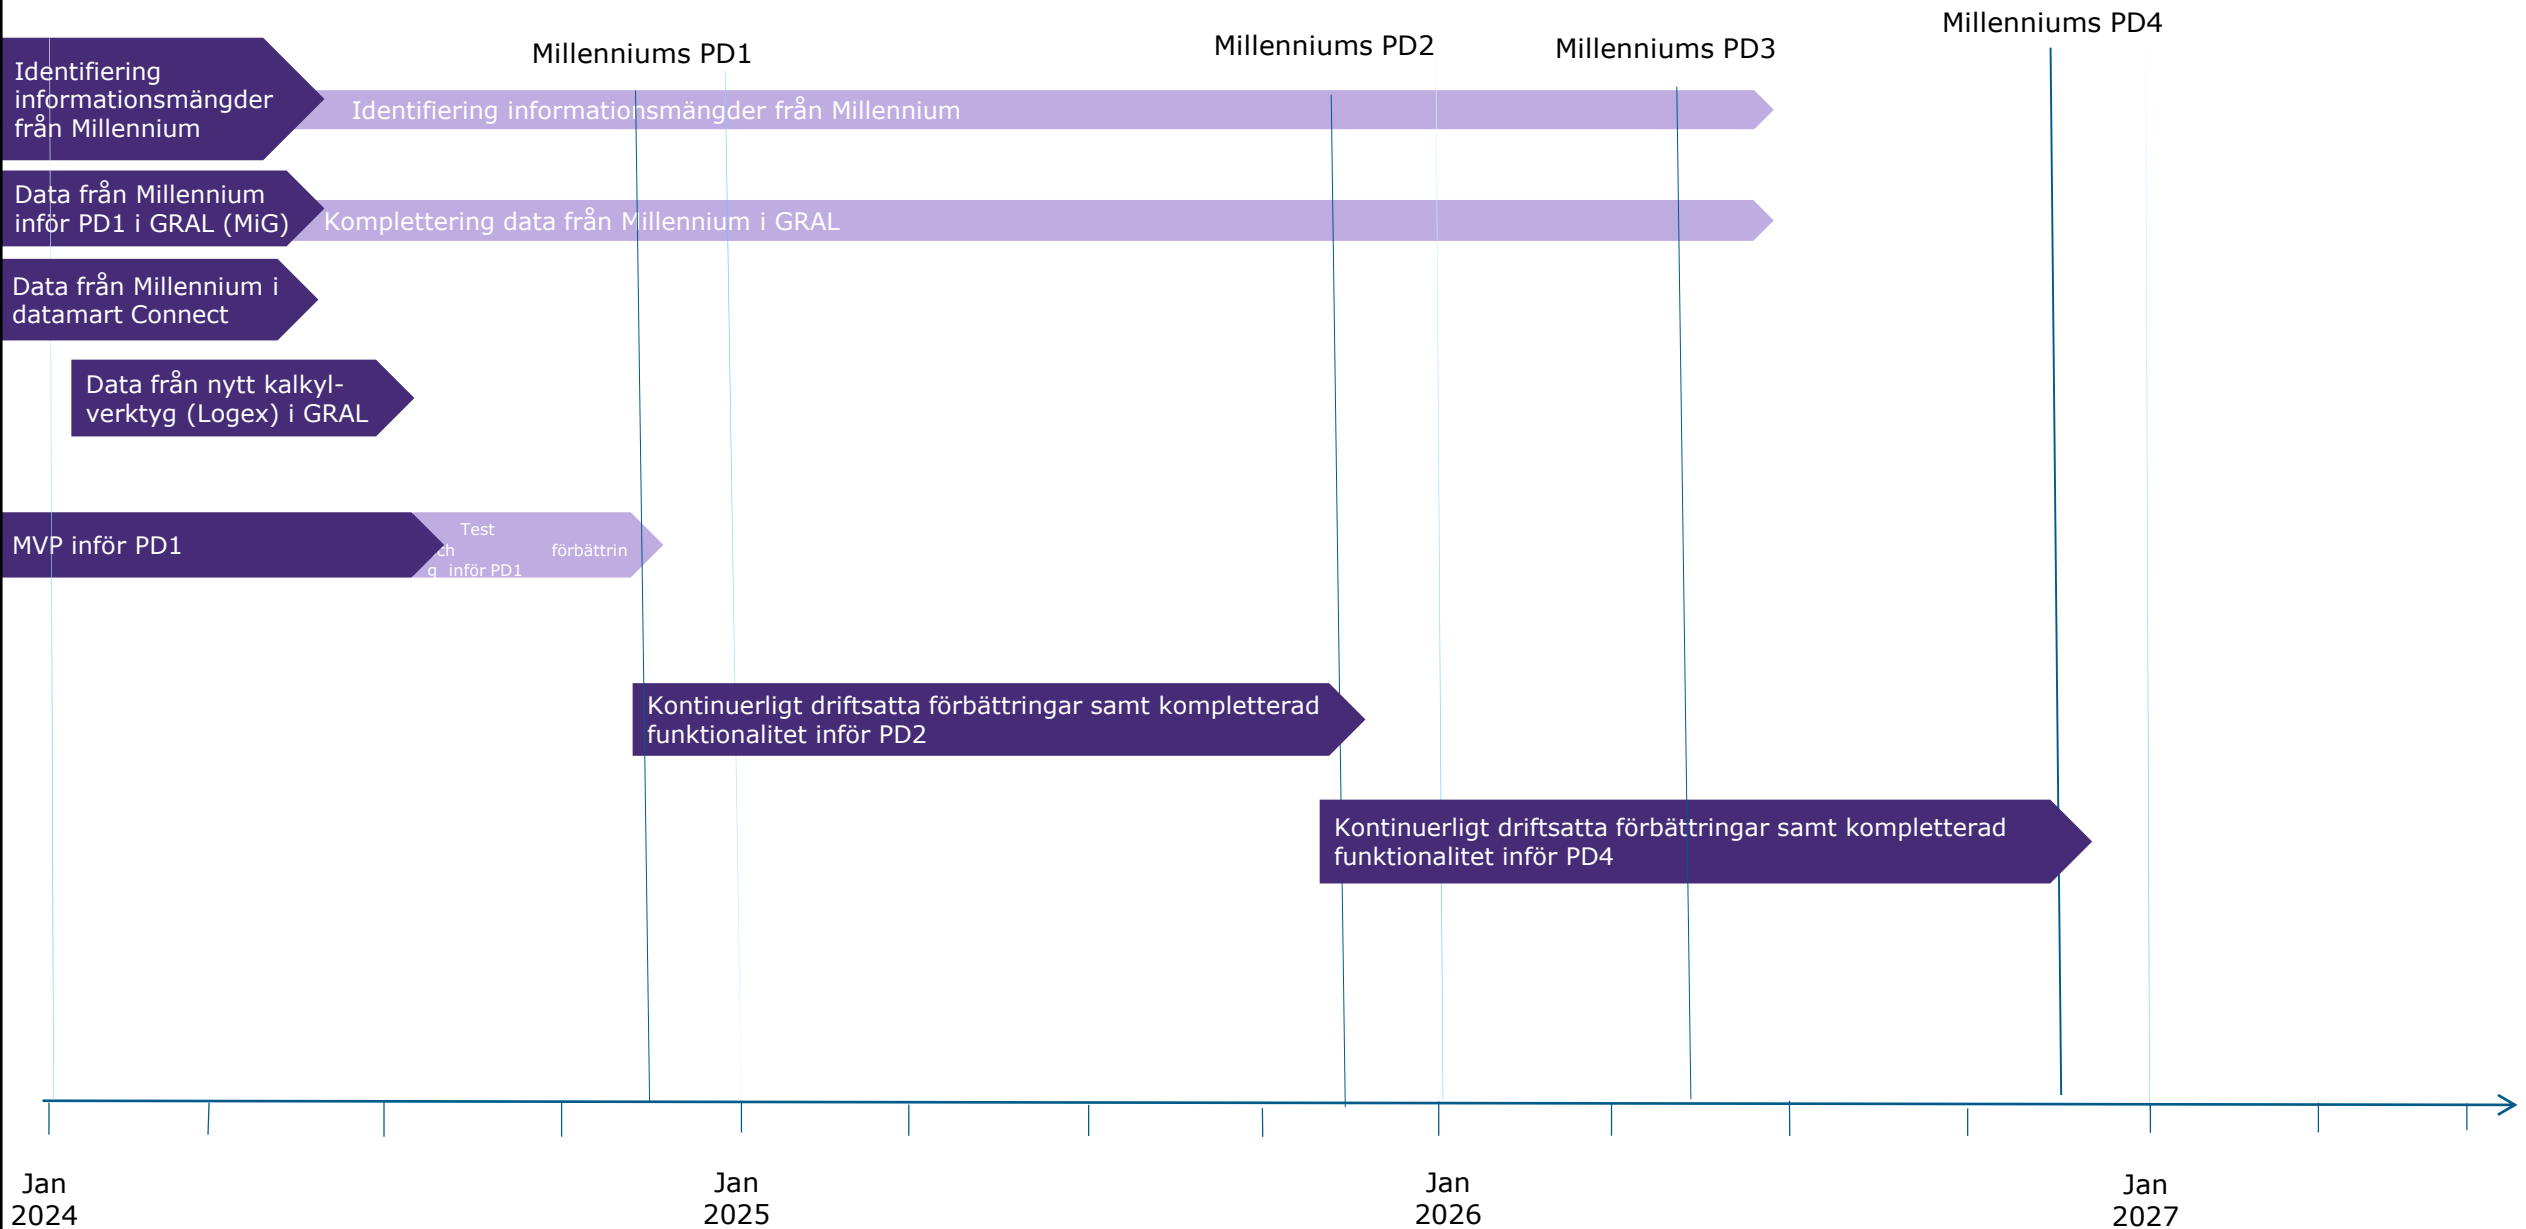



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Simuleringslab Millennium

- Information

Maria Svensson



SimuleringsLab

- Testa Millennium ur ett "medarbetarperspektiv"
- Genomförande under vecka vecka 21 (må till to)
- SimuleringenLab sker med resurser från verksamheten och programmet
 - Beräknad resursåtgång är 4-5 personer per scenario, programmet rekommenderar att dessa resurser äskas från Södra området.
- 1 regional resurs kommer medverka vid varje scenarion för att bevaka det regionala perspektivet.

SimuleringsLab

- Innan vecka 21 genomför medverkande en kortare utbildning för att kunna utföra steg i Millennium. Om stöd behövs för att kunna utföra stegen så finns stöd närvarande under tiden
- Fel eller förslag på förbättring tas emot och hanteras inom program Millenniums processer.



SimuleringsLab-scenarion

- Scenarion finns för:
 - Akuten
 - Jourcentral
 - Öppenvård
 - Primärvård
 - Slutenvård
 - Administrativa flöden



Program Millennium

Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare
och kommunerna i Västra Götaland



www.vgregion.se/millennium
millennium@vgregion.se



www.vastkom.se/millennium
millenniumkommun@vastkom.se

Arbetsflödesgranskning

- rapport från sessioner

Teamet samt berörda IA

Inget nytt



- **Övrigt**
 - **Återkoppling fördjupningssession**
- **Sammanfattning av mötet**
- **Planering kommande möten**



Förslag på agenda 2024-04-17

15:30-15:35	Inledning - inkl. återkoppling föreg. möte samt mötesanteckning	<i>(Christian C)</i>
15:35 – 15:55	Från idé till effekthemtagning del 2	<i>(Åsa Andblad)</i>
15:55-16:15	Återkoppling & reflektion på tidplan	<i>(Annika M)</i>
16:15 – 16:25	Info om projektet digital hälsodeklaration	<i>(Sara Hansson, Karin Jacobsson)</i>
16:25-16:30	Sammanfattning samt Planering	<i>(Christian C)</i>

Workshop 24 april

Tema: Att stärka vårt gemensamma arbete

IA-nätverk, 24 April, Jubileumsaulan, SU

13.00-13.10	Inledning
13.10-14.30	Hur uppnår vi ökad samordning i IA-nätverket? -Introduktion -Grupparbete -Presentation
14.30-14.50	Kaffe
14.50-15.30	Lärdomar från Oracle Health Collaboration forum och studiebesök
15.30-16.15	Hur kan man förbereda sig för Millennium??
16.15-16.30	Avslut

Kommande möten:

- **17 april** – Från idé till effekthemtagning del 2 + information om projektet digital hälsodeklaration + återkoppling på tidplan
- **24 april** – Halvdag, workshop förberedelser inför PD2 – PD4
- **1 maj** – Röd dag
- **8 maj** – Återkoppling på aktiviteter utifrån arbetsflödesgranskning utifrån IA + roller och ansvar utifrån kommunperspektivet
- **15 maj** – Status, uppdrag vårdens processer
- **22 maj** -
- **29 maj** -
- **5 juni** – Införande av digital hälsodeklaration, del 2

