


Verksamhetsförankring under beredning av handlingsalternativ

Underlag till referensgrupp 2025-02-11

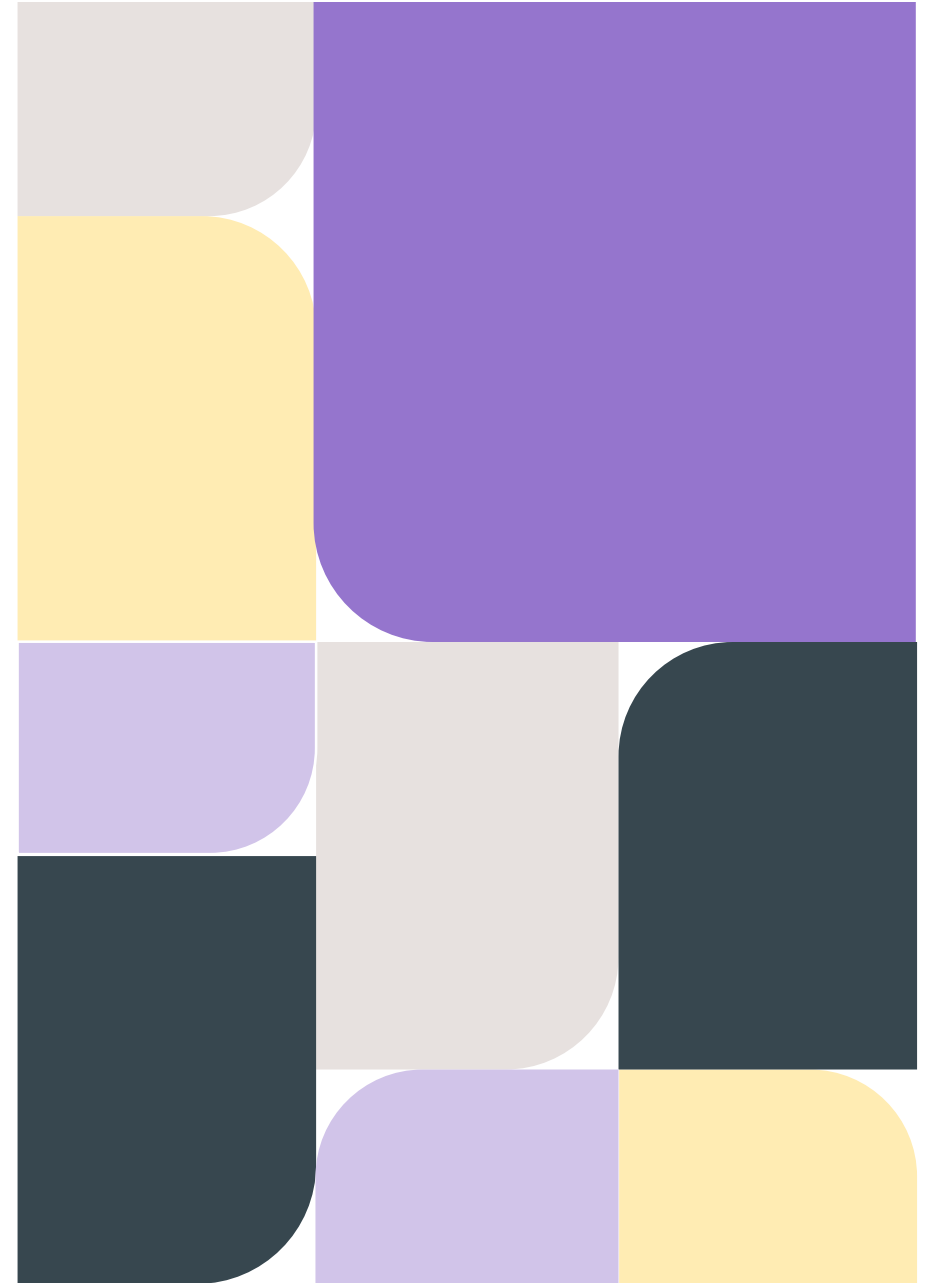

Verksamhetsförankring under beredning av handlingsalternativ

- För att kunna redogöra för önskad verksamhetsförankring under beredningsprocessen behöver vi ta fram förslag på vilka frågor som kan vara aktuella att förankra, och på vilket sätt
- Bild 2 beskriver de två alternativ vi har kring beredningsprocessen för att ta fram ett beslutsunderlag
- Därefter exemplifieras hur verksamheten kan göras delaktiga i beredningen av alternativ Millennium och alternativ Upphandling
- Sista bilden är främst en informationsbild kring arbetet med att ta fram en förbättrad metod

Vi ser två huvudalternativ gällande verksamhetsinvolvering under beredningen:

- Alternativ 1 - Beslutsunderlag klart slutet på mars
 - Bereds av arbetsgruppen med stöd av referensgruppen
 - Ingen involvering av kliniskt aktiv personal utöver via redan existerande skriftligt material t.ex. skriftliga utvärderingar av Millenniums funktionalitet och kravspecifikationen inför upphandlingen
- Alternativ 2 - Beslutsunderlag klart slutet på mars
 - Processen leds av arbetsgruppen med stöd av referensgruppen
 - Verksamhetens involveras genom ett mindre antal (ca 10-20 per handlingsalternativ?) kliniska representanter som har stort förtroende i verksamheten
 - Rekryteras med kort varsel och tiden de lägger behöver vara hårt prioriterad

Samordnings-
grupp IVIS
startar

Dec -24

Jan -25

Feb -25

Mars -25

2025-12-22

KPMG inleder
extern granskning

Region Skåne meddelar
uppskjutet införande

Beslut om typ av
handlingsalternativ

Extern granskning
presenteras

Handlings-
alternativ
klart

Framtagning av handlingsalternativ för adekvat patientsäkert vårdinformationssystem

Fas 1

Utveckling av handlingsalternativ

Metod för utvärdering av handlingsalternativ

Fas 2

Utrullningsalternativ

Analys för-/nackdelar

Regional erfarenhetsinsamling

Förvaltningarnas erfarenheter och Lessons Learned


Intervjuer och webbfråga

Program Millennium och KSDs erfarenheter och Lessons Learned

Risikanalys på vad pausen innebär

Analys tidsåtgång vanliga arbetsmoment


Extern granskning

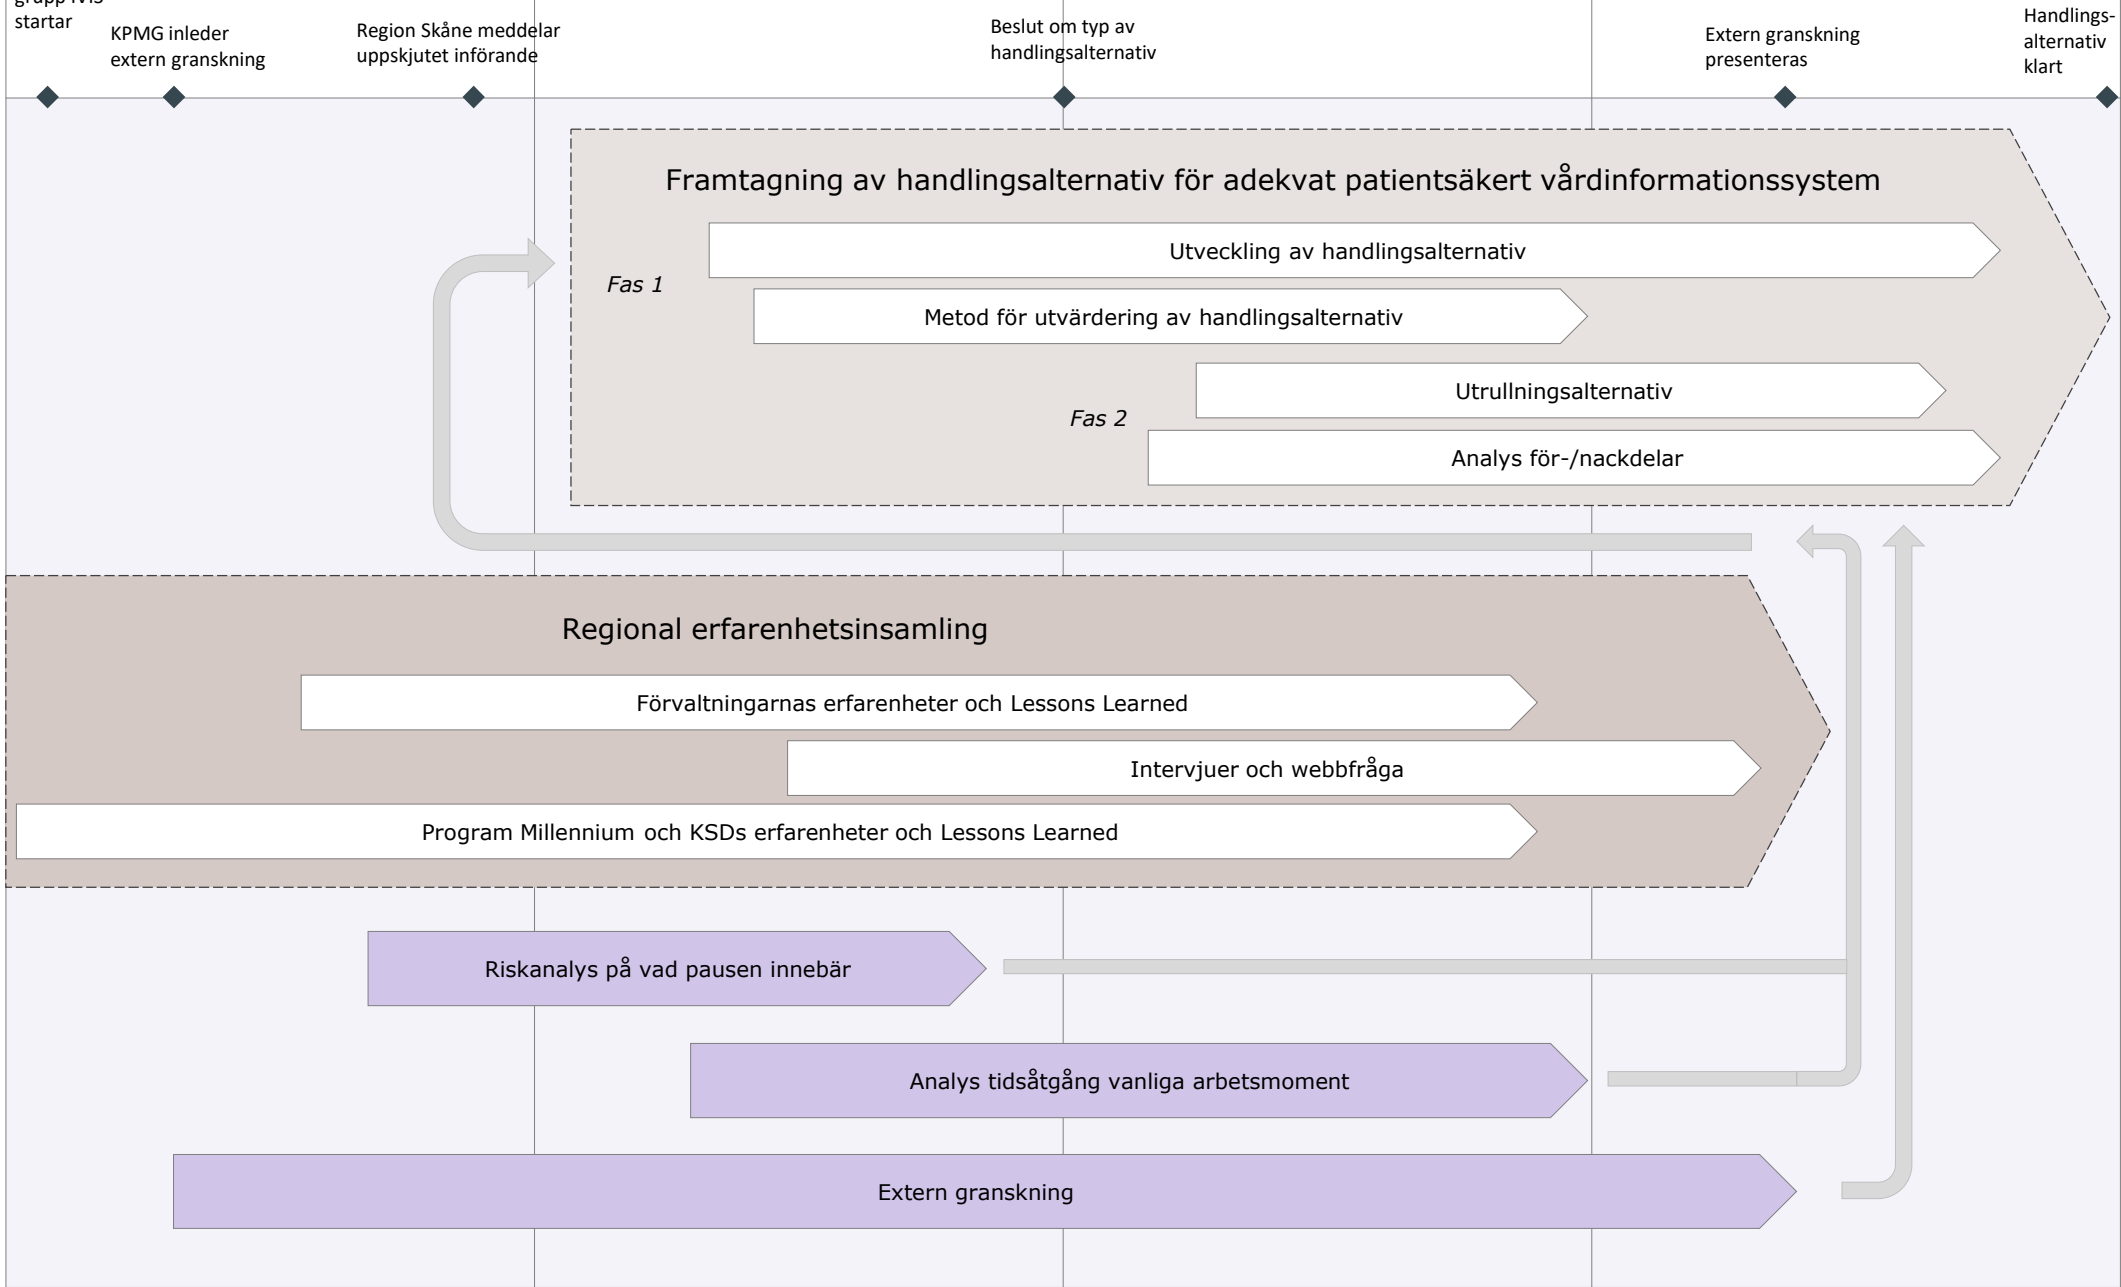


Beredning av alternativ Millennium



Nedan syns ett arbetsmaterial med hittills identifierade förbättringsbehov i Millennium, observera att det är ett pågående arbete och inget färdigt resultat.

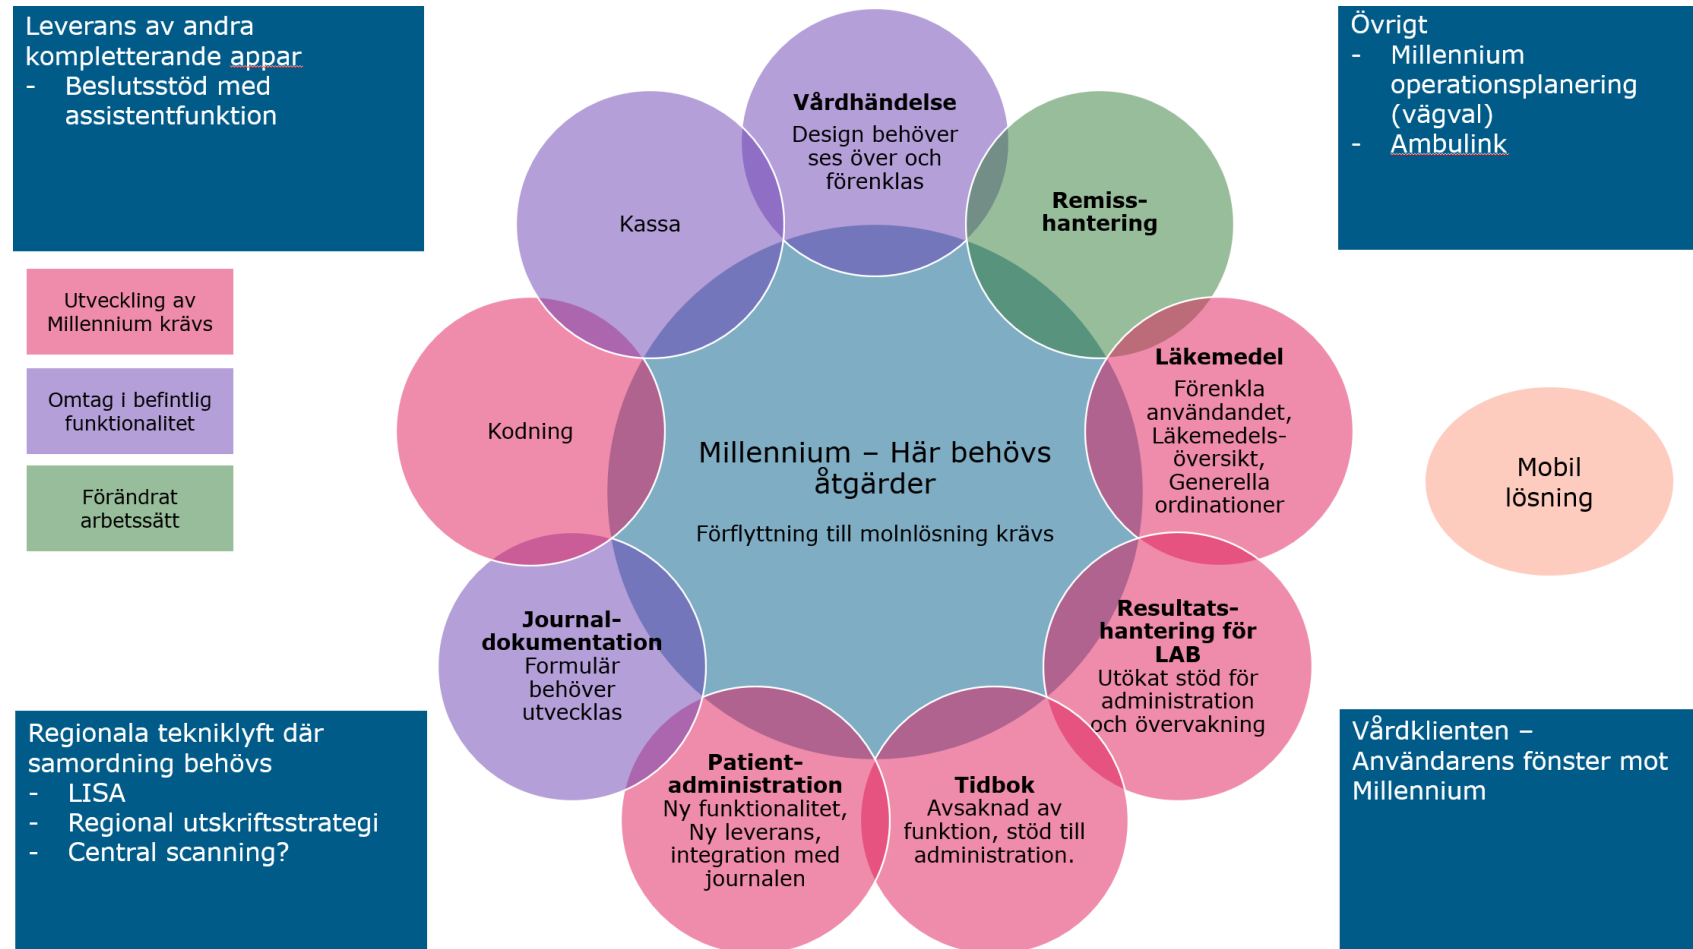


Verksamhetsinvolvering alternativ Millennium

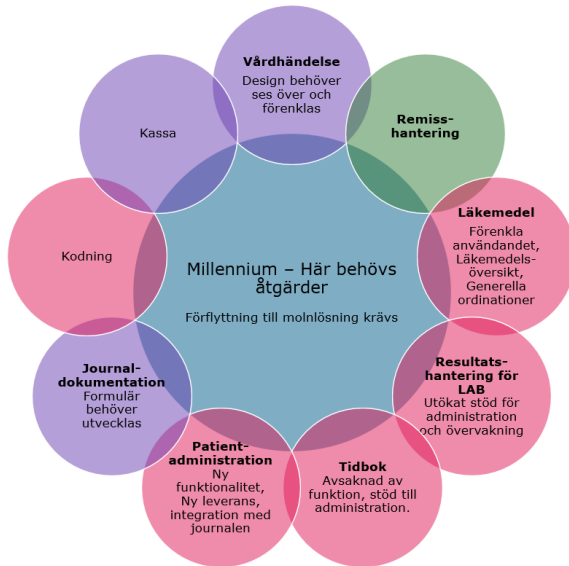

- Tydligt uppdrag till klinikerna att man deltar för att ta fram ett beslutsunderlag så man inte missförstår vart i processen vi befinner oss
- Stämmer identifierade förbättringsområden med kliniskt verk samma medarbetares uppfattning?
 - Om inte, vad skall korrigeras (läggas till, tas bort, formuleras om)
- Delta i arbetet att kortfattat detaljera varje identifierat huvudområde
 - För att säkerställa att vi har ett grundläggande skriftligt underlag det finns konsensus kring
 - Underlaget kan förslagsvis skickas på remiss till en bredare grupp kliniker
- Utvalda kliniker deltar i utvalda arbetsmöten med Oracle
 - Möten där det är extra viktigt att inte verksamhetens behov missförstås när åtgärder skall tidsuppskattas

Observera att vi för närvarande inväntar instruktioner om hur ett samarbete med Oracle skall se ut

Beredning av alternativ Upphandling



Verksamhetsinvolvering alternativ Upphandling

- Öppen fråga till referensgruppen om hur verksamheten kan och bör involveras under beredningen av beslutsunderlag, t.ex:
 - Förberedande omvärldsbevakning
 - Grundläggande beskrivning av önskade funktioner/förmågor hos ett nytt vårdinformationssystem
 - Hur lång tid är det ok att det tar innan man ser resultat?
 - Ytterligare förslag?



Verksamhetsförankring, metod

- Oavsett system viktigt att det finns ett förtroende för metoden i verksamheten, extra viktigt om beslutet blir att fortsätta med Millennium
- I metoden inkluderas både förändringsledning och mer konkret utvecklingsmetodik
- Upplägg för driftstart (big-bang, pilot/pionjär etc) mycket viktig faktor
- Det planeras workshop i införandeansvarignätverket som en del i arbetet med att identifiera och beskriva verksamhetens behov kring förbättrad metod för kommande införanden

